

## 管内工事進捗状況 黒川渡法面対策工その2工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設 株式会社

施工場所：長野県 松本市 黒川渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年10月20日

(進捗率 72.3%) 8/31現在

## 【工事の目的】

黒川渡法面は荒廃が著しい大規模斜面であるため、山腹工を実施し斜面を安定化させ、植生を導入しやすくすることで大規模斜面崩壊防止を図ります。

## 【現在の工事状況】

- ◎ 8月は、法枠工が完了しました。また、出水により上流の眼鏡橋が被災し、復旧作業を施しました。
- ◎ 9月は、鉄筋挿入工を行います。



現場状況(正面上空より)



眼鏡橋復旧完了(下流上空より)

## 現場代理人からの一言

- ・ 盆中の大雨により水嵩が増して現場上部の橋基礎部が洗堀され、現場の取付け道路が流出したりするなど大きく被災しましたが、橋の復旧後工事再開にて現在順調に進んでおります。まだ残暑が続きますので熱中症対策を万全に行うと共に、ゲリラ豪雨・雷鳴等を事前に察知し作業員に周知して事故やケガの災害に合わぬ様、安全に十分留意して施工していきます。

## 管内工事進捗状況 番所砂防堰堤補強外工事（梓川出張所）

受注者：サウンド株式会社

施工場所：長野県松本市安曇番所地先外

工期：令和3年5月10日～令和3年11月13日

（進捗率 44.6%） 8/31現在

## 【工事の目的】


番所砂防堰堤の本提基礎の洗堀対策の他、右岸取付護岸の空洞及び水通し断面が不足していることに対する補強工事を行います。

## 【現在の工事状況】

- ◎ 8月は、大型かご工・砕石舗装
- ◎ 9月は、工事用道路・仮締切工を行います。



崩壊地着手前の状況

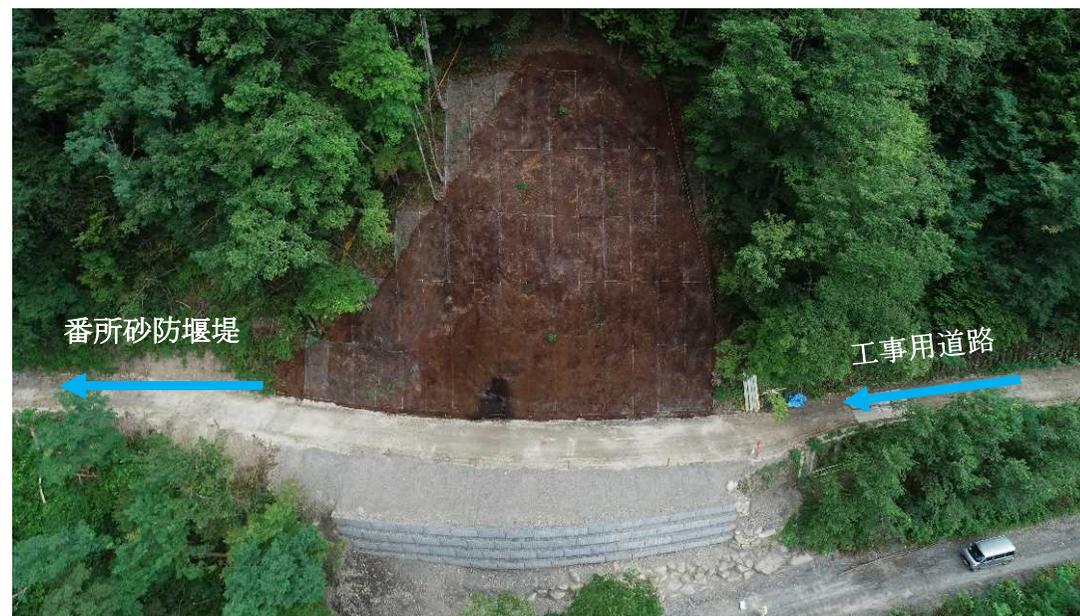

崩壊地の状況（大型かご工設置後）

## 現場代理人からの一言

今月から河川内の作業になる為、台風・ゲリラ豪雨による土石流災害や、狭谷間での作業となる為特に重機による事故等に十分注意し安全作業で頑張ると共にコロナ感染対策を徹底し安全作業で頑張ります。
