

管内工事進捗状況 黒川渡法面対策工その2工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設株式会社

施工場所：長野県 松本市 黒川渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年10月20日

（進捗率 93.5%） 9/30現在

【工事の目的】


黒川渡法面は荒廃が著しい大規模斜面であるため、山腹工を実施し斜面を安定化させ、植生を導入しやすくすることで大規模斜面崩壊防止を図ります。

【現在の工事状況】

- ◎ 9月は、鉄筋挿入工(足場撤去含む)が完了しました。
- ◎ 10月は、植生基材吹付工(上旬)・索道の撤去の予定です。



現場状況(正面上空より)

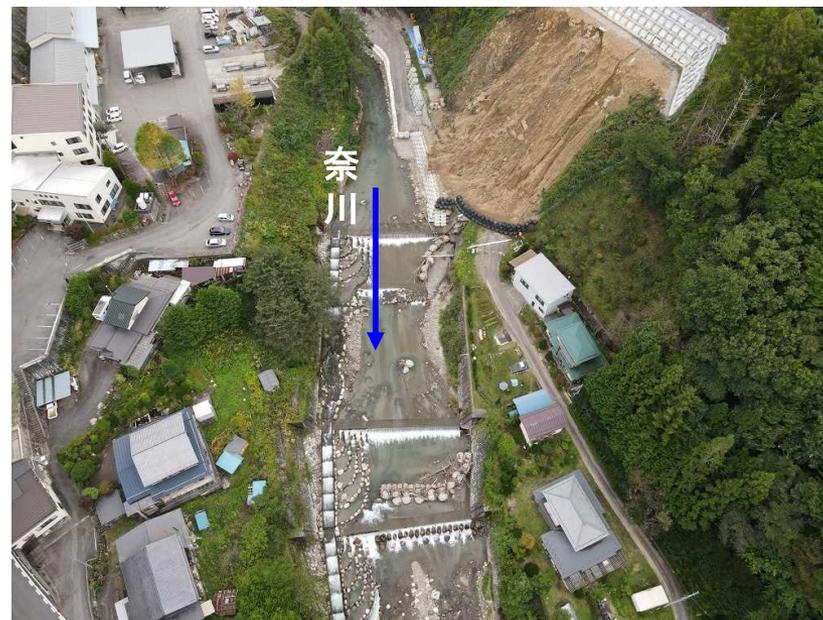

現場河川内状況(下流上空より)

現場代理人からの一言

- ・ 法面对策工は予定通りの工程内で終了できそうです。

釣りシーズンも9月で終了した為、河川内作業も問題なく進められますので、重機接触災害や吊荷落下災害はもとより、川石で滑って転倒しない様に安全に十分留意して施工していきます。

管内工事進捗状況 境川溪流保全その8工事（梓川出張所）

受注者：川瀬建設株式会社

施工場所：長野県松本市 奈川 寄合渡地先

工期：令和3年3月30日～令和3年12月20日

（進捗率 28.6%） 9/30現在

【工事の目的】

境川は、川幅が狭く、洪水時には流水に加え土砂、流木が流出するなど、河道が不安定な状態となっています。境川溪流保全工は、河道の安定化を図るため床固工を行います。

【現在の工事状況】

- ◎ 9月は、床固工のコンクリート打設を行いました。また、出水で被災した大寄合川で応急対策を実施しました。
- ◎ 10月は、引き続きコンクリート打設と石積み工を行います。



現場状況(境川)



現場状況(大寄合)

現場代理人からの一言

- ・ 境川の現場は11月中旬頃に床固工完了し、水叩き工の施工を行います。
- ・ 境川と大寄合川の合流点は、準備の出来次第、大型フトン籠の施工を行います。

管内工事進捗状況 番所砂防堰堤補強外工事（梓川出張所）

受注者：サウンド株式会社

施工場所：長野県松本市安曇番所地先外

工期：令和3年5月10日～令和3年11月13日

（進捗率 60.5%） 9 / 30 現在

【工事の目的】

番所砂防堰堤の本堤基礎の洗堀対策の他、右岸取付護岸の空洞及び水通し断面が不足していることに対する補強工事を行います。

【現在の工事状況】

- ◎ 9月は、工事用道路・仮締切工を行いました。
- ◎ 10月は、仮締切工・側壁工を行います。



番所砂防堰堤下流より堰堤を望む



番所砂防堰堤下流を望む

現場代理人からの一言

今月から河川内の作業になりました。台風・ゲリラ豪雨等の増水に注意し、狭い作業ヤードでの重機の接触事故やクレーン作業中の事故に注意し、安全作業で頑張ると共にコロナ感染対策を徹底し安全作業で頑張ります。

管内工事進捗状況 番所砂防堰堤補強外工事:八右衛門沢工区(梓川出張所)

受注者: サウンド株式会社

施工場所: 長野県松本市安曇上高地内(八右衛門沢)

工期: 令和3年5月10日～令和3年11月13日

(進捗率 60.5%) 9/30現在

【工事の目的】

八右衛門沢の工事用道路は降雨時に川となり土砂が流出し、上高地公園線に流れる恐れがあります。工事用道路に舗装を行うことで土砂流出を防ぎます。

【現在の工事状況】

- ◎ 9月は、コンクリート舗装工を行いました。
- ◎ 10月は、コンクリート舗装・光管路を行います。



上流側より下流側を望む



下流側より上流側を望む

現場代理人からの一言

- ・台風やゲリラ豪雨・落雷等の危険もある為、事前に天気予報等を確認し安全に作業できる環境を作ります。また、重機は作業終了後に安全な位置で駐車し、急な豪雨による増水被害に対応しています。
