

工事名：神通川・布瀬護岸その4工事

受注者：射水建設興業株式会社

場 所：富山市布瀬地先

工 期：令和3年5月13日 ～ 令和4年3月25日

進捗率 78% (2月10日時点)

現場紹介

12月より施工していた石張り（上段）が完了し河床掘削と堤防上部のかさ上げ盛土を施工しました。

1月下旬より根固めブロックの据付作業を施工し完了しました。


現在は根固めブロックの埋戻しを行い石張り（下段）の準備中です。

根固めブロック据付状況



(2月1日撮影) 下流より

根固めブロック据付完了

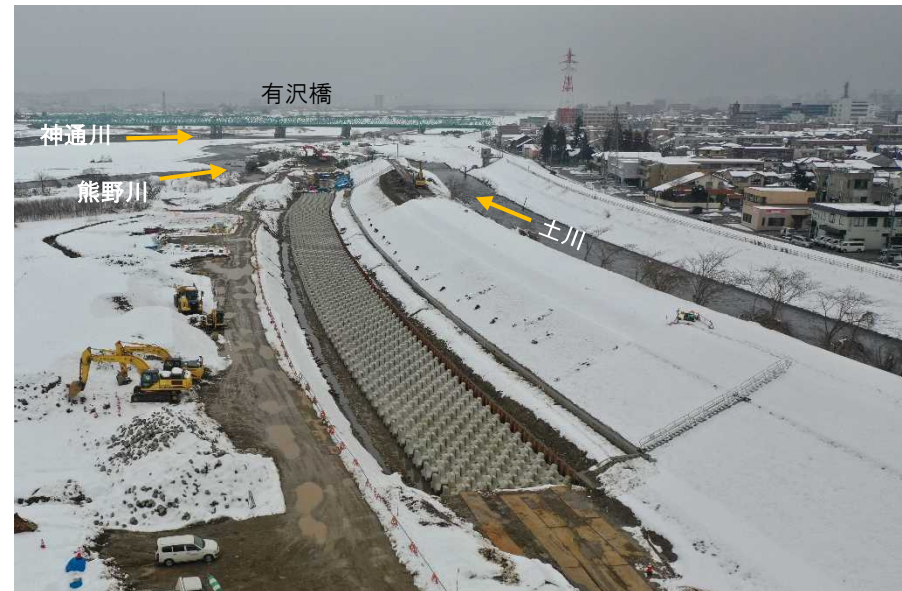

(2月8日撮影) 上流より

現場代理人・主任（監理）技術者からのコメント

今後は下段の護岸工及び堤防上部の施工に取り掛かっていきますが、降雪もあり工程は若干遅れ気味であります。工事も終盤になり焦る気持ちもありますが安全対策に留意し、無事故で3月末の完成を目指します。
