

被災～復旧状況 緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）


2018年7月10日（火）16時00分現在

被災状況



撮影日2018.7.7 7時00分

【緊急復旧内容】



【緊急復旧工事進捗状況】 進捗率70%

- ・根固めブロック 432個 / 432個
- ・袋詰玉石 0個 / 350個
- ・遮水シート 0m² / 800m²
- ・堤防復旧盛土 2,150m³ / 3,000m³
- ・敷鉄板 88枚 / 88枚
- ・仮設盛土 940m³ / 940m³


7/6（金）19:10 着手
※7/11（水）に完了予定



2018.7.10 5時39分
堤防復旧盛土施工状況



2018.7.10 15時57分
堤防復旧盛土施工状況

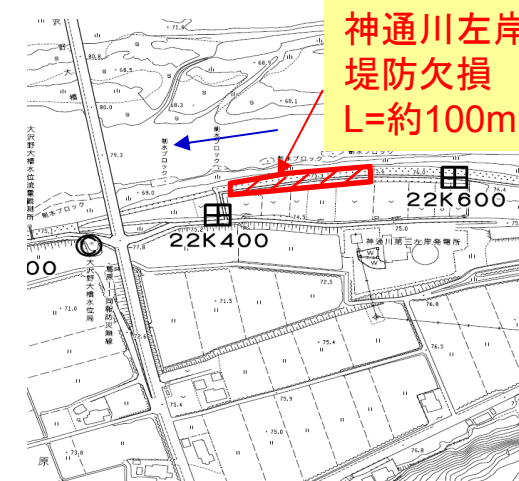

位置図



2018.7.10 7時13分
堤防復旧盛土施工状況
