

被災～復旧状況 緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）


2018年7月7日(土) 23時00分現在

被災状況



撮影日2018.7.7 7時00分

【緊急復旧内容】




【緊急復旧工事進捗状況】

- ・根詰めブロック 100個 / 600個
- ・袋詰玉石 0個 / 500個
- ・遮水シート 0m² / 1,100m²
- ・堤防復旧盛土 0m³ / 4,000m³
- ・敷鉄板 70枚 / 150枚
- ・仮設盛土 400m³ / 1,500m³

7/6(金)19:10 着手
※7/11(水)に完了予定



2018.7.7 19時23分
ブロック投入状況

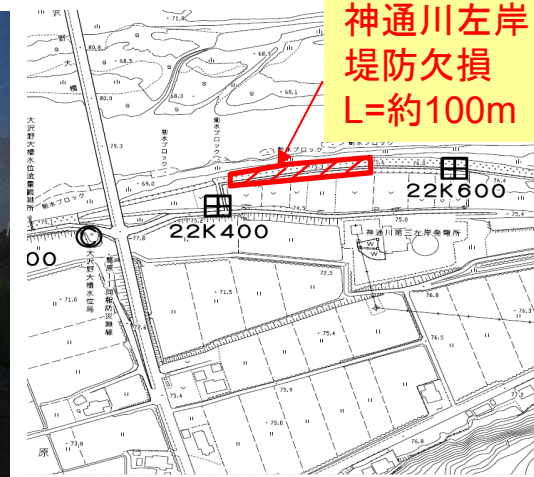

位置図



2018.7.7 7時18分
現場着手開始時



2018.7.7 22時58分
ブロック投入状況

