

被災～復旧状況 緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）


2018年7月10日（火）6時00分現在

被災状況



撮影日2018.7.7 7時00分

【緊急復旧内容】




【緊急復旧工事進捗状況】 進捗率60%

・根固めブロック	432個 / 432個
・袋詰玉石	0個 / 350個
・遮水シート	0m ² / 800m ²
・堤防復旧盛土	1270m ³ / 3,000m ³
・敷鉄板	88枚 / 100枚
・仮設盛土	940m ³ / 940m ³

7/6(金)19:10 着手
※7/11(水)に完了予定



2018.7.9 16時16分
堤防復旧盛土施工状況

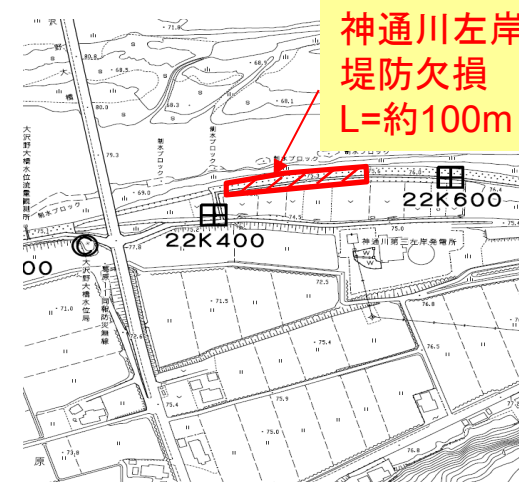

位置図



2018.7.10 5時39分
堤防復旧盛土施工状況



2018.7.9 20時52分
堤防復旧盛土施工状況
