

# 被災～復旧状況 緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）


2018年7月9日(月) 16時00分現在

## 被災状況



撮影日2018.7.7 7時00分

## 【緊急復旧内容】



## 【緊急復旧工事進捗状況】 進捗率30%

- ・根固めブロック 432個 / 432個
- ・袋詰玉石 0個 / 300個
- ・遮水シート 0m<sup>2</sup> / 800m<sup>2</sup>
- ・堤防復旧盛土 160m<sup>3</sup> / 3,000m<sup>3</sup>
- ・敷鉄板 88枚 / 100枚
- ・仮設盛土 940m<sup>3</sup> / 940m<sup>3</sup>


7/6(金)19:10 着手  
※7/11(水)に完了予定



2018.7.9 7時50分  
ブロック投入状況



位置図

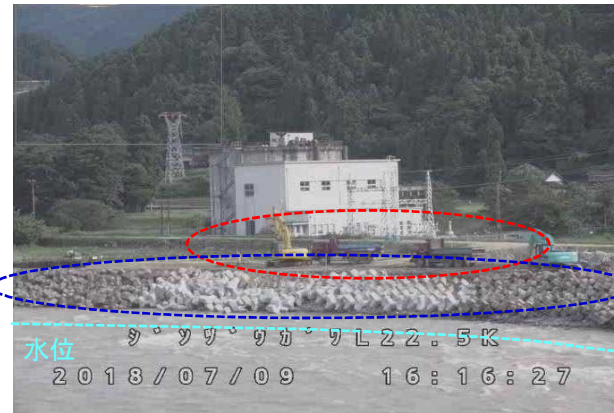

2018.7.9 16時16分  
堤防復旧盛土施工状況  
(ブロック投入は完了)



2018.7.9 16時16分  
堤防復旧盛土施工状況
