

被災～復旧状況 緊急復旧箇所（神通川左岸22.5k）


2018年7月7日（土）5時00分現在

被災状況



撮影日2018.7.6 14時00分


【緊急復旧内容】



【緊急復旧工事進捗状況】

- ・根固めブロック 0個 / 400個
- ・袋詰玉石 0個 / 600個
- ・堤防復旧盛土 0m3 / 1,000m3
- ・敷鉄板 60枚 / 110枚

7/6(金)19:10 着手
※7/10(火)に完了予定

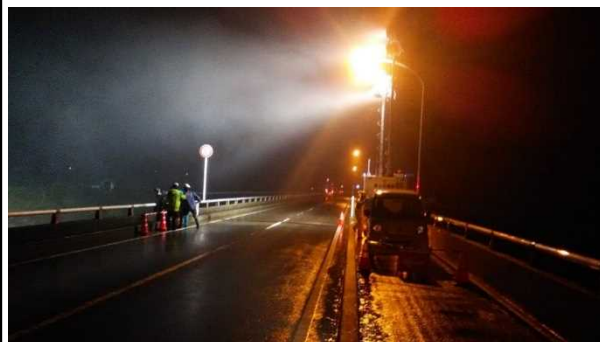


2018.7.6 照明車稼働開始



2018.7.6 敷鉄板設置作業



2018.7.6 21時49分
敷鉄板設置作業中

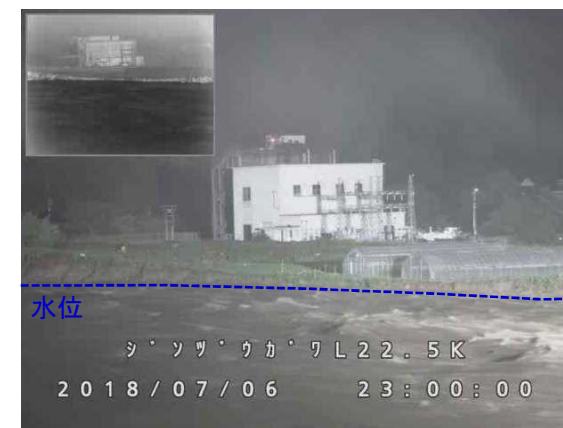

2018.7.6 23時00分
緊急復旧作業中断

※作業開始は流況を見て判断
