


第6回平成23年7月新潟・福島豪雨での只見川等の災害に関する情報  
連絡会 資料1-2  
H25.1.16 北陸地方整備局 作成

# H23. 7 新潟・福島豪雨 只見川等河川災害復旧 受託工事の進捗状況 (H25.1.10 現在)

## 進捗状況(箇所単位) H25.1.10現在

- ・完成 16% (7/43)
- ・H24年度末完成予定 58% (25/43)
- ・H25年度完成予定 100% (43/43)

市町別内訳		
市町	箇所	延長(m)
喜多方市	7	703
会津坂下町	5	974
柳津町	4	530
三島町	7	754
金山町	20	2,448
合計	43	5,409

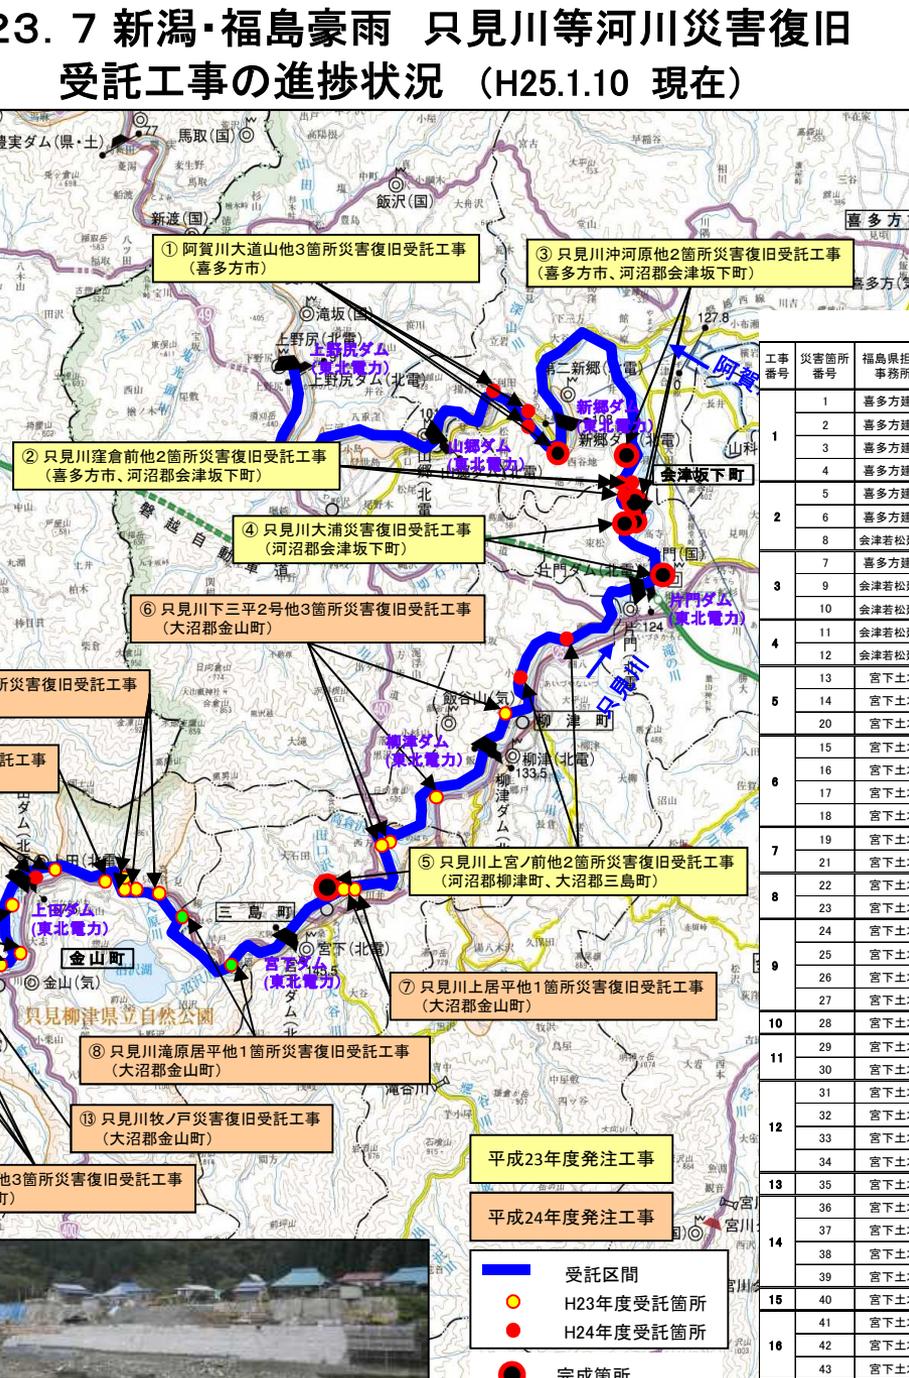

## 河川災害復旧工事受託箇所一覧

工事番号	災害箇所番号	福島県担当事務所	地先名	延長(m)	進捗			工事契約
					完成	H24年度	H25年度	
1	1	喜多方建設	喜多方市高郷町揚津字関下	59.1	○	○	○	済み
2	2	喜多方建設	喜多方市高郷町上郷字峯1号	35.0	○	○	○	
3	3	喜多方建設	喜多方市高郷町上郷字峯2号	27.0	○	○	○	
4	4	喜多方建設	喜多方市高郷町塩坪字大道山	304.0	○	○	○	
5	5	喜多方建設	喜多方市高郷町西羽賀字上川原	53.0	○	○	○	済み
6	6	喜多方建設	喜多方市高郷町大田賀字広面	88.0	○	○	○	
7	7	喜多方建設	喜多方市高郷町西羽賀字思川	137.0	○	○	○	完了
8	8	会津若松建設	会津坂下町大字東松字窪倉前	435.0	○	○	○	
9	9	会津若松建設	会津坂下町大字片門字沖河原1号	167.0	○	○	○	完了
10	10	会津若松建設	会津坂下町大字片門字沖河原2号	23.4	○	○	○	
11	11	会津若松建設	会津坂下町大字片門字大浦	402.5	○	○	○	完了
12	12	会津若松建設	会津坂下町大字片門字村中乙	47.4	○	○	○	
13	13	宮下土木	柳津町大字藤字前田	47.0	○	○	○	済み
14	14	宮下土木	柳津町大字小橋字上宮ノ前	207.0	○	○	○	
15	15	宮下土木	三島町大字名入字上赤谷1号	14.0	○	○	○	済み
16	16	宮下土木	柳津町大字小橋字大巻	196.0	○	○	○	
17	17	宮下土木	柳津町大字飯谷字守林	80.0	○	○	○	済み
18	18	宮下土木	三島町大字松原字下三平1号	65.0	○	○	○	
19	19	宮下土木	三島町大字松原字下三平2号	101.0	○	○	○	済み
20	20	宮下土木	三島町大字名入字上居平	224.2	○	○	○	
21	21	宮下土木	三島町大字名入字上赤谷2号	143.5	○	○	○	済み
22	22	宮下土木	三島町大字早戸字滝原居平	56.0	○	○	○	
23	23	宮下土木	三島町大字早戸字小津巻	150.0	○	○	○	手続等 検討中
24	24	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧1号	155.0	○	○	○	
25	25	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧2号	141.1	○	○	○	済み
26	26	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧3号	31.0	○	○	○	
27	27	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧4号	88.0	○	○	○	済み
28	28	宮下土木	金山町大字水沼字沢原	255.0	○	○	○	
29	29	宮下土木	金山町大字水沼字本上田	205.0	○	○	○	済み
30	30	宮下土木	金山町大字水沼字上田	171.8	○	○	○	
31	31	宮下土木	金山町大字中川字宮崎	32.0	○	○	○	済み
32	32	宮下土木	金山町大字大志字掛橋	55.0	○	○	○	
33	33	宮下土木	金山町大字川口字沢向道1	50.7	○	○	○	済み
34	34	宮下土木	金山町大字川口字沢向道2	244.0	○	○	○	
35	35	宮下土木	金山町大字西谷字牧ノ戸	202.3	○	○	○	済み
36	36	宮下土木	金山町大字西谷字夕川原1号	81.0	○	○	○	
37	37	宮下土木	金山町大字西谷字夕川原2号	140.0	○	○	○	済み
38	38	宮下土木	金山町大字本名字坂ノ下1号	80.3	○	○	○	
39	39	宮下土木	金山町大字本名字坂ノ下2号	103.5	○	○	○	済み
40	40	宮下土木	金山町大字本名字陣場	276.0	○	○	○	
41	41	宮下土木	金山町大字越川字稲葉	12.0	○	○	○	手続等 検討中
42	42	宮下土木	金山町大字越川字浦田	107.0	○	○	○	
43	43	宮下土木	金山町大字大塩字体場	17.0	○	○	○	

平成23年度発注工事

平成24年度発注工事

- 受託区間
- H23年度受託箇所
- H24年度受託箇所
- 完成箇所
- 未契約箇所

注) 工事番号の8, 16は、入札不調のため早期契約を旨指し対応中

上田 (工事中)

# ◆平成23年7月新潟・福島豪雨 国道252号二本木橋直轄権限代行災害復旧事業の概要

- 平成23年7月29日 国道252号二本木橋落橋
- 福島県知事が国土交通大臣に直轄権限代行を要請
- 9月 財務協議を経て直轄権限代行による災害復旧を決定
- 事業内容 ・応急復旧(仮橋)、本復旧(新橋設置)、落橋回収
- 進捗状況 ・12月20日正午、仮橋設置完了・交通解放




- ・3月21日 国道252号二本木橋災害復旧工事(詳細設計付き) [受注:鉄建・宮地異種工種建設工事共同企業体]
- ・7月6日 国道252号二本木橋災害復旧改良その1工事 7月13日 同改良その2工事 [受注:会津土建(株)]
- ・1月10日 国道252号二本木橋災害復旧護床工他工事 [受注:(株)本間組]




# ◆平成23年7月新潟・福島豪雨 国道252号二本木橋直轄権限代行災害復旧事業の状況

## 工事進捗状況写真

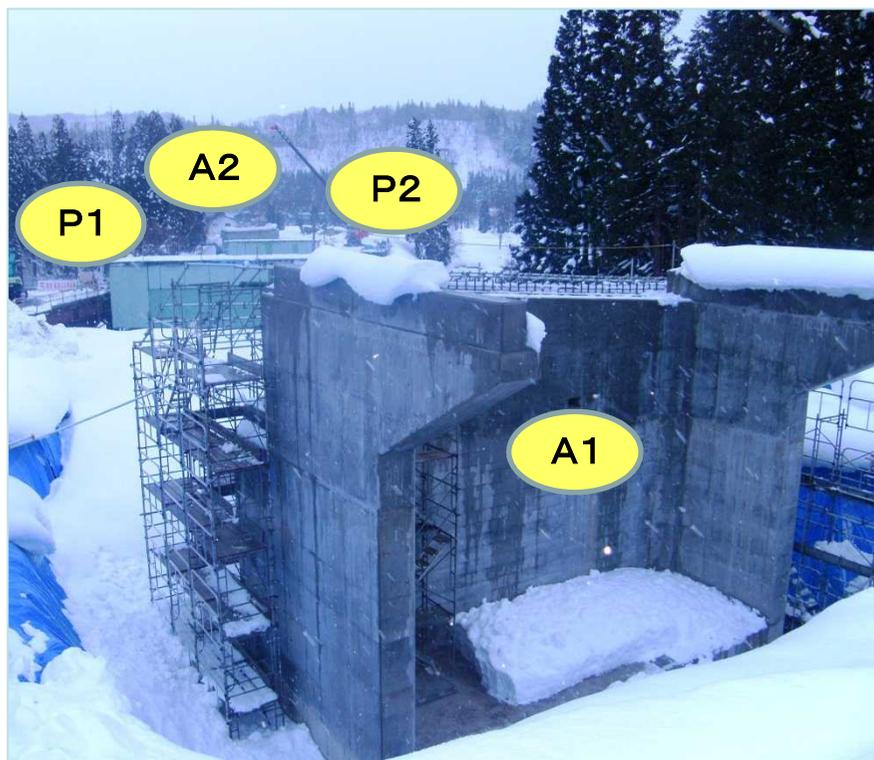

## 二本木橋構造図

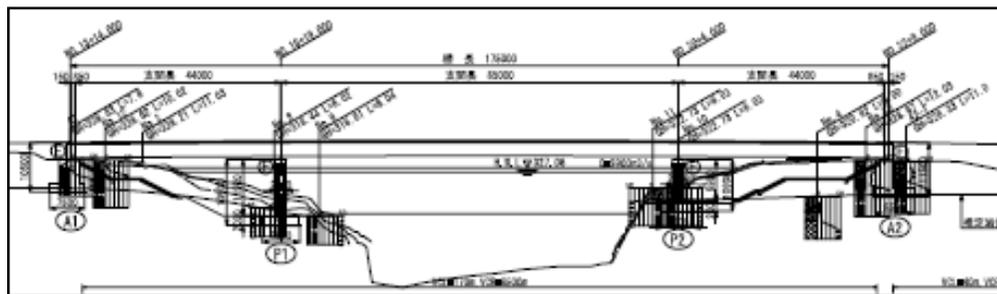

➡  
右岸側A2橋台状況  
(1/9撮影)

・現在は協座周りの  
塗装作業を残し  
概成している

## 今後の施工予定

- ①下部構造物は降雪終息時まで概成
- ②上部構造物は工場にて仮組検査を完了させ降雪・積雪状況確認後に架設設備着手
- ③架設ヤード確保後、桁輸送を開始
- ④架設作業開始

※平成25年度 可能な限り早期の完成目指す




➡  
上部工製作状況  
(1/9撮影)

・千葉縣市原市で  
工場製作しており、  
現在は製作を完了  
し、仮組み検査に向  
けた作業を進めて  
いる



# ◆平成23年7月新潟・福島豪雨 金山町道「西部橋」災害復旧事業(受託)の概要

- 平成23年7月29日、西部橋落橋
- 9月9日、只見川電源流域振興協議会(只見町長・金山町長他)が北陸地方整備局長に要請
- 10月7日、受託による西部橋の災害復旧事業実施を決定 (河川で受託・道路が支援)
- 2月1日、災害査定・保留解除
- 事業内容 ・本復旧(新橋設置)工事、落橋回収工事 (用地買収、設計は金山町で実施)
- 進捗状況 ・7月26日 町道土倉・西部線 西部橋災害復旧下部他工事[受注:滝谷建設工業(株)]  
・8月1日 町道土倉・西部線 西部橋災害復旧上部工事[受注:JFEエンジニアリング(株)]  
・9月10日 町道土倉・西部線 西部橋災害復旧落橋回収工事[受注:青木あすなろ(株)]

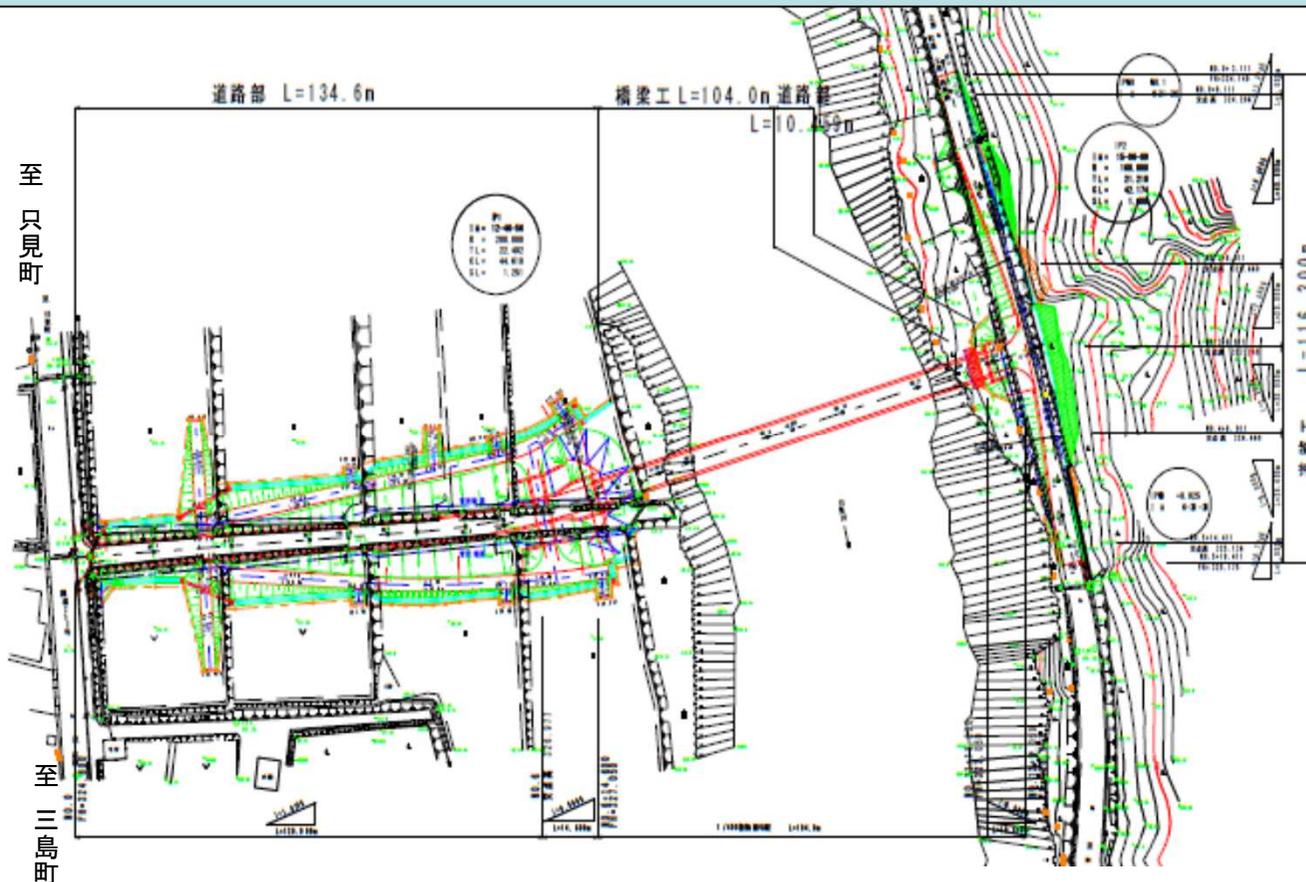

◆平成23年7月新潟・福島豪雨 金山町道「西部橋」災害復旧事業(受託)の状況

西部橋 構造図

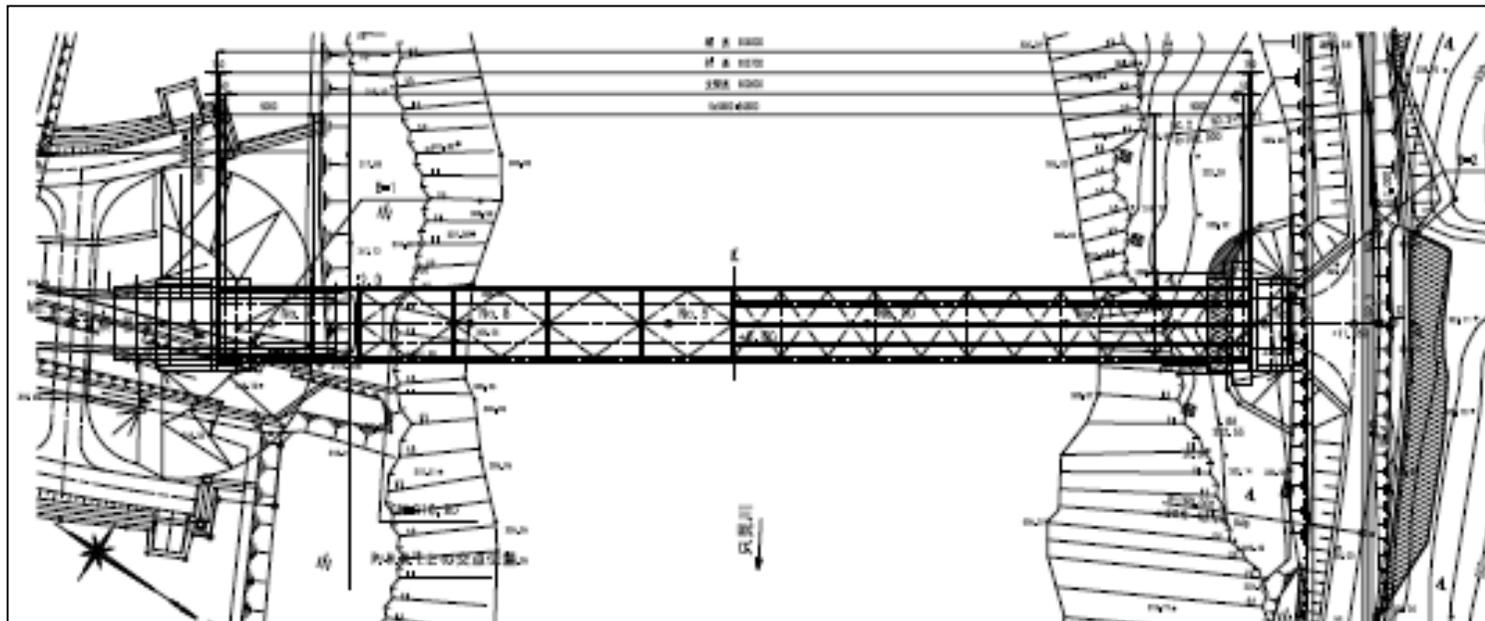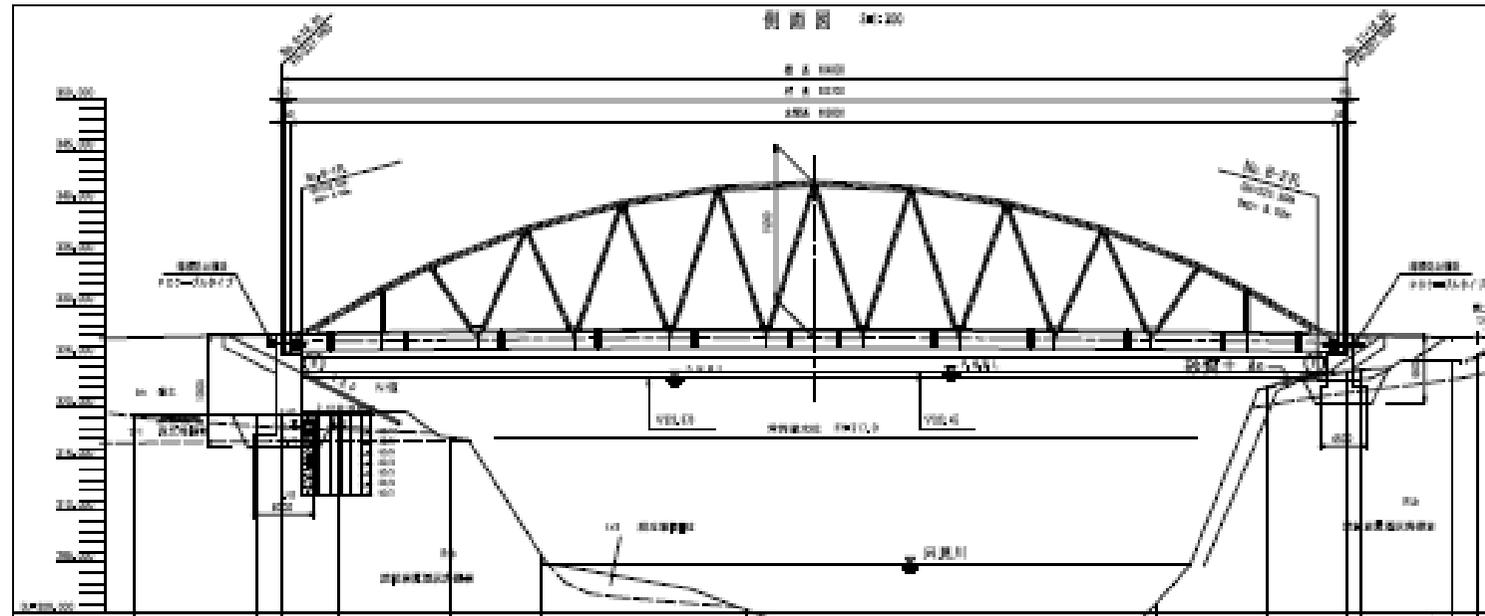

## ◆平成23年7月新潟・福島豪雨 只見町「五礼橋」災害復旧事業(受託)の概要

- 平成23年7月29日、五礼橋落橋
- 9月9日、只見川電源流域振興協議会(只見町長・金山町長他)が北陸地方整備局長に要請
- 10月7日、受託による五礼橋の災害復旧事業実施を決定(密接関連として道路が受託)
- 事業内容 ・本復旧(橋台復旧工、護岸工)工事
- 進捗状況 ・除雪作業を開始し、橋台復旧工、橋台背面盛土工、橋台護岸工、斜材・高覧製作工、斜材・高欄補修工等、全ての施工完了し、9月7日に只見町に五礼橋を引渡済み



被災前




五礼橋 復旧工事完成写真



被災後



A1橋台(上流川より) 着手前



A1橋台(下流川より) 完成
