

## H23. 7 新潟・福島豪雨 只見川等河川災害復旧 受託工事の進捗状況 (H25.5.31 現在)

資料2

- ・福島県から受託の河川災害復旧工事は、平成24年度までにすべて発注済みです。
- ・全42箇所の内、既に、22箇所が完成しました。(52% = 22 / 42)
- ・その他の残り20箇所の内、19箇所は施工中で、残り1箇所も速やかに工事着手する予定です。
- ・平成25年度中に全ての復旧完了を目指しています。(100% = 42 / 42)

(主な完成箇所の状況)



喜多方市 大道山地区



会津坂下町 大浦地区



三島町 上赤谷1号地区



柳津町 大巻地区





金山町 上田地区

# H23. 7 新潟・福島豪雨 只見川等河川災害復旧 受託工事の進捗状況 (H25.5.31 現在)

**進捗状況 (箇所単位) H25.5.31 現在**  
 ・完成 52% (22/42)  
 ・H25年度完成予定 100% (42/42)

市町	箇所	延長(m)
喜多方市	7	703
会津坂下町	5	974
柳津町	4	530
三島町	6	754
金山町	20	2,448
合計	42	5,409

## 主な完成箇所

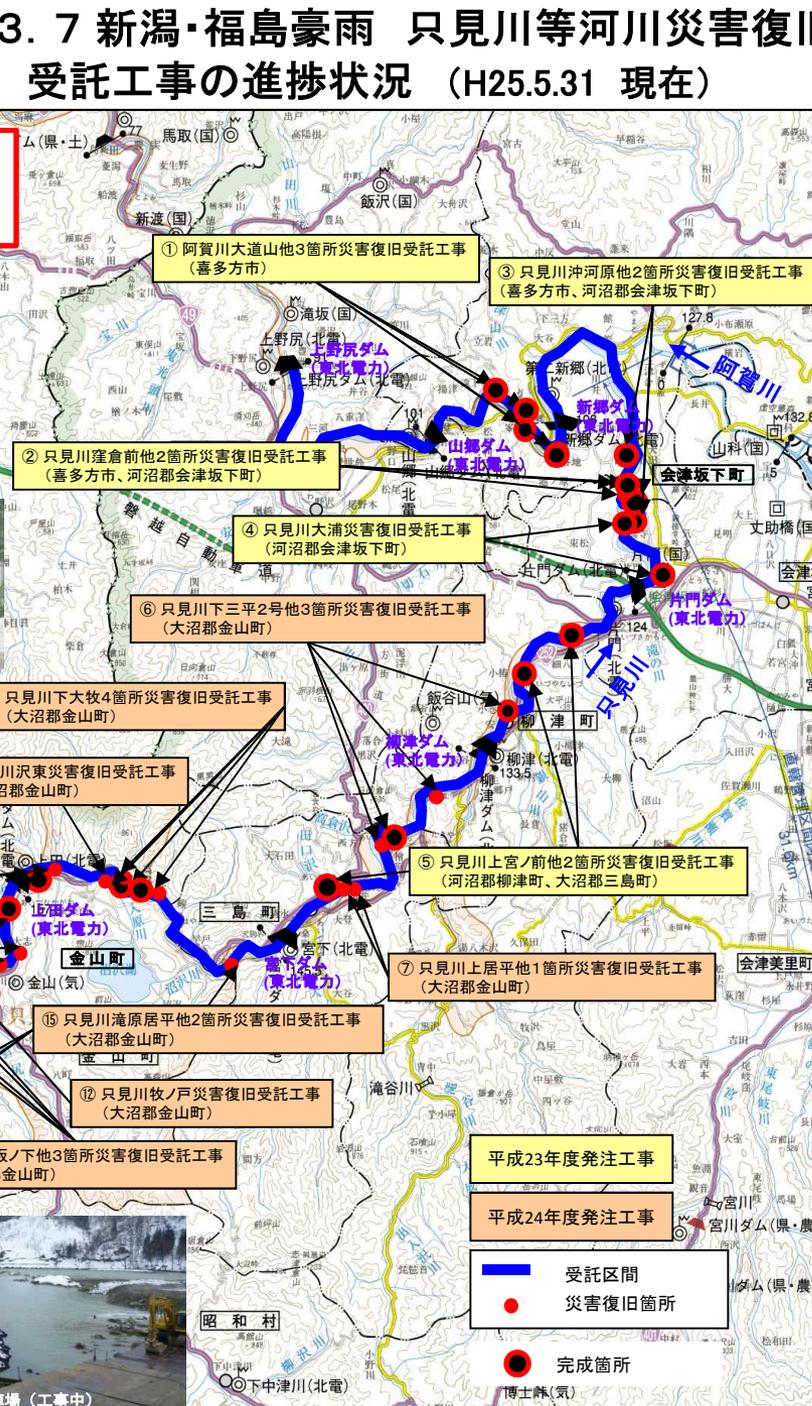

## 河川災害復旧工事受託箇所一覧 (H25.5.31現在)

工事番号	災害箇所番号	福島県担当事務所	地先名	延長(m)	進捗	
					完成	H25年度
1	1	喜多方建設	喜多方市高郷町揚津字園下	59.1	○	
	2	喜多方建設	喜多方市高郷町上郷字釜1号	35.0	○	
	3	喜多方建設	喜多方市高郷町上郷字釜2号	27.0	○	
2	4	喜多方建設	喜多方市高郷町埴坪字大道山	304.0	○	
	5	喜多方建設	喜多方市高郷町西羽賀字上川原	53.0	○	
	6	喜多方建設	喜多方市高郷町大田賀字広面	88.0	○	
3	7	会津若松建設	会津坂下町大字東松字窪倉前	435.0	○	
	8	喜多方建設	喜多方市高郷町西羽賀字息川	137.0	○	
	9	会津若松建設	会津坂下町大字片門字沖河原1号	66.0	○	
4	10	会津若松建設	会津坂下町大字片門字沖河原2号	23.4	○	
	11	会津若松建設	会津坂下町大字片門字大浦	402.5	○	
	12	会津若松建設	会津坂下町大字片門字中乙	47.4	○	
5	13	宮下土木	柳津町大字藤字前田	47.0	○	
	14	宮下土木	柳津町大字小橋字上宮/前	207.0	○	
	15	宮下土木	三島町大字名入字上赤谷1号	14.0	○	
6	16	宮下土木	柳津町大字小橋字大巻	196.0	○	
	17	宮下土木	柳津町大字飯谷字守林	80.0	○	○(施工中)
	18	宮下土木	三島町大字松原字下三平1号	65.0	○	
7	19	宮下土木	三島町大字松原字下三平2号	101.0	○	○(施工中)
	20	宮下土木	三島町大字名入字上居平	224.2	○	○(施工中)
	21	宮下土木	三島町大字名入字上赤谷2号	143.5	○	○(施工中)
8	22	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧1号	155.0	○	○(施工中)
	23	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧2号	141.1	○	
	24	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧3号	31.0	○	
9	25	宮下土木	金山町大字水沼字下大牧4号	88.0	○	○(施工中)
	26	宮下土木	金山町大字水沼字沢東	255.0	○	○(施工中)
	27	宮下土木	金山町大字水沼字本上田	205.0	○	○(施工中)
10	28	宮下土木	金山町大字水沼字上田	171.0	○	
	29	宮下土木	金山町大字中川字宮崎	32.8	○	
	30	宮下土木	金山町大字大志字掛橋	55.0	○	○(施工中)
11	31	宮下土木	金山町大字川口字沢向道上1	50.7	○	○(施工中)
	32	宮下土木	金山町大字川口字沢向道上2	244.0	○	○(施工中)
	33	宮下土木	金山町大字西谷字牧ノ下1号	202.3	○	○(施工中)
12	34	宮下土木	金山町大字西谷字下夕川原1号	81.0	○	
	35	宮下土木	金山町大字西谷字下夕川原2号	140.0	○	○(施工中)
	36	宮下土木	金山町大字本名字坂ノ下1号	80.3	○	○(施工中)
13	37	宮下土木	金山町大字本名字坂ノ下2号	103.5	○	○(施工中)
	38	宮下土木	金山町大字本名字陣場	276.0	○	○(施工中)
	39	宮下土木	三島町大字早戸字滝原居平	56.0	○	○(施工中)
14	40	宮下土木	金山町大字越川字稲葉	12.0	○	○(施工中)
	41	宮下土木	金山町大字越川字浦田	107.0	○	○(施工中)
	42	宮下土木	金山町大字大塩字休場	17.0	○	

注) 工事番号25、35は、H24年度末までに流水部の護岸は完成済み。  
 22 20

平成23年7月新潟・福島豪雨災害(権限代行及び受託)復旧工事の進捗状況

◆国道252号福島県大沼郡金山町及び只見町付近橋梁被災状況



被災後の状況(A1下流側)

完成後の状況(A1下流側)

被災後の状況(落橋)

被災後の状況(落橋)

【只見町道「五礼橋」】**完成**

町道橋の被災による橋台復旧工、護岸工、上部工補修工を北陸地方整備局が受託し、平成24年9月7日に完成し、只見町に同日付け工事引渡をおこない完了。

【R252「二本木橋」】

唯一無二の重要道路であり、降雪期前の仮橋、新ルートによる復旧を北陸地方整備局が直轄権限代行により実施。

【金山町道「西部橋」】

町道落橋により、新ルートによる災害復旧事業を北陸地方整備局が受託工事により実施。

平成23年7月新潟・福島豪雨災害(権限代行及び受託)復旧工事の進捗状況

国道252号二本木橋災害復旧事業(直轄権限代行事業)



被災前の状況写真



現在の工事状況写真

平成25年5月23日に主桁が閉合され、5月末にジャッキダウンが完了し主桁架設が完了。1日も早い供用を目指し床版工、地覆高欄工、橋面工等を進めて行く。

平成23年7月新潟・福島豪雨災害(権限代行及び受託)復旧工事の進捗状況

金山町道土倉・西部線 西部橋災害復旧事業(受託工事)



被災前の状況写真



現在の工事状況写真

只見川上流約350m  
上流に再度災を避  
けるため新ルートで  
改良。  
現在、新橋の下部  
工が完了し、上部工  
(トラストランガー)架設  
用ケーブルクレーン鉄塔  
の組み立てを進め  
ている。
