

工事内容

工事名： 令和5年度岩野水源撤去受託外工事

受注者 畑八開発株式会社

場 所： 長野県長野市松代町岩野地先


工 期： 令和5年8月8日～令和6年3月29日

(進捗率94.2%)

現在の工事の状況

○岩野工区、工事用道路撤去

○横田工区、河道掘削完了

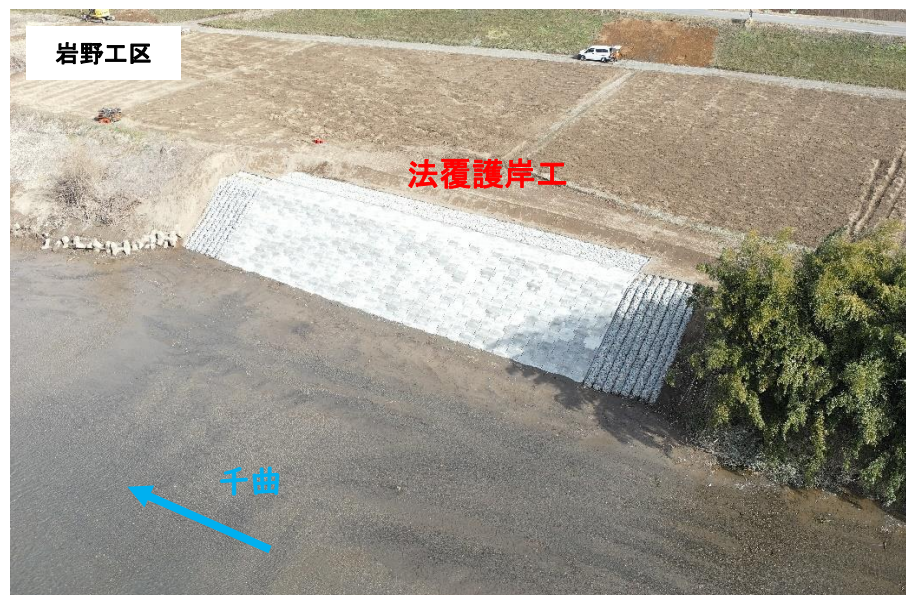

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

岩野工区

2月末で法覆護岸工が完了し、3月には工事用道路撤去後、竣工となります。

横田工区

1月末で、畑八開発施工分の河道掘削が完了しました。
