

とうみしもとうんの
長野県権限代行区間（長野県東御市本海野地先）の
災害復旧工事における護岸工の不具合事象の発生について
＜再施工の進捗状況等について＞
（第4報）

＜概要＞

令和元年台風19号で被災した長野県東御市本海野地先における災害復旧工事に係る不具合については、令和3年2月8日から再施工に着手し、工事を進めています。

4月上旬には不具合のあった大型ブロック等の撤去を終え、その後、法面整形、法留基礎工の設置等を行い、現在、大型ブロック張工を進めるとともに、堤防の安全性を更に高めるため、現地に存置していた一部の護岸を撤去して新たな護岸とする工事を追加しました。

現在のところ、法覆大型ブロック張工の完成が6月中旬頃、工事の全体の完成が6月末となる見込みです。

＜工事の進捗状況＞

（別紙） 今までの作業状況、今後の予定、工事工程表

同時資料配布記者クラブ

長野市政クラブ
長野県庁会見場
その他専門紙

問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部

河川工事課長 田邊 雄司

河川工事課長補佐 小野 伊佐緒

（代表：025-280-8880 直通：025-280-8965）

長野県権限代行区間 位置図



不具合事象が発生した長野県東御市本海野地先




※令和2年12月28日記者発表「長野県権限代行区間（長野県東御市本海野地先）の災害復旧工事における護岸工の不具合事象の発生について」にも掲載。

(別紙)

今までの作業状況

■ 防音シート設置

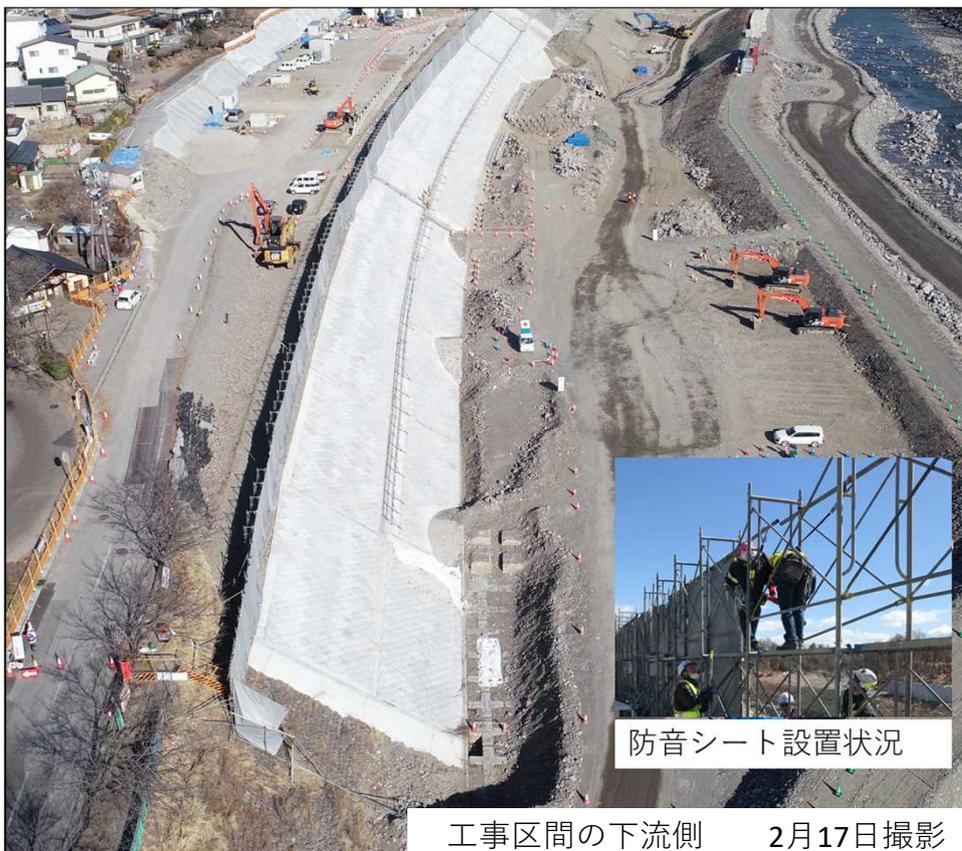


■ 大型ブロック等の撤去



(別紙)

今までの作業状況

■ 既設護岸調査・設計

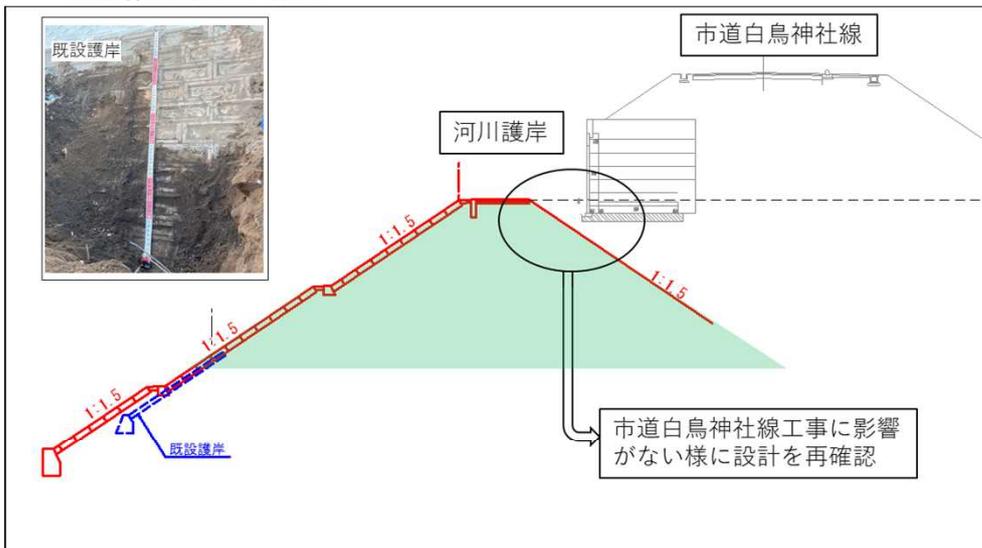

■ 盛土工



(別紙)

今までの作業状況

■ 法面整形工



■ 護岸工(大型ブロック据付)



今までの作業状況

■ 護岸工(胴込めコンクリート)



工事区間の中間付近 4月23日撮影

今後の予定

■ 護岸完了予定



R3.3.25 撮影

工事工程

時期	2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工	準備工					
撤去工	撤去工	撤去工	撤去工			
護岸構築		護岸構築	護岸構築	護岸構築	護岸構築	
水制工			水制工	水制工	水制工	
護岸工完成					護岸工完成	
締切盛土撤去・天端舗装					締切盛土撤去・天端舗装	

■ 実線:実績 □ 斜線:予定
