



有間川橋架替下部その2工事



令和7年 3月吉日



株式会社 高舘組

工期: 令和6年4月1日~令和8年3月27日(進捗率19.7%)


事業の概要

- 道路土工 1式 残土処理工 1式
- 下部工 1式 A 2橋台 1基 P 2橋脚 1基
- 構造物撤去工 1式 A 2橋台 1基 P 2橋脚 1基
- 法覆護岸工 1式 ○仮設工 1式



来月の現場イメージ

有間川橋架替下部その2工事 [現況 39%]
 ⑤土留鋼矢板 [仮設 41%]
 [重機 41%]

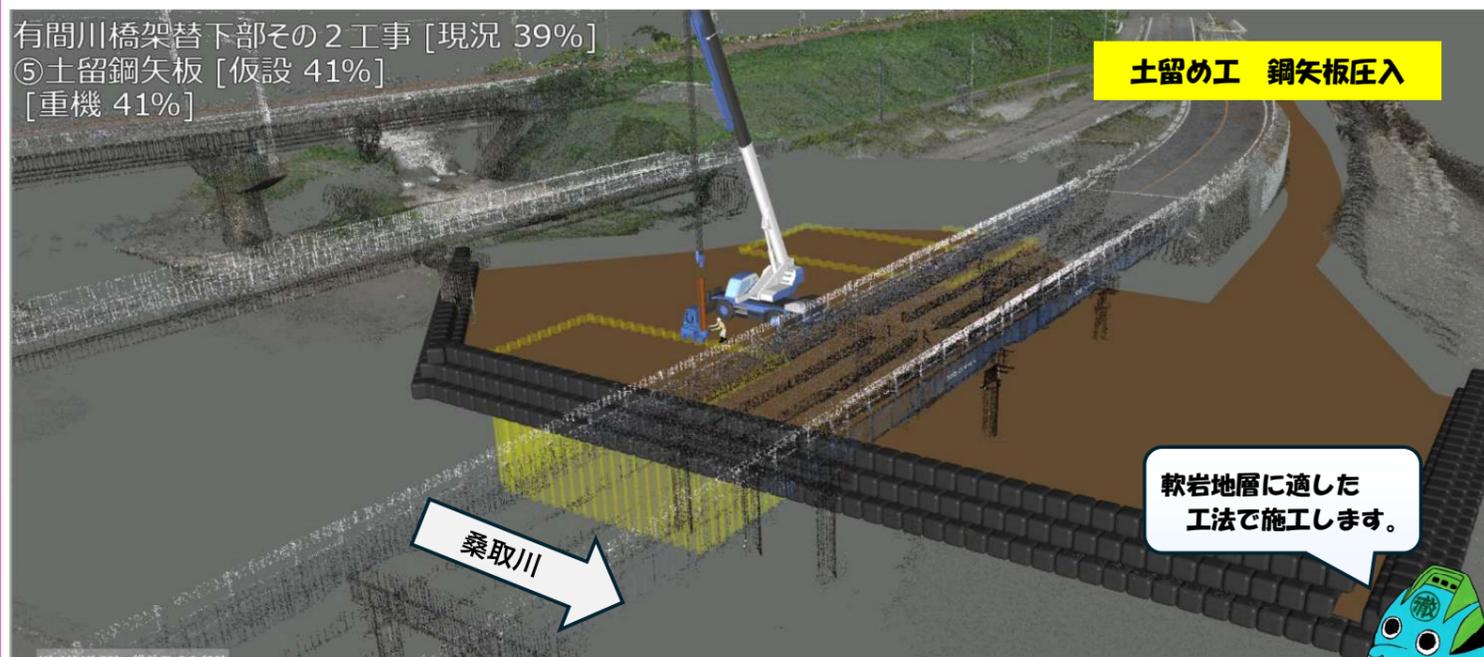

土留め工 鋼矢板圧入

軟岩地層に適した工法で施工します。

桑取川



進捗状況と今後の予定

2月は、降雪を伴いながら、既設構造物の取壊しを行いました。地中部は、土留め工施工後の取壊しとなります。
 3月は、P2橋脚の土留め 鋼矢板圧入作業となります。



既設構造物取壊し状況

その他

海苔漁のためのスロープ造成



上巻: 有間川橋架替下部その2工事
 工事名: 海苔漁のためのスロープ造成
 地元協力
 海苔漁のためのスロープ造成

過積載の防止 発注者立会



上巻: 有間川橋架替下部その2工事
 工事名: 過積載の防止
 発注者立会
 トラックゲージによる積載量の確認
 立会: 発注者立会
