



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



国土交通省
高田かわこく
河川国道事務所

（青海川橋架替）



株式会社 谷村建設


工事名：青海川橋架替下部撤去工事

工 期：R4年3月2日～R5年1月30日（進捗率98.3%）

11月30日現在



11月末現況写真

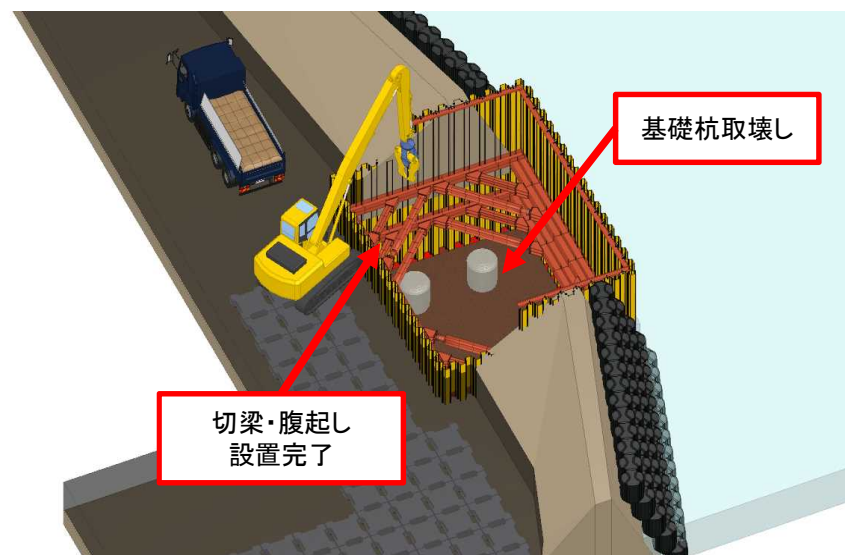

11月度進捗図

◇TOPICS

橋脚撤去作業を引続き行っています。現在は二段目の切梁・腹起し設置作業が完了し、残りの作業は基礎杭の取壊しのみとなっています。12月をもって現場作業が完了予定となります。引き続き、建設機械の騒音・振動が懸念されます。地域住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解ご協力をお願いいたします。



現場代理人
猪又拓哉



監理技術者
黒坂研
