

国道8号上越市茶屋ヶ原地先 復旧工事状況

No.3



◆事象時系列

日	時刻	段階	周辺道路の規制状況・復旧対応
1/1(月)	16:10	状況確認調査	・地震発生（上越地域最大震度5強）
	17:00		・上越市茶屋ヶ原地先で土砂崩落の情報 → 全面通行止め
1/2(火)	6:30	応急復旧	・代替路として北陸道・上信越道を無料措置
1/3(水)	8:00		・崩落土撤去作業開始
1/4(木)～6(火)	-		・崩落土撤去、ロッククライミングマシンによる不安定土塊の撤去
1/7(日)～9(火)	-		・法面下部の崩落土及び倒壊したコンクリート擁壁の撤去、法面上部の金網設置
1/10(水)～11(木)	-		・1/9(火)佐渡付近発生地震（上越震度4）を受けて点検実施→直江津側変状を確認→法面下での作業中止 ・安全な箇所での作業継続（法面上部の金網設置、糸魚川側からの崩落土撤去）
1/12(金)～14(日)	-		・崩落土及びコンクリート擁壁撤去、法面上部の金網設置、ロッククライミングマシンによる不安定土塊の撤去→不安定土塊の撤去完了
1/15(月)～18(木)	-		・崩落土及びコンクリート擁壁撤去、法面上部の金網設置 ビル解体用の大型重機による法面中間部の崩落土撤去

R6. 1. 18(木)15時00分

◆復旧作業進捗状況




1/2(火)10時撮影



1/17(水)11時撮影



1/2(火)10時撮影

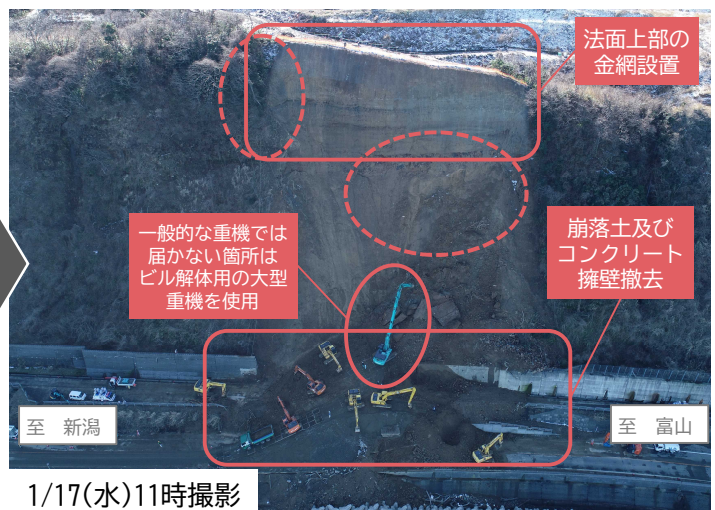

1/17(水)11時撮影

◆作業状況



ロッククライミングマシンでの作業【1/12(金)11時撮影】



ビル解体用の大型重機による法面中間部の崩落土撤去作業【1/17(水)10時撮影】



法面上部の金網設置作業【1/18(木)10時撮影】
