

工事名：神通川・成子堤防強化その9 工事
受注者：藤川建設株式会社
場 所：富山市婦中町青島地先
工 期：令和3年8月20日 ～ 令和4年2月28日（実工期）
進捗率 47%（1月15日時点）

現場紹介

本工事は、神通川新保大橋上流部左岸において、護岸工（L=196m）を施工する工事です。施工延長が長く、法覆護岸工の石張工3695m²あり、大変工程が厳しい中、週休2日を確保しながら工事を進めています。また上下流に工事が発注されており、資材搬入ルート等の調整を3社で日々行っています。現在、上段の石張工及び下段護岸基礎が完了し、下段の法覆護岸工の隔壁・遮水シートを施工しています。年末の大雪及び1/13の大雪で、早朝より除雪を行うとともに、隔壁・遮水シート施工部は人力で除雪を行って、工程が少しでも遅れが生じないように努力しています。

当工事現場では、毎月工事の進捗及び現場での些細な出来事（例：女性学生の現場見学・現場付近でのテレビの撮影など）次ページ工事便りを作成し、掲示板に掲示・地元配布したりし、通行される方・地元の方とコミュニケーションを図っています。

ヘルメット女子のつぶやき。。。


数年前（ぼやかし…）、資格はあるものの、水道屋から土木業界への再就職で右も左もわからないところからのスタート。月日は矢のように過ぎ、そんなヘルメット女子も立派なおばさんとなり、川の仕事はこの現場で3つ目となりました。たくさんの方が技術と知恵と力を合わせて行う工事は素晴らしいと感じつつ、微力ながらその末端を担えることにひそやかな喜びを感じて過ごしています！

去年のようなドカ雪にならないことを祈りながら、無事故で工事を終わられるよう施工を進めて参ります。


（監理技術者：長澤久美子）



【着手前】

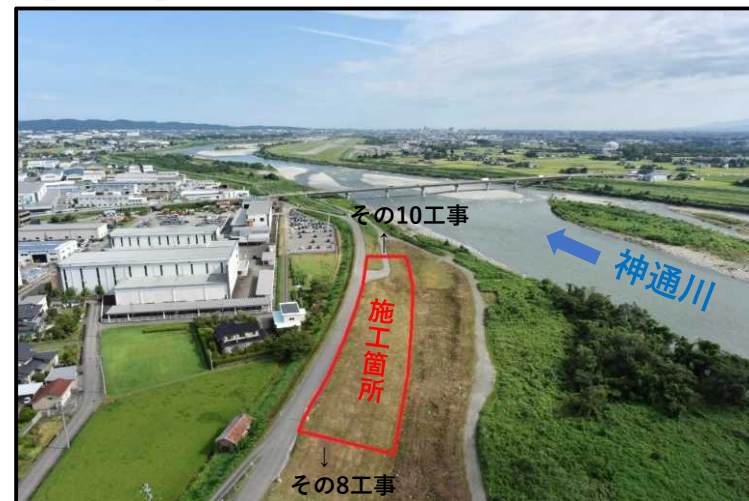

【進捗図】

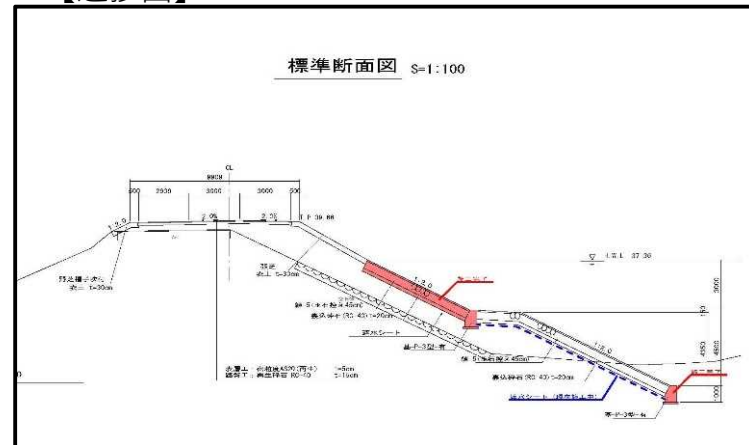

【除雪状況】



12月度 成子堤防強化

その9工事便り

11月は上段部の基礎ブロック施工及び石張工事の施工を行いました。上旬・中旬は天候もよく順調に進んできましたが、下旬は雨の日も多く、気温も下がり石張工の施工において、仮設屋根を使用し施工を行っています。12月上旬には上段の施工が完了予定です。石張工完了後、下段の掘削作業を行います。12月からは当施工下流部のその10工事をはじめ、今まで以上に工事車両の通行が多くなると思いますが**住民の皆様にはご協力をお願いいたします。**




石張施工状況

工事名 神邊川・成子堤防強化その9工事
法覆護岸工 No.163+17.16
石張工 No.165
月山コンクリート
打設状況
藤川建設株式会社



雨天時施工状況

11月19日に部分月食があり、当現場終了後PM6:00ごろ部分月食が見ることが出来ました。皆さんは見る事が出来たか？月食は、太陽・地球・月が一直線上に並び、月が地球の陰に入ることによって欠けて見える現象です。次回の月食は来年11月8日に皆既月食になるそうです。



11月19日月食



現場からの立山連峰

12月に入り、山もだいぶん白くなってきました。工程に大きな影響があるので、今年は昨年みたいな大雪にならないことを願うばかりです。

