

## 日本海沿岸東北自動車道(日沿道)


# 日本海沿岸東北自動車道(日沿道)

## 工事進捗状況! Ver.4

～ H22年度内開通まで まっしぐら～

平成22年度開通を目指して新潟国道事務所及び羽越河川国道事務所が事業を進めている日本海沿岸東北自動車道の神林岩船港IC～朝日まほろばIC間の工事進捗状況(1月末)についてお知らせします。

### 位置図

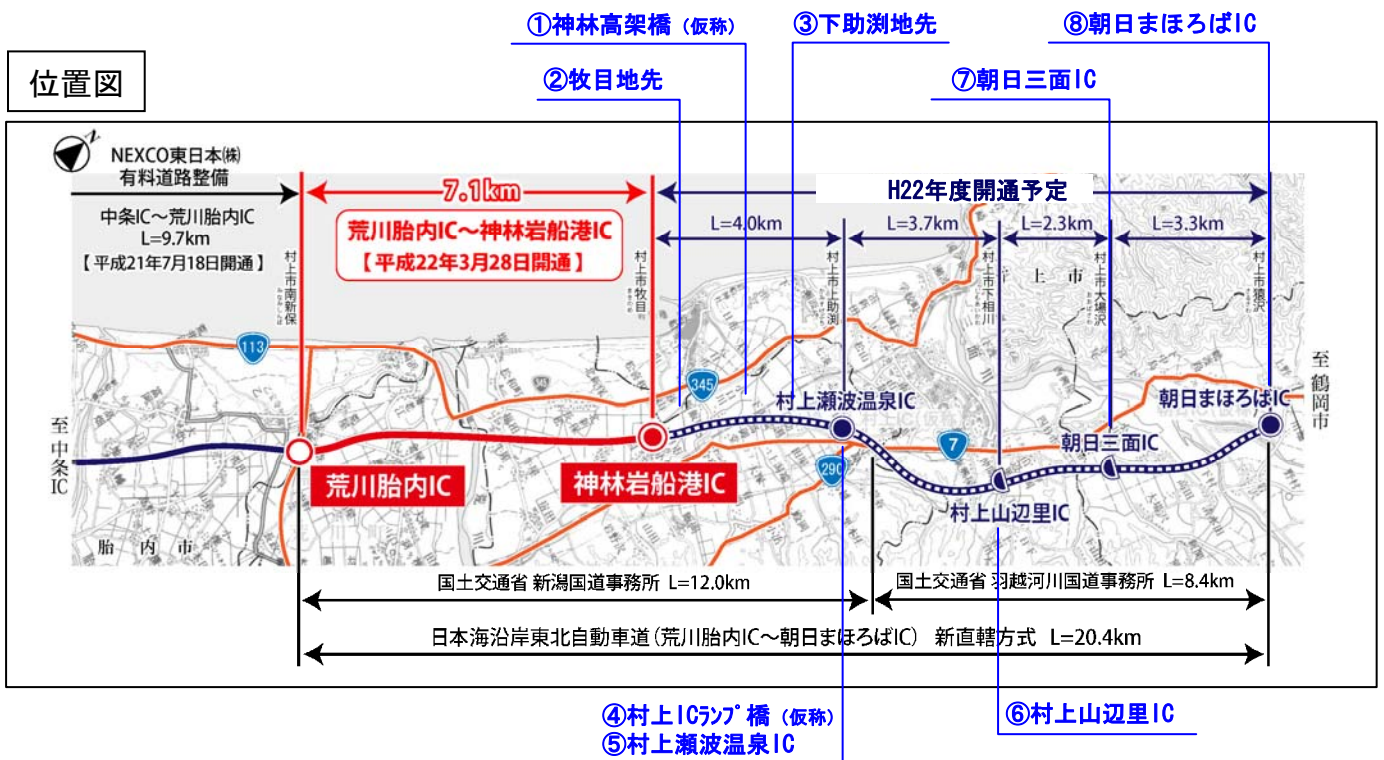

### お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局

新潟国道事務所 : 工務第一課長 山田 一夫 (内線411) TEL 025-244-2159 (代表)


羽越河川国道事務所 : 工務第二課長 嶋倉 正幸 (内線411) TEL 0254-62-3211 (代表)



新潟国道事務所

〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65

<http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/>



国土交通省北陸地方整備局

羽越河川国道事務所

〒959-3196 新潟県村上市藤沢27-1

<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/>



国土交通省北陸地方整備局

# ○日沿道の施工状況

## ①神林高架橋（仮称）[L=1,451m]



付属物工事を行っています

- 【A1～P20】
- ☆舗装工事が完了しています。
- 付属物工事を推進しています。
- ◎2月の予定 付属物工事の推進。



付属物工事を行っています

- 【P20～P26】
- ☆舗装工事のうち基層工まで完了しています。
- 付属物工事を推進しています。
- ◎2月の予定 付属物工事の推進。

橋梁部舗装構成

表	層(アスファルト)
基	層(アスファルト)



付属物工事を行っています

- 【P26～A2】
- ☆床版工事が完了しています。
- 付属物工事を推進しています。
- ◎2月の予定 舗装工事(基層工)の推進。  
付属物工事の推進。

橋梁部舗装構成


表	層(アスファルト)
基	層(アスファルト)

☆工事の完了状況 ○現在の工事状況 ◎今後の工事予定

付属物：防護柵、情報BOX、標識、情報板、CCTV、照明、気象観測装置、非常電話、検査路(橋梁部) 等

## ○日沿道の施工状況

### ②牧目地先 [L=690m(神林岩船港IC～神林高架橋(仮称))] ]

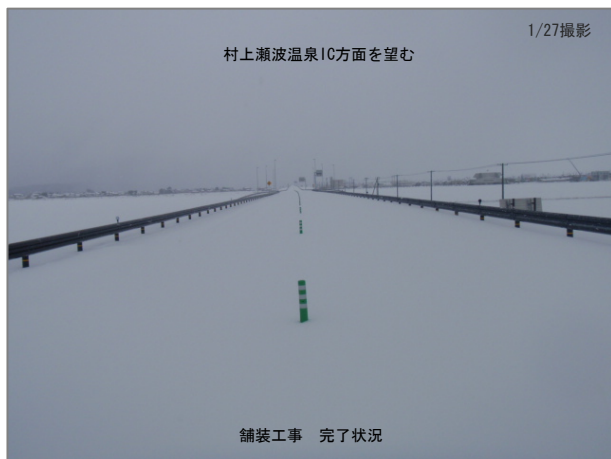

付属物工事を行っています

☆舗装工事が完了しています。

○付属物工事を推進しています。

◎2月の予定 付属物工事の推進。

### ③下助瀧地先 [L=1,420m(神林高架橋(仮称)～山元トンネル(仮称))] ]



付属物工事を行っています

☆舗装工事が(一部を除き)完了しています。

○付属物工事を推進しています。

◎2月の予定 付属物工事の推進。

☆工事の完了状況 ○現在の工事状況 ◎今後の工事予定

付属物：防護柵、情報BOX、標識、情報板、CCTV、照明、気象観測装置、非常電話、検査路(橋梁部) 等

## ○日沿道の施工状況

### ④村上ICランプ橋（仮称） [L=68m]



#### 付属物工事をを行っています

- ☆上部工事が完了しています。
- ☆舗装工事が完了しています。

○付属物工事を推進しています。

◎2月の予定 付属物工事の推進。

### ⑤村上瀬波温泉IC



#### 付属物工事をを行っています

☆改良工事、舗装工事（一部を除き）が完了しています。

○付属物工事を推進しています。

◎2月の予定 付属物工事の推進。

☆工事の完了状況 ○現在の工事状況 ◎今後の工事予定

付属物：防護柵、情報BOX、標識、情報板、CCTV、照明、気象観測装置、非常電話、検査路（橋梁部）等

## ○日沿道の施工状況

### ⑥村上山辺里 I C



付属物工事を行っています

- ☆舗装工事が完了しています。
- 付属物工事を推進しています。
- ◎2月の予定 付属物工事の推進。



付属物工事を行っています

- ☆舗装工事が完了しています。
- 付属物工事を推進しています。
- ◎2月の予定 付属物工事の推進。

### ⑦朝日三面 I C



付属物工事を行っています

- ☆舗装工事が完了しています。
- 付属物工事を推進しています。
- ◎2月の予定 付属物工事の推進。

村上瀬波温泉 I C～朝日まほろば I Cは羽越河川国道事務所が施工しています。  
詳細は羽越河川国道事務所HPをご覧ください。 <http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html>

☆工事の完了状況 ○現在の工事状況 ◎今後の工事予定

付属物：防護柵、情報BOX、標識、情報板、CCTV、照明、気象観測装置、非常電話、検査路(橋梁部) 等



## ○日沿道の施工状況

### ⑧朝日まほろば I C



#### 付属物工事を行っています

☆舗装工事が(一部を除き)完了しています。

○付属物工事を推進しています。

◎2月の予定 付属物工事の推進。

#### 一般部舗装構成

表	層 (アスファルト)
基	層 (アスファルト)
上層	路盤 (アスファルト安定処理)
上層	路盤 (砕石路盤)
下層	路盤 (砕石路盤)



#### 付属物工事を行っています

☆舗装工事が完了しています。

○付属物工事を推進しています。

◎2月の予定 付属物工事の推進。

村上瀬波温泉 I C～朝日まほろば I Cは羽越河川国道事務所が施工しています。  
詳細は羽越河川国道事務所HPをご覧ください。 <http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html>

☆工事の完了状況 ○現在の工事状況 ◎今後の工事予定

付属物：防護柵、情報BOX、標識、情報板、CCTV、照明、気象観測装置、非常電話、検査路(橋梁部) 等
