

工事名: 南陸郷護岸災害復旧 工事

受注者 株式会社 傳刀組


場 所: 長野県安曇野市明科南陸郷地先

工 期: 令和3年2月26日

(計画1.0% 進捗率1.0%)

現在の工事の状況

9月末現在、未着手。
詳細設計がほぼ完了しました。
10/13より現場事務所等の設置を行います。

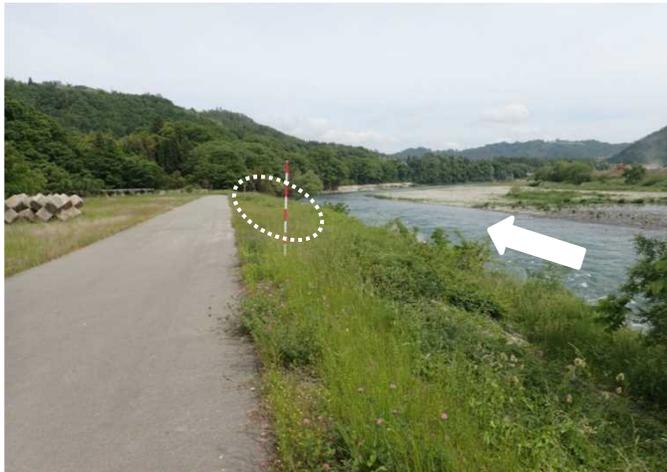

着 手 前



9月末現場状況

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

詳細設計の照査結果検討部会及び安全ヒヤリングの結果を受けて、
10月下旬より、瀬替掘削並びに根固めブロック製作に着手したいと思います。
