

工事名: 木島護岸その10工事

受注者: 藤森建設工業(株)

場 所: 飯山市坂井地先

工 期: 令和 2年 7月 7日 ~ 令和 3年 2月 5日


(進捗率 95.4 %)

現在の工事状況

鋼矢板護岸工の隣接工区(木島護岸その9工事)との接続が完了し、笠コンクリートの設置が完了しました。

大型連節コンクリートブロック工は、当初発注数量の580m²は施工完了し、増工分のブロックを手配中です。

法覆護岸工

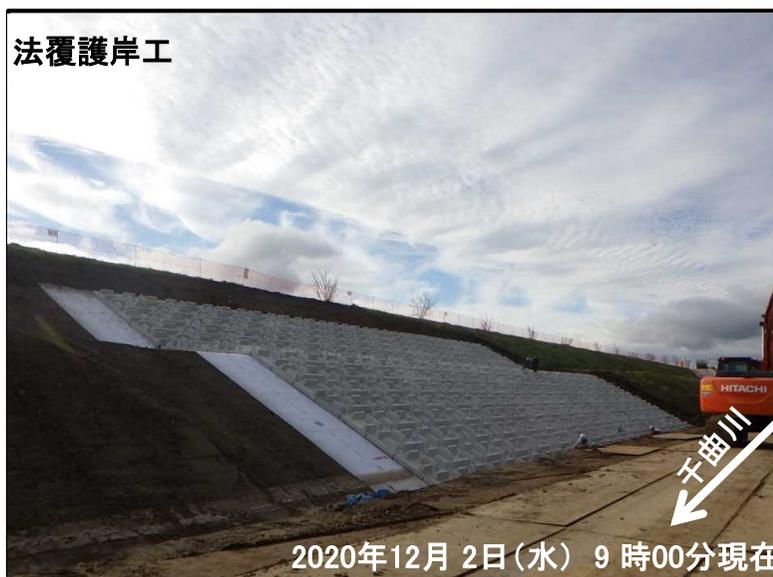

2020年12月 2日(水) 9 時00分現在

矢板護岸工



2020年12月11日(金) 13時30分現在

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

隣接工区(木島護岸その9工事)との鋼矢板の接合は、幅広鋼矢板の工場加工が必要となり、調整する延長等を慎重に計測することにより加工する矢板の形状を検討しました。

また、打設時には、鋼矢板打設による変位等が生じない様、垂直管理等十分注意して打設し、全ての鋼矢板のセクションを結合して打設を完了できました。

鋼矢板の工場加工が予定より短い期間で完了し搬入できたので、降雪の前に打設が完了し、クローラークレーン解体・搬出を完了することができました。
