

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

平成30年6月号 (No.21)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)

1. 補強工事の進捗について

【仮排水トンネル工】

5月10日に覆工（アーチ巻立て）の打設を完了し、トンネル部の施工は終了しました。呑口部は5月29日に呑口の底版コンクリートを打設を行い、引続き呑口流入部、導流壁の施工を行っています。

【仮締切工】

仮締切内の湖底堆積層の掘削・運搬・仮置きを5月30日で完了しました。引続き、仮締切内をトンネル掘削土砂にて埋め戻す作業を行っています。



トンネルアーチ部の覆工型枠と呑口部の鉄筋



湖底堆積土砂撤去状況(希望大橋より)



湖底堆積土砂撤去状況(左岸側より)


2. 工事工程

【仮排水トンネル工】

トンネル部はアーチ部覆工コンクリートの硬化後、型枠を解体します。呑口部は越流部、導流壁の施工を6月末まで行います。7月初旬にはトンネルに水を迂回させる『転流』を行う予定としています。

【仮締切工】

左岸側仮締切内をトンネル掘削土砂にて埋め戻す作業を行います。途中、鋼管杭の補強としてタイロッド（鋼管杭の補強材）を設置します。6月末までに、鋼管天端まで土砂を埋める予定です。

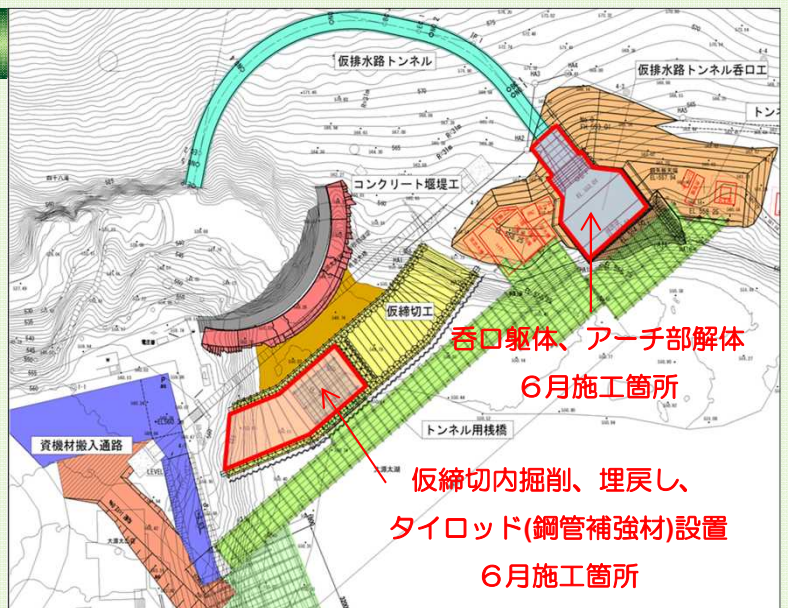

工種	6月の工事工程																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
仮排水トンネル工		型枠			打設		呑口部足場・鉄筋				型枠組立					打設						養生				型枠解体		定場解体			
仮締切工		埋戻し					タイロッド					タイロッド設置						埋戻し						ジャッキ				埋戻し			

3. 谷後地区取水堰の濁水流下防止対策について

冬期間撤去していた谷後地区取水堰取水口の濁水防止フィルターの設置作業を6月11日～13日（予備日14、15日）に行う予定としております。

復旧作業にあたり、作業中の濁りが流下する恐れがあるため、一時的に取水を停止しながら作業いたします。

谷後地区の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。



完成予定写真

4. 仮締切工発生土の運搬について

締切工の湖底堆積層掘削に伴い発生した土砂の運搬・仮置き（1期施工）は、5月30日をもって終了しました。滝ノ又地区の皆様には、ダンプトラックの往来等でご不便をお掛けいたしました。ありがとうございました。

今後、2期施工時において運搬場所、方法が決まりましたら改めてご案内したいと思います。今後ともご協力のほど、よろしくお願い致します。



土砂仮置状況（滝ノ又仮置場）

5. 『越後湯沢ユニバーサルウォーク』が開催されました

去る5月26日（土）、湯沢町観光協会等が主催する『第9回越後湯沢ユニバーサルウォーク』が開催されました。当日はそれぞれのコースにて自由にウォーキングを楽しまれました。

ロングコースの大源太コース（15km）には、約100名の方が参加され、山々に残る残雪と新緑を満喫されました。堰堤付近では多くの方々が立ち止まり、堰堤や工事の様子をご覧になっていました。



個人のペースで参加するユニバーサルウォーク

大源太湖付近は新緑が美しく、湖の魚も暖かくなって動きが活発になってきました。

回覧板をご覧の皆様も、散策されて初夏の大源太を味わってみてはいかがでしょうか。

〈遊歩道周回はゆっくり歩いて30分程度です〉



堰堤や工事の様子をご覧になる参加者

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ	国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）	TEL 025(784)2264
	佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所	TEL 025(775)7948
