

# だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

平成30年11月号 (No.26)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所  
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所  
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)

## 1. 補強工事の進捗について

### 【仮締切工】

右岸上流部止水鋼矢板の施工は（今年度施工70枚）、9月27日より中央側から順次施工を行い、10月31日で残り13枚となっています。11月上旬に完了予定です。




左岸側は、鋼矢板の頭部を、タイロッドという鋼材で固定した後、10月末に盛土を行いました。



止水鋼矢板施工状況



タイロッド施工状況

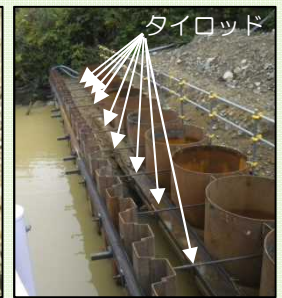

タイロッド設置完了

## 2. 工事工程

### 【仮締切工】

右岸上流部の止水鋼矢板（70枚）の施工は、11月上旬で施工を終える予定です。


その後、上流側鋼管杭（10本）の追加施工を行うため機械を搬入し、12日より鋼管圧入を開始します。鋼管杭の追加施工は11月下旬迄を予定しています。

鋼管杭完了後、湖底堆積層の撤去、土砂の埋戻し作業を行います。湖底堆積層は大源太川下流右岸仮置き場へダンプトラックを使用し、運搬いたします。

### 【仮設備の撤去】

冬を迎えるにあたり、設置している仮設備を順次、撤去いたします。

### 【11月の施工予定】

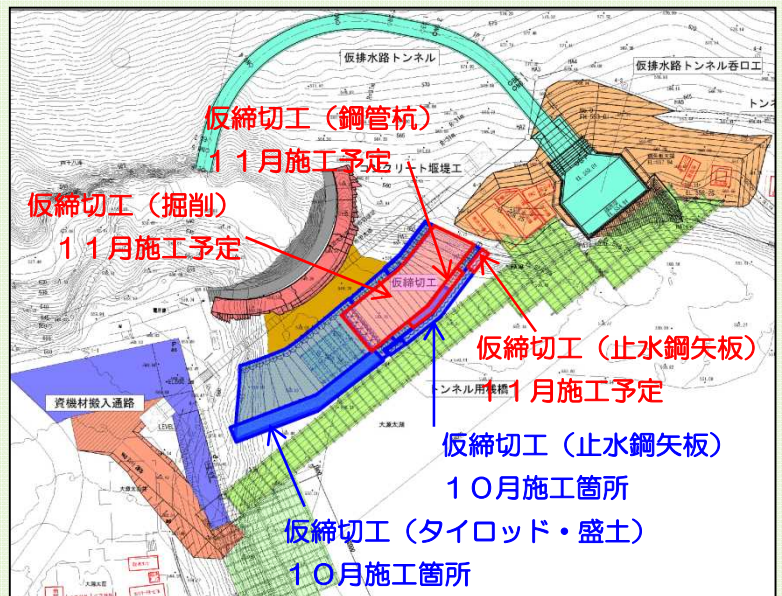

工種	11月の工事工程																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
仮締切工 （止水鋼矢板）	鋼矢板圧入				機械搬出																										
仮締切工 （鋼管杭）							機械組立				鋼管杭圧入				鋼管杭圧入								機械搬出								
仮締切工 （掘削工）											計測器設置				計測器設置												掘削				

### 3. 仮締切工発生土の運搬について。

締切工の湖底堆積土掘削に伴い発生する土砂を、大源太川下流右岸部の仮置場へ搬出します。ダンプトラック運搬ルートはH28年11月と同様に、県道457号から滝ノ又地区を抜けるルートで計画しています。運搬時期は11月下旬から12月中旬（うち13日程度）を予定しています。近隣の皆様にご迷惑とならないよう、環境対策等十分配慮し進めてまいりますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。滝ノ又地区の皆さんへは、詳細決まりましたらお知らせします。



今年度の掘削、積込、土砂仮置状況

ダンプトラック運搬経路図

### 4. 大源太の紅葉がピークです。

大源太湖周辺では今、紅葉がピークとなり、連日多くの観光客で賑わっています。さらに、10月31日(水)には大源太山の頂が冠雪し、紅葉とのコラボレーションが美しくなっていました。

是非、大源太湖に遊びに来て頂ければと思います。



大源太湖に映る紅葉も美しい



初冠雪した大源太山



観光客で賑わう希望大橋

#### 【降雪前の仮設物等撤去について】

- ・冬期降雪前の準備として、旭原公園脇の仮設フェンスを11月下旬に撤去します。撤去後は公園と工事用道路との境に単管バリケードを設置しますので、引き続き現場内に立ち入らないようよろしくお願い致します。
- ・希望大橋床板の撤去に併せ、右岸側遊歩道の防護柵も取り外しを行います。11月下旬より周遊路は通行できなくなりますのでよろしくお願い致します。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。  
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ	国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）	TEL 025(784)2264
	佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所	TEL 025(775)7948
