

工事内容

工事名: R4・5年度大町ダム等再編七倉区間光ケーブル敷設工事

受注者 丸登電業株式会社

場 所: 長野県大町市平地先

工 期: 令和 6年 3月 15日


(令和 5年 11月末現在 計画率 87.3%/進捗率 87.3%)

現在の工事の状況

・新設自営柱設置(3箇所)／橋梁配管(2箇所)／トンネル支持金物設置(2箇所) 完了
光ケーブルの敷設作業 (8,520m) 及び光ケーブルの接続作業 (12箇所) 完了
現在、追加機器の製造を実施しております



光成端箱 接続
着手前

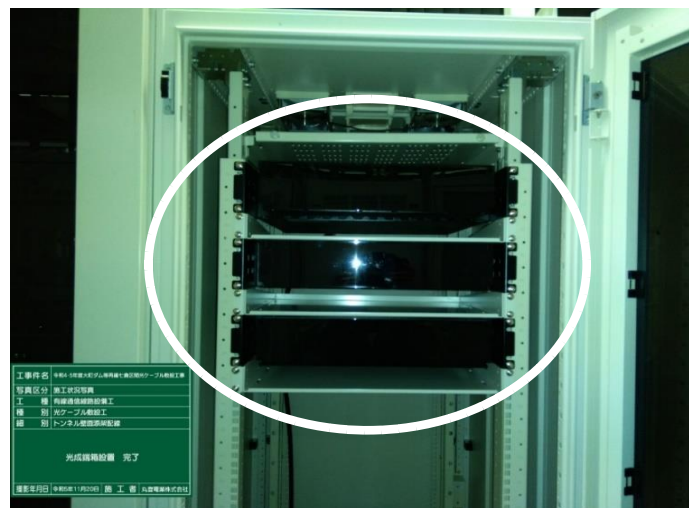

光成端箱 接続
完成

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

・大町ダム管理所から東京電力七倉ゲートまで、ダム管理用の光ケーブルの敷設工事を行っておりましたが、現地作業は全て完了しました。交通規制等、御不便をお掛け致しましたが、御協力ありがとうございました。
