


# 【令和2年度】施工最盛期となっている工事の紹介

- 朝日温海道路は一日も早い完成を目指しており、令和2年7月現在で28の工事が進行中です。
- 本号では28の工事より、施工最盛期となっている8つの工事（下図①～⑧）について、ご紹介いたします。
- 工事中は、地域の皆さまにご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



## 今回紹介する工事箇所

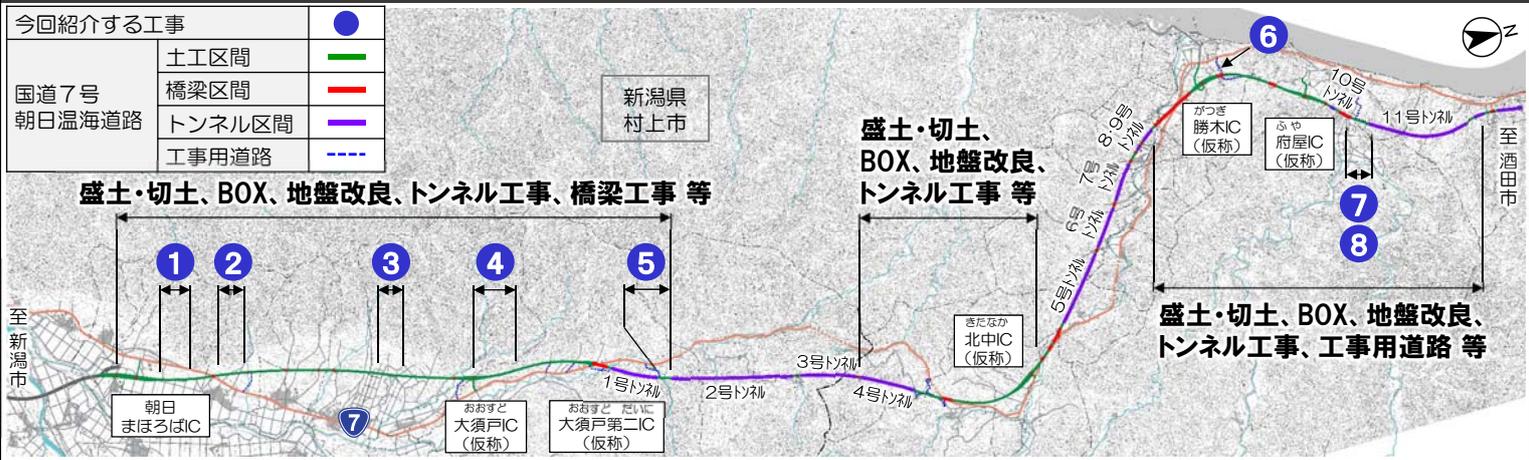

### ① 猿沢地区改良その5工事 (株)坂詰組



工事箇所全景

[工事場所]  
・村上市猿沢地先

[工期]  
・2020.10.8まで

[工事内容]  
・路体盛土工  
・地盤改良工等



現場代理人  
佐藤 一樹

当現場は、国道7号において「介護老人保健施設 杏園」様の裏で猿沢地内の地盤改良工事を行っております。

3月末より工事着手し、現在は地盤改良工事の準備として、排水施設の切り回しや土工を行っております。7月より地盤改良工事が始まります。およそ9月末の完了を目指しております。

資機材の搬入や工事車両の通行で地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけすると思っておりますが安全・環境に配慮して工事を進めていきますので、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

### ② 檜原地区改良工事 (株)山木組



側道施工状況

[工事場所]  
・村上市檜原地先

[工期]  
・2020.9.24まで

[工事内容]  
・地盤改良工  
・側道工等



現場代理人  
高橋 威孔磨

当現場は3月中旬から本格的に工事に着手しました。

機能補償道路及び工事用道路として利用することになる側道工が7月上旬に完了し、7月中旬からは本線盛土部の地盤改良工に取り掛かる予定となっております。

地盤改良工が始まるとセメントを運搬する大型車両の出入りが頻繁になります。

安全管理及び交通管理に留意して工事を進めて参りますので、引き続き工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

## 裏面に続く (③～⑧)

編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所  
計画課

TEL 025-244-2159 (代)  
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65  
村上出張所 TEL 0254-52-7121  
新潟県村上小川川1313-1

■羽越河川国道事務所  
工務第二課

朝日温海道路相談室  
(火・木曜日のみ。祝日除く)

TEL 0254-62-3211 (代)  
新潟県村上市藤沢27-1  
TEL 0254-62-7645  
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、工事の概要や進捗状況等を紹介しています。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiku/now/nichendou/index.html>



# 【令和2年度】施工最盛期となっている工事の紹介 ※表面の続き

## ③ 塩野町地区改良その6工事 (株新潟藤田組)



工事箇所全景

- [工事場所]  
 ・村上市塩野町地先  
 [工期]  
 ・2020.9.15まで  
 [工事内容]  
 ・地盤改良工  
 ・工事用道路工 等



現場代理人  
風間 渡

当現場は、塩野町地内の田圃に囲まれた場所での地盤改良工事となります。現在、工事用道路工及び仮水路工を進めており、今後は地盤改良工事に取り掛かります。

施工に伴い、大型車両の往来が頻繁となりますが、安全管理並びに環境対策にも十分配慮して施工を行いますので、長期にわたりご不便・ご迷惑をおかけしますが、引き続き地元関係者の皆様には工事へのご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

## ④ 大須戸地区道路その2工事 (株横井組)



工事箇所全景

- [工事場所]  
 ・村上市大須戸地先  
 [工期]  
 ・2020.11.30まで  
 [工事内容]  
 ・盛土・切土工事  
 ・排水構造物 等



現場代理人  
谷井 一英

当現場は、大須戸地区において林道新保岳線側から、朝日温海道路本線を施工する為のパイロット道路(1.0km)を造成する工事です。

令和元年8月から施工を開始し、0.5kmのパイロット道路が完成しています。

7月からは、残りのパイロット道路の施工を行って行きます。

地域の住民にはご迷惑をおかけすることありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## ⑤ 大須戸地区函渠工事 (株加賀田組)



銚子沢河川ボックス施工状況

- [工事場所]  
 ・村上市大須戸地先  
 [工期]  
 ・2020.9.30まで  
 [工事内容]  
 ・カルバート工  
 ・路体盛土工 等



現場代理人  
青柳 秀人

当現場は令和元年6月から大須戸地区銚子沢で、河川ボックスを設置する工事を行なっております。

現在の工事内容は、河川ボックス上下流の擁壁工を施工しています。

今後、河川ボックス等の埋戻しで、土砂を運搬する車両が林道銚子沢線を利用するため、皆様方にはご迷惑をお掛けする場合がございますが、9月の完成に向けて無事故、無災害で工事を終れるよう作業を行なってまいりますので、引き続きご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

## ⑥ (山北地区)準備その2工事 (株山木組)



碓石地区工事用道路施工状況

- [工事場所]  
 ・村上市碓石地先  
 [工期]  
 ・2020.9.11まで  
 [工事内容]  
 ・工事用道路  
 ・切削オーバーレイ



現場代理人  
遠山 俊之

当現場は、碓石地区において朝日温海道路の本線を施工するための工事用道路を造る工事になります。

3月より着手し田圃の畦畔・用排水、側溝、盛土を施工してきました。7月からは仮橋2基と擁壁の施工がメインとなり秋頃に完成の予定です。

これまでの工事期間中は地元住民・耕作者の皆様にご協力いただいております。

今後も安全第一で作業を進めていきますので宜しくお願い致します。

## ⑦ (堀ノ内地区)改良工事 (株松山組)



工事箇所全景

- [工事場所]  
 ・村上市堀ノ内地先  
 [工期]  
 ・2020.9.30まで  
 [工事内容]  
 ・路体盛土工  
 ・地盤改良工



現場代理人  
小和田 忠義

当現場は、堀ノ内地区において地盤改良及び路体盛土を行うことを目的とした工事です。工事は令和2年6月下旬より、既設構造物の撤去に着手し、7月中旬より地盤改良を行っていく予定です。

工事期間中は、地域住民の皆様のご生活道路を利用させていただいての工事となります。工事車両の通行には細心の注意を払い、安全運転に努め、地元の方との事故の無いよう工事を進めてまいります。作業員一丸となって災害防止に努めますので、引き続き工事へのご理解とご協力の程よろしく宜しくお願い致します。

## ⑧ (山北地区)準備工事 (株横井組)



工事箇所全景

- [工事場所]  
 ・村上市堀ノ内地先  
 [工期]  
 ・2020.7.31まで  
 [工事内容]  
 ・路体盛土工  
 ・カルバート工 等



現場代理人  
高橋 信幸

当現場は山北地区堀ノ内地内で工事用道路の盛土、用排水路、道路ボックス、地盤改良の工事を行います。工事は令和元年11月より着手し、6月末現在では、工事用道路の盛土、用排水路、道路ボックスの工事が完了しました。今後は地盤改良工事を行っていきます。

工事用道路として利用する堀ノ内農道は、農耕車両も通行する為、地元の方との事故の無いよう工事を進めて参りますので、引き続き工事へのご理解とご協力の程よろしく宜しくお願い致します。
