

復旧完了 神通川堤防一部欠損箇所

平成30年7月豪雨により出水のあった神通川水系神通川では、富山市葛原地先^{つづはら}（大沢野大橋上流左岸）において、堤防断面が欠損したため、次の出水に備え、緊急復旧工事を実施していました。

7月6日19時10分より復旧工事に着手し、24時間体制で実施していましたが、11日18時30分に堤防の復旧が完了する見込みです。

復旧完了後、現地にて富山河川国道事務所長が報告を受ける予定です。

●施工箇所

神通川水系神通川 富山市葛原地先^{つづはら}（大沢野大橋上流左岸22.4km～22.5km）

●完了予定日時

平成30年7月11日（水） 18時30分

●主な工事内容

根固めブロック投入	432個
袋詰玉石投入	333個
堤防復旧盛土	2,200m ³

●復旧工事実施期間

平成30年7月 6日（金）19時10分 開始
平成30年7月11日（水）18時30分 完了予定
（昼夜連続約119時間）

●作業に要した人員

災害協定会社等協力会社	11社	延べ300人（24時間体制）
富山河川国道事務所		延べ 85人（24時間体制）

問い合わせ先


国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

〒930-8537 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>



■ 副所長（河川）	渡邊 一成	TEL：076-443-4701（代表）
■ 工務第一課長	伏木 裕二	TEL：076-443-4709（直通）

神通川水系神通川 富山市葛原地先 緊急復旧工事

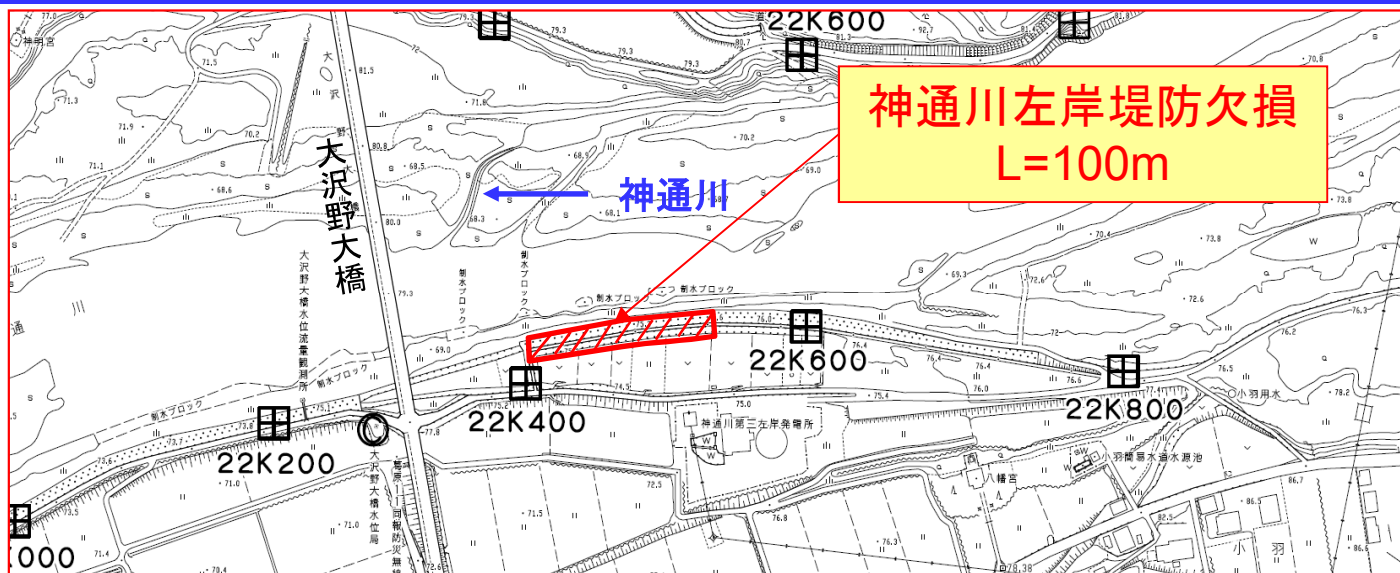

被災状況（平成30年7月6日 11時00分）



復旧状況（平成30年7月11日 7時00分）

復旧工事施工状況 （24時間体制による緊急復旧）



ブロック投入状況（平成30年7月7日 19時頃）



堤防復旧盛土施工状況（平成30年7月9日 21時頃）



袋詰玉石設置状況（平成30年7月10日 20時頃）
