



じょうえつさんわどうろ
国道253号 上越三和道路



9月1日現在


工事名 R7・8上沼道 岡木跨道橋下部その5工事

場所 上越市三和区岡木地先 施工者 株式会社 高館組

工期 R8年4月1日～R9年2月26日(進捗率 49.6%)



現場全景

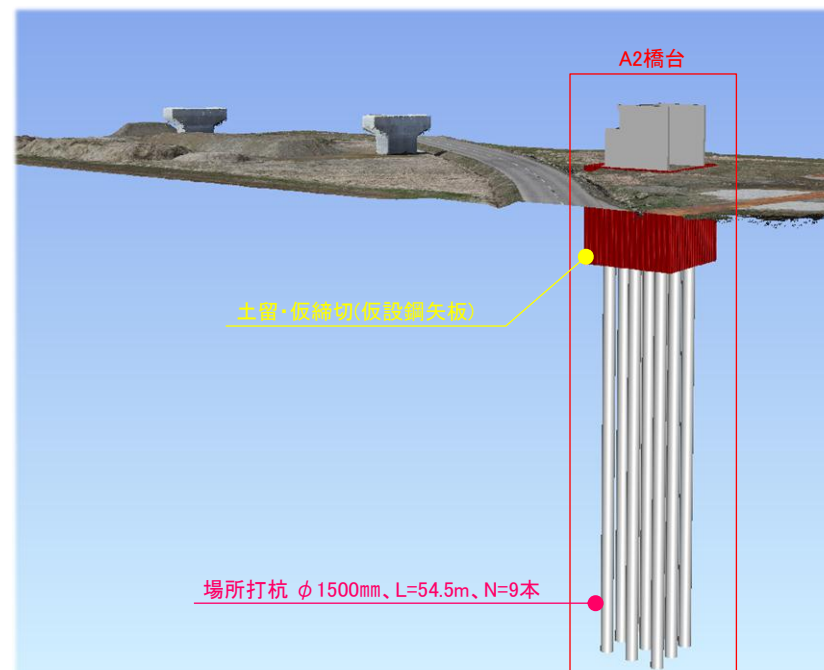

CIMモデル 完成イメージ



『いのち』をつなぐ
上越三和道路



現場代理人 田原 さん

～作業状況について～

現在、場所打杭工事は9本のうち7本が完了し、9月中旬に完了する予定です。場所打杭完了後は、土留・仮締切工事をを行います。

厳しい暑さが続きますが、安全管理と熱中症対策を徹底し、品質を確保しながら、一つひとつの作業を丁寧に進めてまいります。
