みょうこうおおはしかけかえじぎょう

国道18号 妙高大橋架替事業



工事名 妙高大橋架替上部工事


場所 妙高市二俣〜坂口新田地先 施工者 JFEエンジニアリング(株) 工期 令和元年6月12日〜令和3年6月21日(進捗率81.5%)



JFE エンジニアリング 株式会社

9月1日現在

《施工範囲》

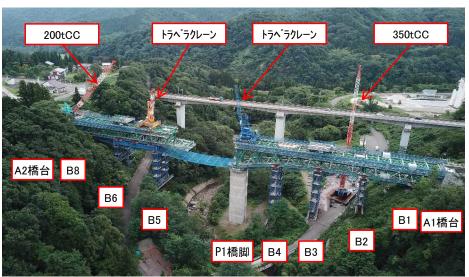

【鋼橋架設工_A1側】 トラヘ・ラクレーンによる縦桁架設状況



【鋼橋架設工_A1側】 トラへ、ラクレーンによる下弦材架設状況





現場代理人 吉良 さん

~作業状況について~

9月1日現在、トラベラクレーンによる架設を施工しています。A1側はP1橋脚まで完了、A2側はトラベラクレーンよる架設が残り1ブロックのみとなりました。

今後は、9月下旬に閉合プロックの架設、10月からペント 設備の解体を目指します。

よろしくお願いします。

