

能登半島地震に伴う国道8号・18号の災害復旧工事



向山4・5号洞門上 状況写真

至新潟
至富山



勝山11号洞門上 状況写真

至新潟
至富山




勝山8号洞門上 状況写真

至新潟
至富山

位置図

1 : 125,000

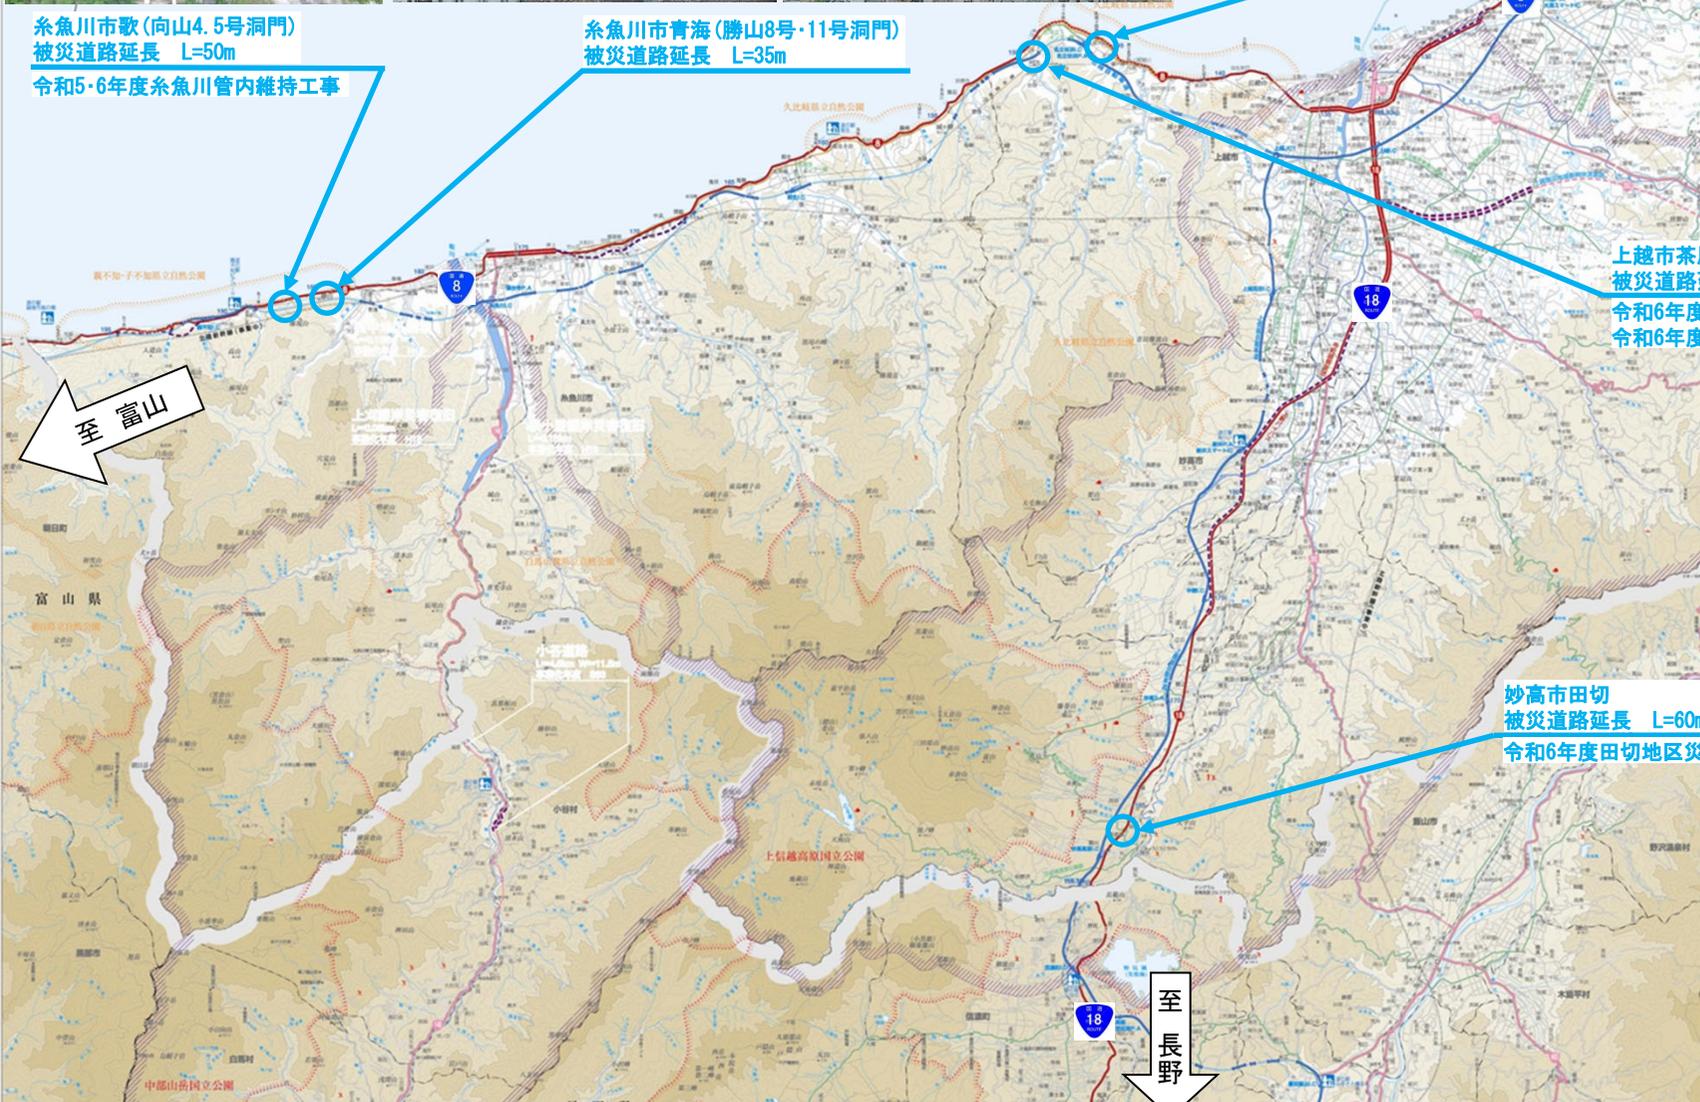

糸魚川市歌(向山4・5号洞門)
被災道路延長 L=50m
令和5・6年度糸魚川管内維持工事

糸魚川市青海(勝山8号・11号洞門)
被災道路延長 L=35m


上越市茶屋ヶ原駐車帯
被災道路延長 L=40m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事



茶屋ヶ原駐車帯 状況写真

至新潟
至富山


上越市茶屋ヶ原
被災道路延長 L=100m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事

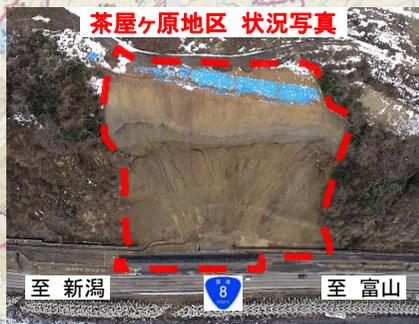

茶屋ヶ原地区 状況写真

至新潟
至富山

妙高市田切
被災道路延長 L=60m
令和6年度田切地区災害復旧工事

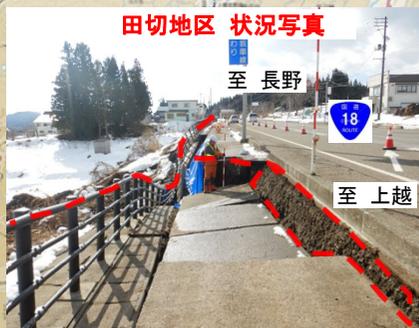

田切地区 状況写真

至長野
至上越

至長野

国道8号 上越市茶屋ヶ原

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
〈工期：R6.6.7～R7.3.25, 施工者：田中産業(株)〉
主な工事：法枠工3700m² 進捗率 0%
- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事
〈工期：R6.6.11～R7.3.25, 施工者：坂井建設(株)〉
主な工事：法枠工3400m² 進捗率 0%

茶屋ヶ原地区 進捗写真



国道8号 上越市茶屋ヶ原駐車帯

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事
〈工期：R6.6.12～R6.12.27,
施工者：武江・大陽経常建設共同企業体〉
主な工事：法枠工1900m² 進捗率 0%

茶屋ヶ原駐車帯 状況写真



国道18号 妙高市田切

- 令和6年度田切地区災害復旧工事
〈工期：R6.6.12～R6.12.27, 施工者：(株)野本組〉
主な工事：掘削工2200m³、路体盛土1600m³、
地盤改良1式、排水構造物工1式
防護柵1式、舗装工1式

進捗率 1.5%

田切地区 状況写真



国道8号 糸魚川市歌(向山4・5号洞門)

- 令和5・6年度糸魚川管内維持工事
〈工期：R5.4.1～R7.3.31, 施工者：笠原建設(株)〉
主な工事：洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去、法面応急処理

応急復旧進捗率 50%

向山4・5号洞門上 状況写真

