

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

平成28年9月号 (No.6)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)

1. 補強工事の進捗について (8月の工事実績)

【仮栈橋工】

栈橋工は、右岸の岸に近い位置まで到達しました。今後は岸に取り付け部分の基礎工を施工し、仮排水トンネル呑口脇の栈橋を施工していきます。



右岸部から見た栈橋



左岸部から見た栈橋

【遊歩道整備工】

8月末より右岸側遊歩道の付替えを行っています。まず、希望大橋右岸部橋詰の階段から施工しています。9月下旬に切り替え予定です。



遊歩道から見た伐採状況



遊歩道(階段)施工状況

【樹木伐採工】

8月末より栈橋の基礎部分と、新しい遊歩道の脇を伐採しました。今後は、遊歩道を切替えた後に、残りを伐採します。伐採時は誘導員を配置しますので、指示に従い通行をお願いします。

2. 9月の工事工程

【仮栈橋工】


右岸側のトンネル用栈橋を延伸していきます。

【遊歩道整備工】

右岸側遊歩道の付替えを9月下旬に完了し、新旧遊歩道の切替を行います。

【樹木伐採工】

一次伐採は9月3日で終了しました。遊歩道切替え後、二次伐採を9月下旬より予定しています。掘削範囲全体を伐採予定です。

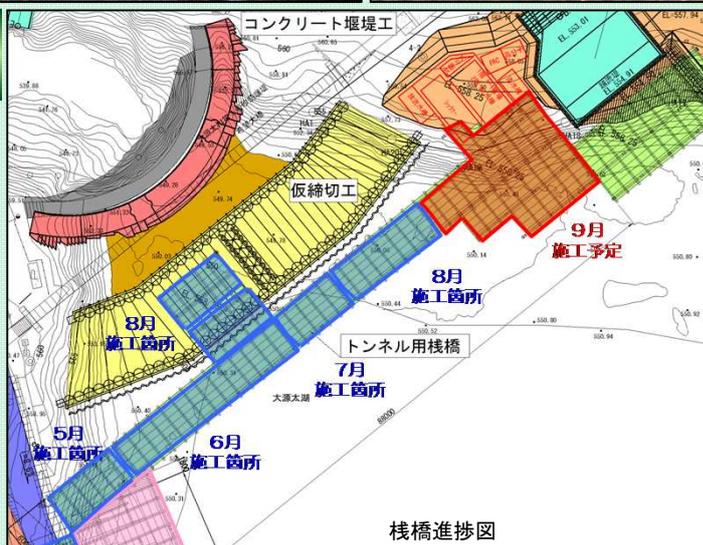

栈橋進捗図

工種	9月の工事工程																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
遊歩道整備工																															
伐採工																															
仮栈橋工 栈橋打設、架設																															
仮栈橋工 基礎工																															

右岸遊歩道付替

右岸遊歩道付替

切替

一次伐採(基礎、新設遊歩道部)

二次伐採(全体)

打設

打設

打設

打設

打設

栈橋基礎工 下流①

栈橋基礎工 下流②

栈橋基礎工 上流

大源太山荘解体による迂回継続

