


叶津川災害関連事業箇所図

施工予定期間：平成23年度～平成26年度

S=1:100,000

平成26年6月末現在
福島県河川整備課

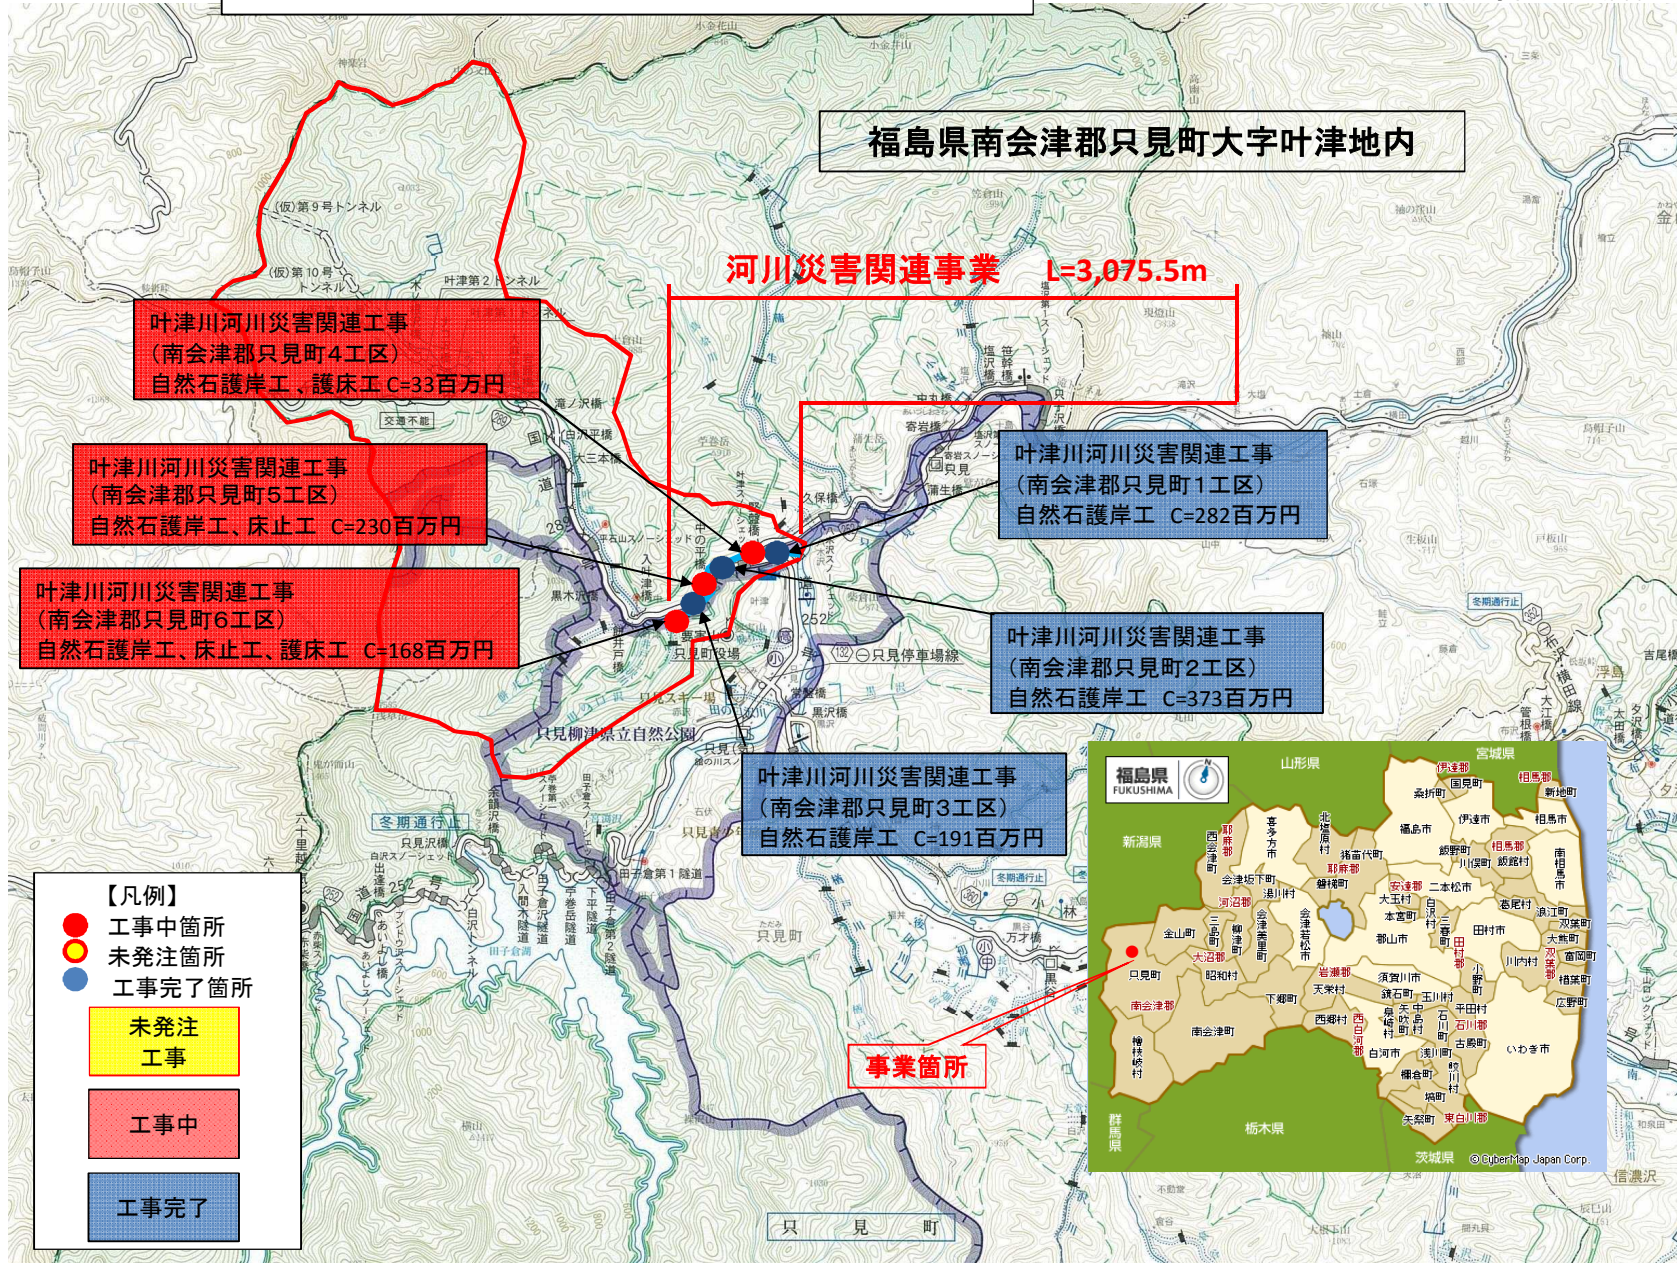

黒谷川災害復旧助成事業箇所図

S=1:100,000

平成26年6月末現在
福島県河川整備課

施工予定期間:平成23年度~平成26年度

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町1工区)
掘削・自然石護岸工 C=301百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町2工区)
掘削・自然石護岸工 C=314百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町3工区)
掘削・自然石護岸工 C=290百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町8工区)
床止工 C=254百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町10工区)
床止工 C=254百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町3-1工区)
自然石護岸工・床止工・取水堰 C=322百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町4工区)
掘削・自然石護岸工 C=297百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町9工区)
床止工 C=175百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町5工区)
掘削・自然石護岸工 C=374百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町7工区)
床止工・取水堰 C=272百万円

黒谷川河川災害復旧助成工事
(南会津郡只見町6工区)
自然石護岸工 C=258百万円

【凡例】

- 工事中箇所
- 未発注箇所
- 工事完了箇所

未発注
工事

工事中

工事完了

河川災害復旧助成事業
事業区間の概工事予定期間
1=6,939m

福島県南会津郡只見町大字黒谷地内



事業箇所
