




八十里越道路工事レポート(1号)



発行年月日：平成28年5月
発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所
連絡先：0256-31-1028 (三条国道出張所)

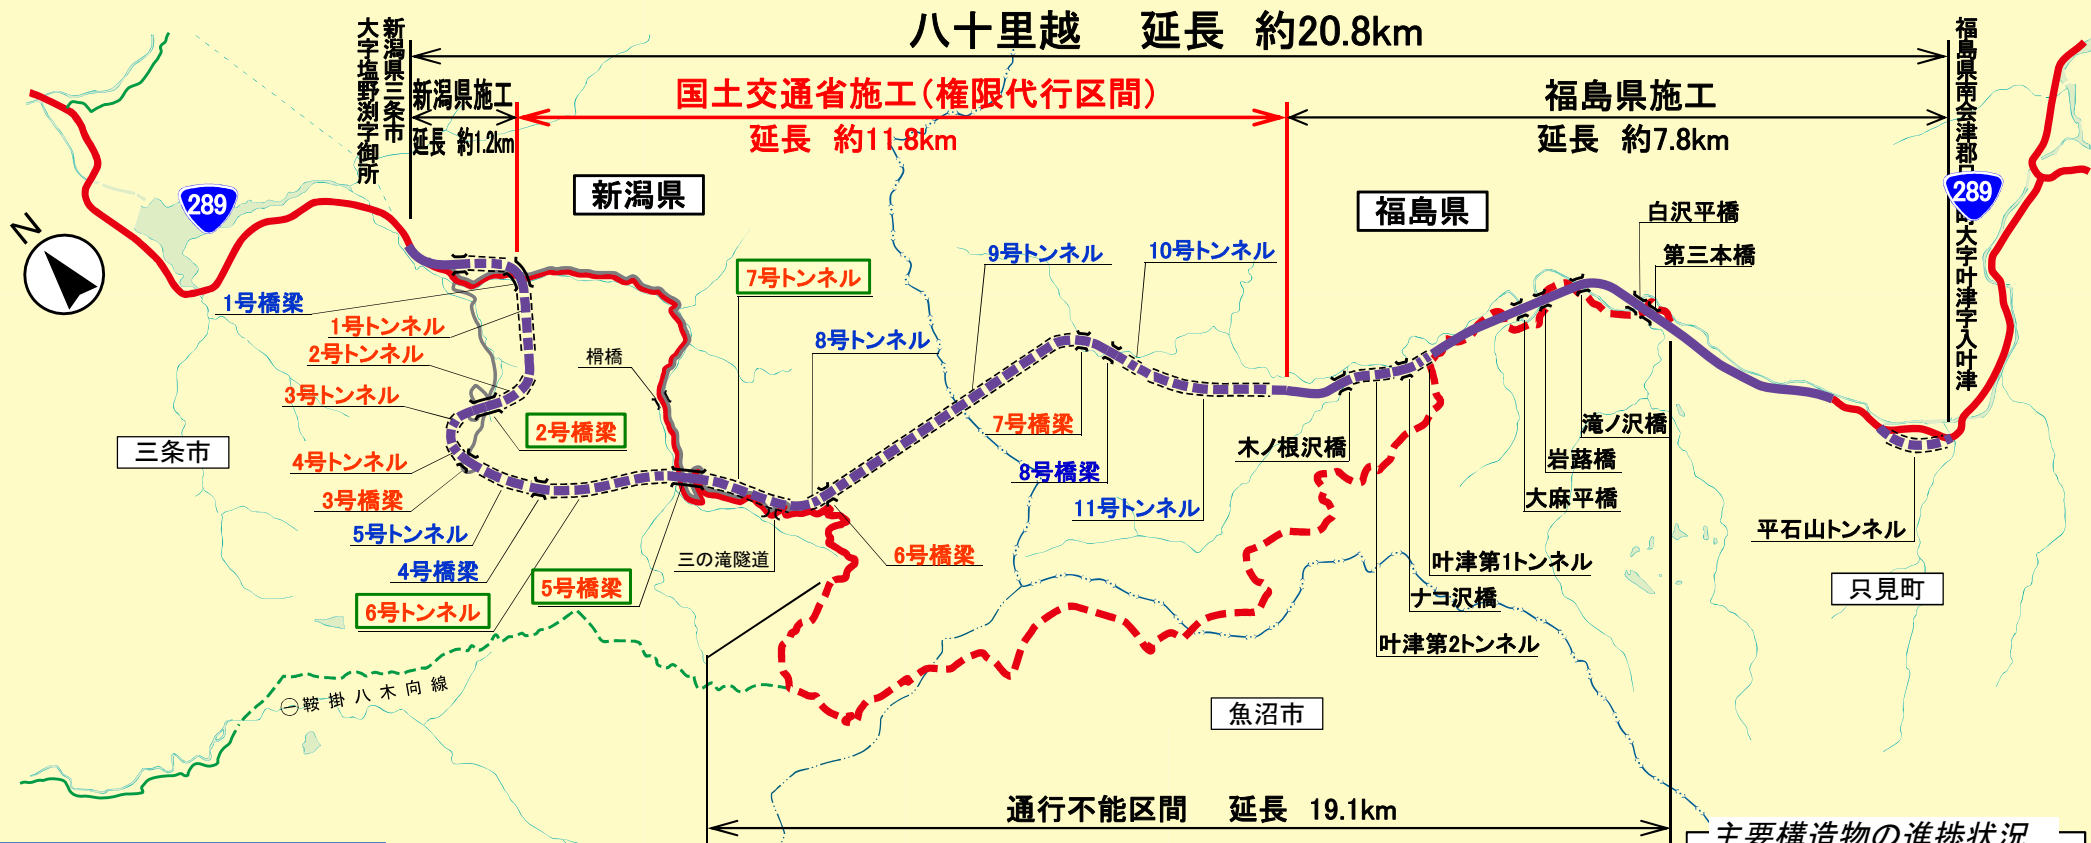

平成28年度の予定

- ★2号橋梁
 - 下部工を施工します。
 - 三條市街側のA1橋台を除き、A2橋台・P1橋脚・P2橋脚が平成27年度までに完成しています。
 - 平成28年度は、引き続きA1橋台を施工します。
- ★5号橋梁
 - 下部工を施工します。
 - P2橋脚の基礎が平成27年度までに完成しています。
 - 平成28年度は、P2橋脚の施工を継続するとともに、A2橋台、及びP1・P3橋脚の基礎部分を施工します。

- ★6号トンネル
 - 掘削工の完成に向け工事を進めます。
 - 平成27年度に三條市街側坑口から450mの掘削が完成しました。
 - 平成28年度は、残る745m区間の掘削を施工します。
- ★7号トンネル
 - 覆工及び坑口等の完成に向け工事を進めます。
 - 平成27年度までに掘削は全区間で完成しています。
 - また、覆工も福島県側坑口から744mが完成しています。
 - 平成28年度は、残る205m区間の覆工を施工します。

主要構造物の進捗状況

表示名(青): 概成


表示名(赤): 未完成

凡 例	
	事業区間
	国 道
	一般県道
	工事中道路

※構造物の名称は仮称です。

☆2号橋梁(L=190m)

橋梁下部工

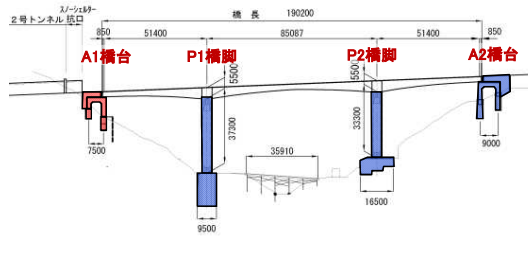


■ : H28年度工事
■ : 完成

- 三条市街側のA1橋台を除き、A2橋台・P1橋脚・P2橋脚が平成27年度までに完成しています。
- 平成28年度は、引き続きA1橋台を施工します。
- これにより、下部工工事は完成となる予定です。

☆6号トンネル(L=1,195m)

トンネル掘削

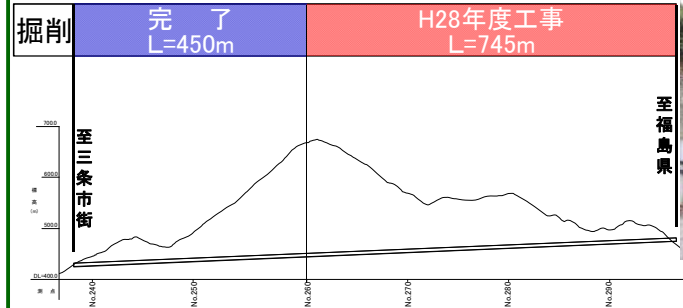


■ : H28年度工事
■ : 完成

- 平成27年度に三条市街側坑口から450mの掘削が完成しました。
- 平成28年度は、福島県側坑口までの残る745m区間の掘削を施工します。
- これにより、全区間の掘削が終了する予定です。

☆5号橋梁(L=337m)

橋梁下部工




■ : H28年度工事
■ : 完成

完成イメージ図

- P2橋脚の基礎のみが完成しています。
- 平成28年度は、P2橋脚の施工を継続し、約40m橋脚を施工します。
- また、福島県側のA2橋台、及びP1・P3橋脚の基礎部分を施行します。

☆7号トンネル(L=949m)

トンネル覆工

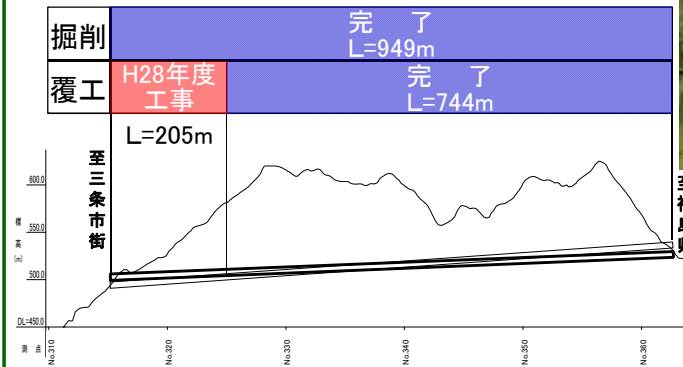

■ : H28年度工事
■ : 完成

- 平成27年度までに掘削は全区間で完成しています。
- また、覆工も福島県側坑口から744mが完成しています。
- 平成28年度は、三条市街側坑口までの205m区間の覆工を施工します。
- これにより、全区間で掘削・覆工が完成する予定です。
