




八十里越道路工事レポート(2号)



発行年月日：平成28年12月
発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所
連絡先：0256-31-1028 (三条国道出張所)

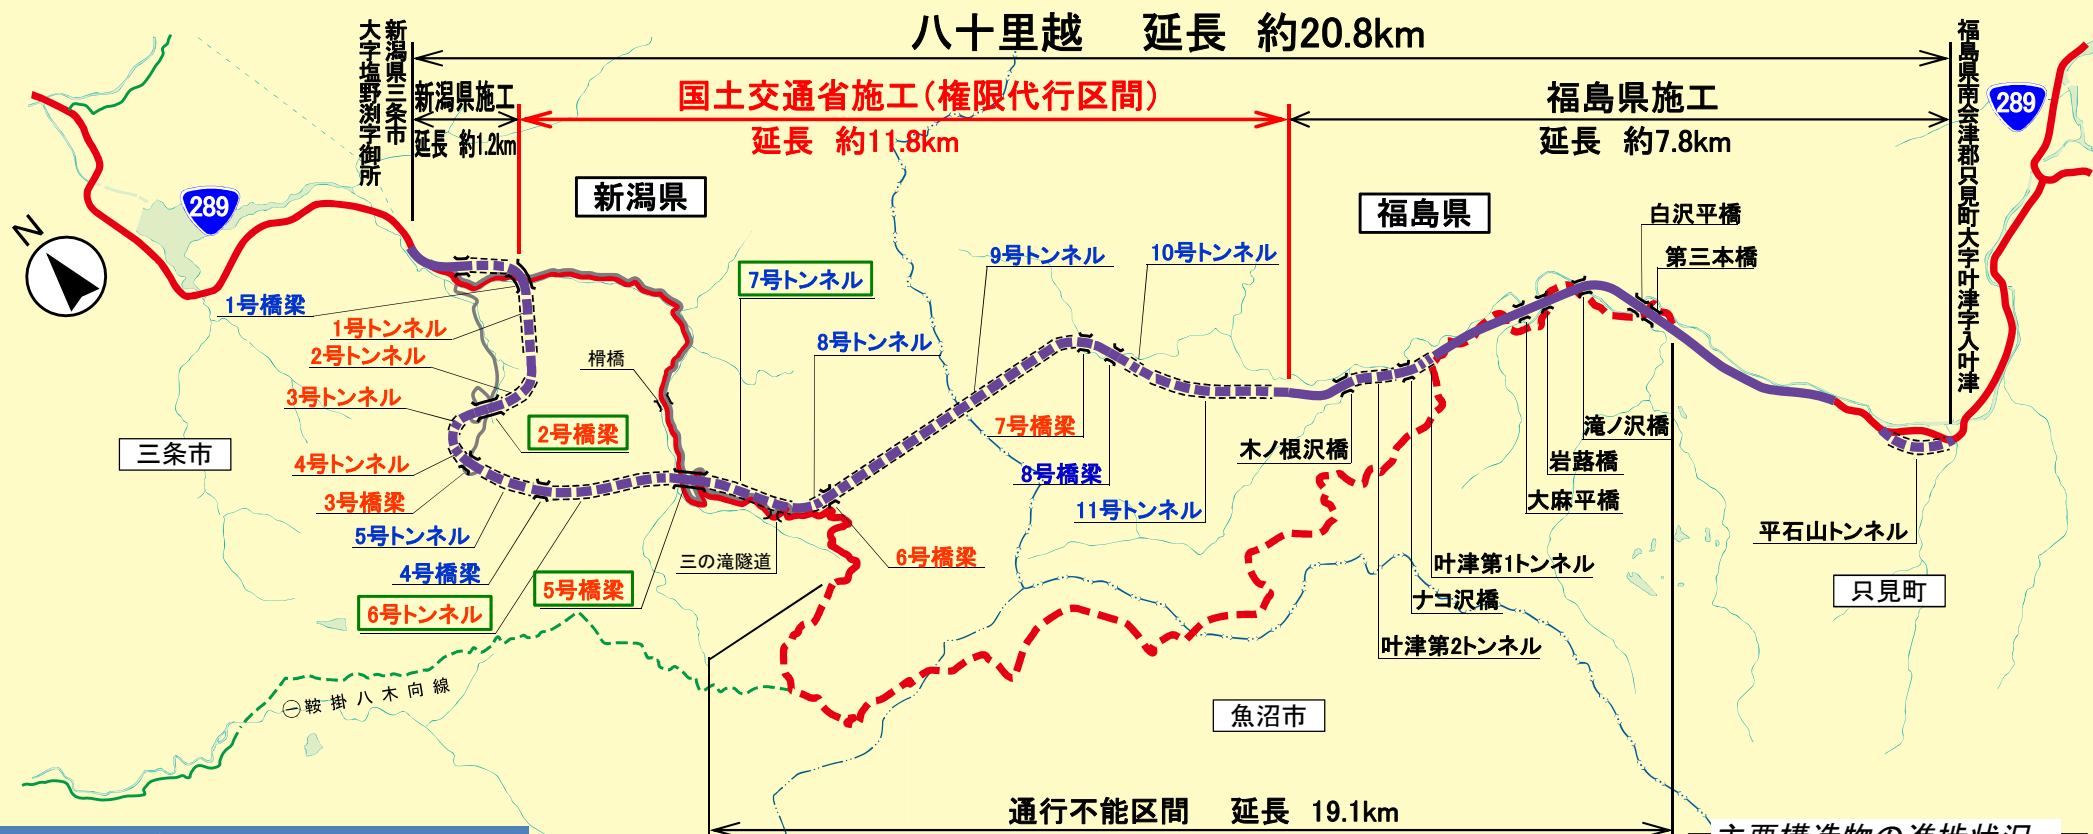

平成28年度の状況

★2号橋梁

- A2橋台・P1橋脚・P2橋脚が平成27年度までに、A1橋台が平成28年度に完成しました。

★5号橋梁

- 下部工を施工しています。
- P2橋脚の基礎が平成27年度までに、P3橋脚の基礎、A2橋台が平成28年度に完成しました。
- P1橋脚の基礎、P1・P2・P3橋脚を、次年度引き続き施工します。

★6号トンネル

- 掘削・覆工の完成に向け工事を進めています。
- 平成28年度は三条市街側坑口から1,027mの掘削と584mの覆工が完了しました。
- 残る168m区間の掘削と611mの覆工を、次年度引き続き施工します。

★7号トンネル

- 平成28年度に4年をかけて掘削・覆工が完成しました。


主要構造物の進捗状況
表示名(青): 概成
表示名(赤): 未完成

凡 例	
	事業区間
	国 道
	一般県道
	工事用道路

※構造物の名称は仮称です。

☆2号橋梁(L=190m)


橋梁下部工

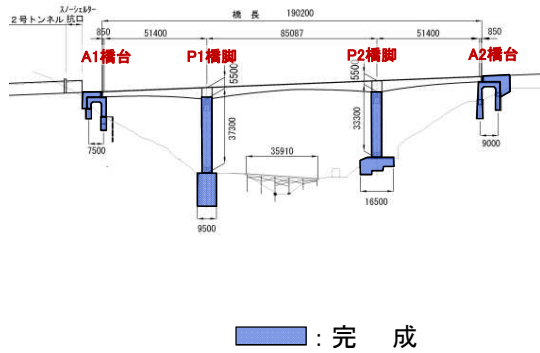

- 平成28年12月に下部工が完成しました。

☆6号トンネル(L=1,195m)

トンネル掘削・覆工

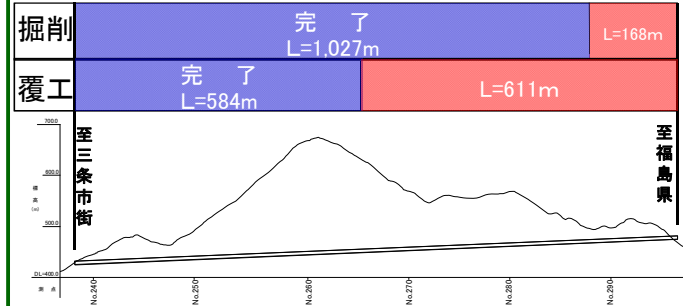


：次年度継続施行
：完成

- 平成28年11月に、三条市街側坑口から1,027mの掘削が完成しました。
- 福島県側坑口までの残る168m区間の掘削及び611mの覆工については、冬期中止再開後の次年度に引き続き施工します。

☆5号橋梁(L=337m)


橋梁下部工

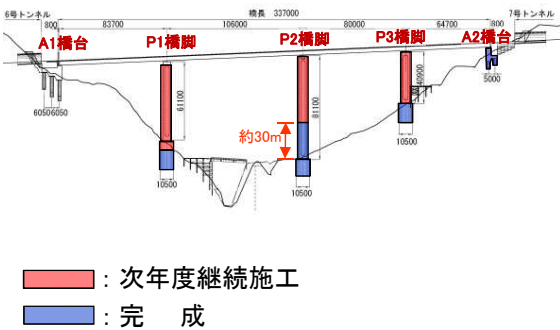

- 平成28年12月に、P3橋脚の基礎及びA2橋台が完成しました。
- P2橋脚は、約30m 橋脚を施行しました。
- P1橋脚の基礎、P1・P2・P3橋脚は冬期中止再開後の次年度に引き続き施工します。

☆7号トンネル(L=949m)

トンネル掘削・覆工

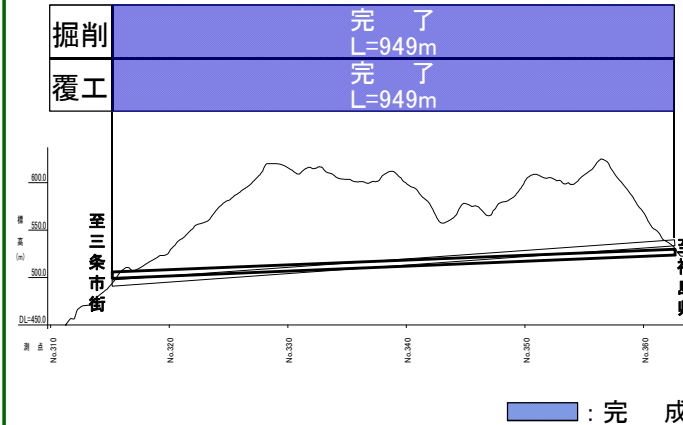

- 平成28年9月に約4年をかけて掘削・覆工が完成しました。
