

神通川堤防一部欠損箇所の復旧状況

7月4日から本州付近に停滞した前線の影響により出水のあった神通川水系神通川では、富山市葛原地先(大沢野大橋上流左岸)において、堤防断面が欠損したため、次の出水に備え、緊急復旧工事を実施しています。

一時水位の上昇により作業中断を余儀なくされましたが、7月11日(水)中の完了を目指し、24時間体制で対応しています。

●施工箇所

神通川水系神通川 富山市葛原地先(大沢野大橋上流左岸22.4km～22.5km)

●着手日時

平成30年7月6日(金) 19時10分

●主な工事内容及び進捗状況(平成30年7月10日12時現在)

	(実績数量)	(予定数量)	
根固めブロック投入	432個／	432個	(投入完了)
袋詰玉石投入	0個／	300個	
堤防復旧盛土	1,920m ³ ／	3,000m ³	【進捗率:65%】

●完了見込


平成30年7月11日(水)

※天候等の状況により、変更になる場合があります。

●その他

緊急復旧工事の進捗状況は、ホームページで公表しています。

<http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

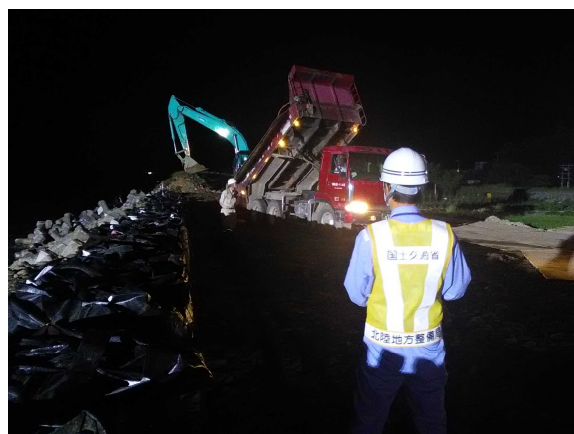

夜間作業状況(平成30年7月9日 21時00分)

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

〒930-8537 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>



■ 副所長(河川) 渡邊 一成 TEL: 076-443-4701 (代表)
■ 工務第一課長 伏木 裕二 TEL: 076-443-4709 (直通)

緊急復旧状況



被災状況（平成30年7月7日 7時00分）



夜間作業状況（平成30年7月10日 00時57分）



復旧状況（平成30年7月10日 7時00分）
