

# だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板


平成28年12月号 (No.9)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所  
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所  
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)

## 1. 補強工事の進捗について

今年4月から実施してきました栈橋工事は、12月初旬に右岸取付部を施工し、全て完了いたしました。また、右岸施工ヤード造成に係わる土砂掘削を11月中旬より行ってきましたが、12月12日に掘削、土砂運搬作業が完了しました。

【仮栈橋工】

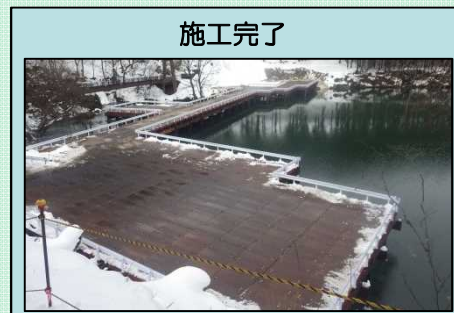

【右岸施工ヤード造成】



## 2. 12月の工事工程

12月の実施工程は以下のとおりです。今年の施工は12月17日に終了し、積雪期（12月下旬～3月末まで）は工事を休止いたします。

工種	12月の工事工程																															備考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
右岸施工ヤード造成工																																	
仮栈橋工 栈橋打設、架設																																	
濁水処理工																																	
仮設備工 撤去・養生																																	

掘削・残土搬出 (12月11日～12月17日)

法面保護工 (12月18日～12月31日)

上部工 (12月1日～12月3日)

クレーン解体 (12月11日～12月13日)

仕上げ (12月14日～12月16日)

濁水沈降促進 (12月1日～12月5日)

汚濁防止膜撤去 (12月6日～12月10日)

事務所撤去 (12月11日～12月13日)

冬期養生 (12月14日～12月31日)

完了 (12月17日)

完了 (12月16日)

3月末まで工事休止予定

### 3. 汚濁防止対策の撤去等

#### ○汚濁防止フェンスの撤去

湖水の濁りを防止するため設置していたシルトフェンスは、栈橋工が完了したことから、12月8日に撤去しました。

撤去状況



撤去完了



#### ○取水堰の濁水対策

谷後地区取水堰の濁水対策として設置していた「やしマット」については、工事の冬期休止に先立ち、部分撤去を行いました。

撤去状況



撤去完了



### 4. 冬期の現場体制について

今年度の工事が完了し、栈橋上の機械、資材は全て撤去しました。また、希望大橋もと、工事用道路、資材ヤードに設置していたバリケード、看板類等は、積雪により破損の恐れがあるため撤去し、来春工事再開時に再設置する予定です。

冬期休止期間中は、栈橋進入路手前及び工事用道路入り口でロープ柵による立入禁止措置を行います。また、現場内で異常がないか現場パトロールを定期的に行うこととしています。

旭原の作業所も冬期間は撤去しておりますが、お問い合わせ等ございましたら下記迄ご連絡をお願いします。

佐藤工業(株) 横川(よこかわ) 025-775-7948

解体中のクローラクレーン



栈橋工事で使用したクローラクレーンの解体を12月9日に行い、栈橋上の資機材を全て撤去いたしました。

冬期間の工事休止に伴い、本回覧板も3月まで休刊とさせていただきます、来春工事再開から、再び発刊させていただきます。

皆様には4月から約9ヶ月間、工事に係る様々なご協力、アドバイスを頂き、ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。来年も変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう宜しくお願い致します。

冠雪した現場と大源太湖



湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所(建設監督官) TEL 025(784)2254  
佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 TEL 025(775)7948
