

只見川・伊南川災害復旧事業箇所図

=1:100,000

平成25年4月末現在
福島県河川整備課

施工予定期間：平成23年度～平成25年度

進捗状況(箇所単位) H25.4.30現在


- ・完成57%(8/14)
- ・H25年度完成予定 100%(14/14)

- 【凡例】
- 工事中箇所
 - 未発注箇所
 - 工事完了箇所

未発注
工事

工事中

工事完了

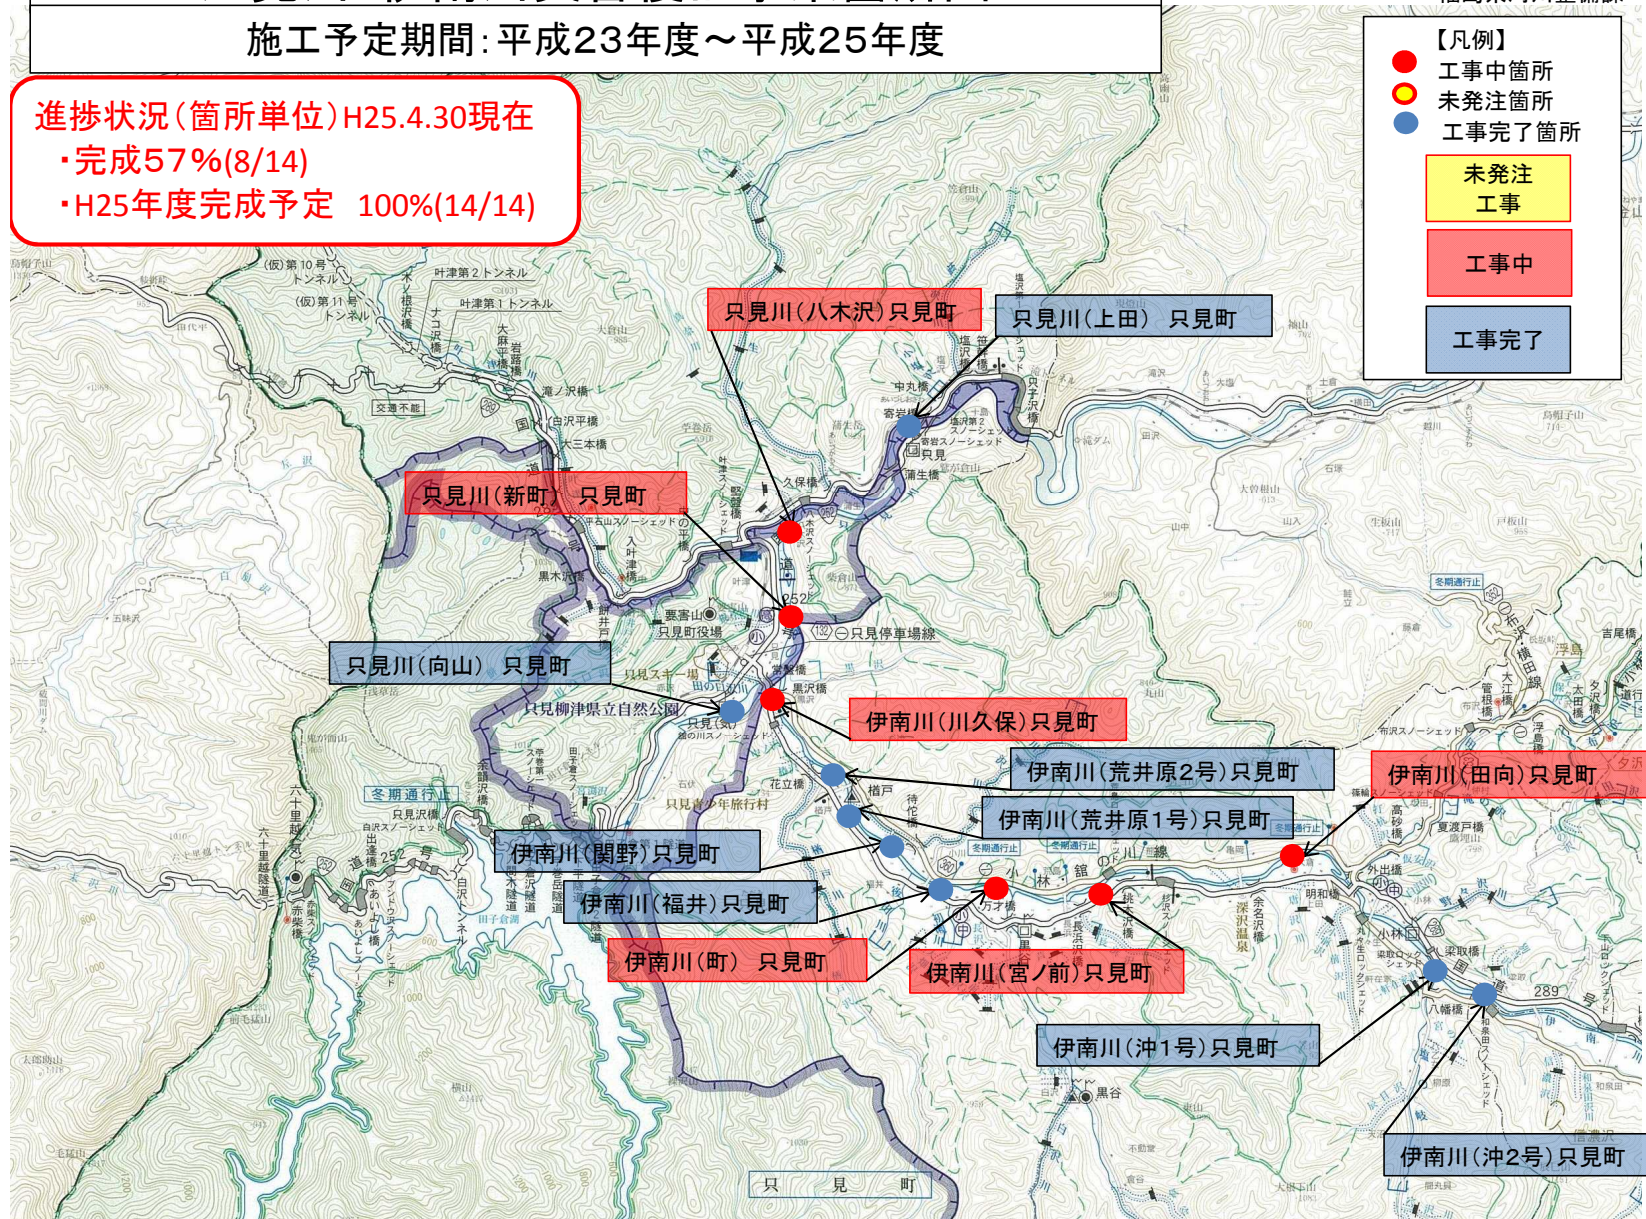


叶津川災害関連事業箇所図

施工予定期間：平成23年度～平成25年度

S=1:100,000

平成25年4月末現在
福島県河川整備課

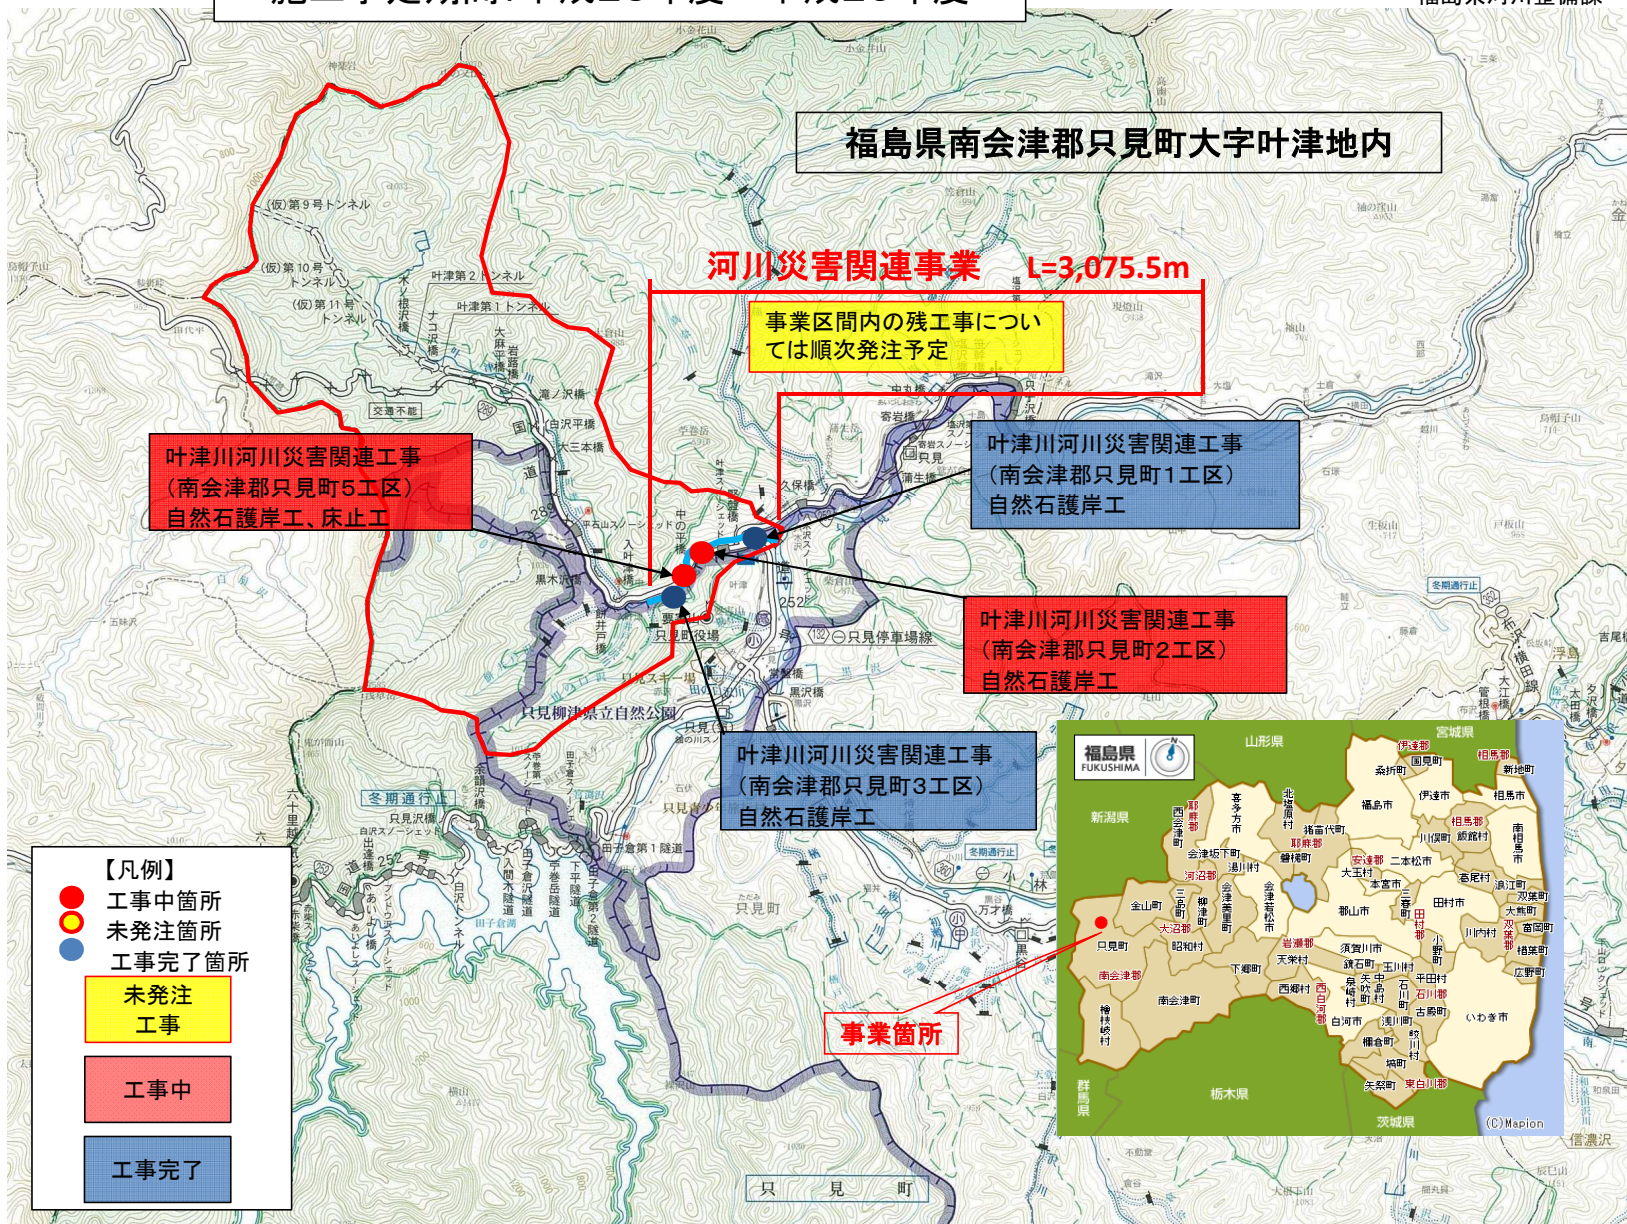

黒谷川災害復旧助成事業箇所図

S=1:100,000

平成25年4月末現在
福島県河川整備課

施工予定期間:平成23年度～平成26年度

