



関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所
第7号 平成30年 5月

「関川砂防通信」第7号をお届けします。

深沢第2号砂防堰堤外工事は、堰堤本体工が5月上旬に完了し、前庭保護工に着手し掘削作業を行っています。

柿ノ木沢溪流保全工その2工事は、流路工を施工しています。また、坂井川取り付け部に着手しています。

3月に契約した日光沢砂防堰堤その2工事と穴沢砂防堰堤その2工事は、5月上旬に現場に着手し、測量作業を行っています。

次号は、平成30年7月下旬に発行する予定です。



番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
1	深沢第2号砂防堰堤外工事	(株)加藤組	H29. 3.11～H30. 7.31	深沢第2号砂防堰堤
2	柿ノ木沢溪流保全工その2工事	(株)富樫組	H29. 9.12～H30. 8.10	柿ノ木沢流路工、床固め工
3	日光沢砂防堰堤その2工事	新発田建設(株)	H30. 3.24～H30.12.20	日光沢砂防堰堤左岸本体工
4	穴沢砂防堰堤その2工事	(株)伊藤組	H30. 3.28～H30.12.20	穴沢2号砂防堰堤 穴沢1号砂防堰堤工事用道路

深沢第2号砂防堰堤外工事：株式会社 加藤組

岩船郡関川村下土沢地先の深沢と支溪に砂防堰堤を2基整備します。
深沢第1号砂防堰堤は、平成27年度、平成28年度の工事で完成しています。
今回、深沢第2号砂防堰堤を施工します。施工は、伐採から始め砂防堰堤を完成します。

深沢第2号砂防堰堤

4月中旬から本堤部のコンクリート打設を開始し、5月上旬に水通し部の堤冠コンクリートを打設して、本堤が完成しました。

現在は、垂直壁、側壁、水叩きからなる前庭保護工の掘削作業をおこなっています。




平成30年5月1日本堤部堤冠コンクリート打設



平成30年5月下旬前庭保護工部の掘削

※参考 砂防堰堤の名称

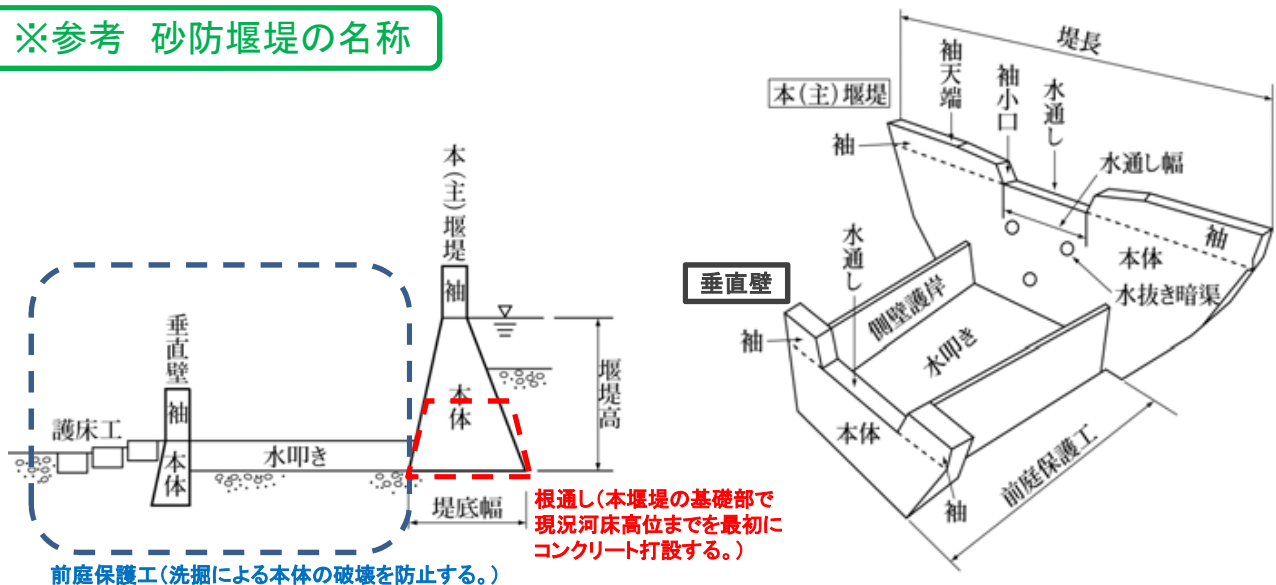

柿ノ木沢溪流保全工その2工事：株式会社 富樫組

新発田市横山地先の柿ノ木沢において、砂防堰堤と溪流保全のため流路工を整備しています。昨年度までに砂防堰堤と流路工を途中まで整備しました。今回の工事では、引き続き流路工と床固めを整備し、坂井川まで取り付けて完成となります。

平成30年4月下旬

1号床固め前後の流路工護岸ブロック、管理用通路の擁壁が大分できあがってきました。坂井川取り付け部は、護床ブロックが完了しました。



平成30年5月下旬

1号床固め前後の流路工は底張りコンクリート打設も始まり、管理用通路の擁壁が大分できあがって道路盛り土が始まりました。

坂井川取り付け部は、護岸ブロックと奥で床固め垂直壁の施工を進めています。



日光沢砂防堰堤その2工事 : 新発田建設株式会社

新発田市下中山地先の日光沢に砂防堰堤を整備しています。
前回の工事では、日光沢砂防堰堤の垂直壁と農道付け替えの橋梁を施工しました。
今回の工事は、日光沢砂防堰堤の左岸側本堤工を施工します。

平成30年5月下旬、測量作業を行っています。
写真は、5月1日撮影の着手前写真
昨年7月に完成した垂直壁とその奥は昨年8月末の大雨で流出した農道が写っています。



穴沢砂防堰堤その2工事 : 株式会社 伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢と支溪に砂防堰堤を3基整備します。
前回の工事は、穴沢第3号砂防堰堤を完成し、穴沢第2号砂防堰堤の本堤工根通しまで施工しました。
今回の工事は、穴沢第2号砂防堰堤を完成し、穴沢第1号砂防堰堤の工事用道路を整備します。

平成30年5月下旬、測量作業を行っています。
穴沢2号砂防堰堤(下段写真)と1号堰堤への工事用道路着手前写真(右写真)



発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>



関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025
