

# 令和6年度の工事進捗をお知らせします

## 栗ノ木道路・紫竹山道路 (栗ノ木橋交差点～紫竹山IC)



国道7号 沼垂・栗ノ木・紫竹山道路  
 かわら版  
 第104号

- 道路の切替えや道路の地面の高さを下げる工事を行いながら、橋脚の整備を進めています。
- 今後も工事内容によっては交通規制を伴います。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。



### ① 立体道路の橋梁整備



<橋脚の整備状況>

分類	橋脚数
令和5年度までに完成	16基
令和6年度	25基
完成	25基
工事中	13基
令和7年度以降	30基
全体数(合計)	84基

※図の範囲外で2基が完成済み

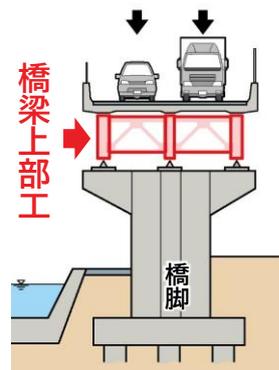


図. 橋梁上部工の位置

- 全84基のうち、令和6年度には25基が完成(累計41基完成)し、13基が現在工事中です。
- 笠越橋交差点付近(上下線)と、笠交差点付近(下り線)の橋梁上部工事を契約しました。今後、工場で橋桁の製作を行っていきます。令和7～8年度に橋桁をかける予定です。

### ② 道路の地面の高さを下げる工事

B 栗ノ木バイパス下り線から見た紫竹山交差点(紫鳥線方向)



- 紫竹山交差点周辺では、令和5年度から全5回に渡って道路の位置を切替えながら地面の高さを約1m下げる工事を行い、立体道路下の横断に必要な高さを確保しました。

編集・発行・お問い合わせ先  
 ■国土交通省 北陸地方整備局  
 新潟国道事務所  
 計画課・用地第一課・工務第一課  
 TEL(025)244-2159(代表)  
 〒950-0912  
 新潟市中央区南口2-1-65  
 ■新潟市土木部 道路計画課  
 TEL(025)226-3041(直通)  
 〒951-8550  
 新潟市中央区学校町通  
 1番町602番地1

「沼垂道路・栗ノ木道路・紫竹山道路相談窓口」開設中！  
 開設時間：毎週木曜日10時～17時  
 (年末年始・祝日は除きます)  
 (管区第一課機)  
 場所：新潟国道事務所1F

過去のくりのき通信、最新の交通状況はこちら！  
 新潟国道事務所ホームページ  
 万代島ルート線専用ページ  
<https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/nov/shichiku-kurinoki/index.html>  
 新潟国道事務所公式X(旧Twitter)  
 みちなびにいがた  
[https://twitter.com/mlit\\_niikoku\\_SS](https://twitter.com/mlit_niikoku_SS)
