


令和7年度の事業予定をお知らせします

沼垂道路 (区間:柳都大橋～栗ノ木橋交差点)

- 令和6年度に設計説明会を実施し、設計内容にご理解をいただき、道路の構造が決まりました。
令和7年度は、道路に必要な土地の範囲を現地に示すための杭(用地幅杭)を設置し、順次、用地測量・物件調査に着手します。
- 関係する皆さまには引き続きご負担をおかけしますが、事業の円滑な実施に向け、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

用地幅杭の設置

道路に必要な土地の範囲を示すための杭です。黄色い杭や鉄を設置します。

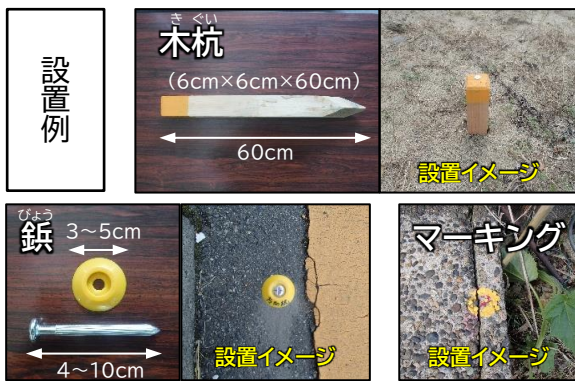

作業期間(予定): 令和7年 7月1日～9月30日

用地測量

隣接する土地との境界を確認し、取得させていただく土地の面積や位置を特定します。主な流れは以下のとおりです。

1. 境界を確認するための資料収集等
2. 境界を確認するための現地立会い
3. 境界点の測量
4. 個々の土地における取得予定面積の確定

物件調査

計画地内に存在する建物や立木などの物件を対象に調査し、移転補償の算定に必要な情報を収集します。



※令和8年度以降も継続します

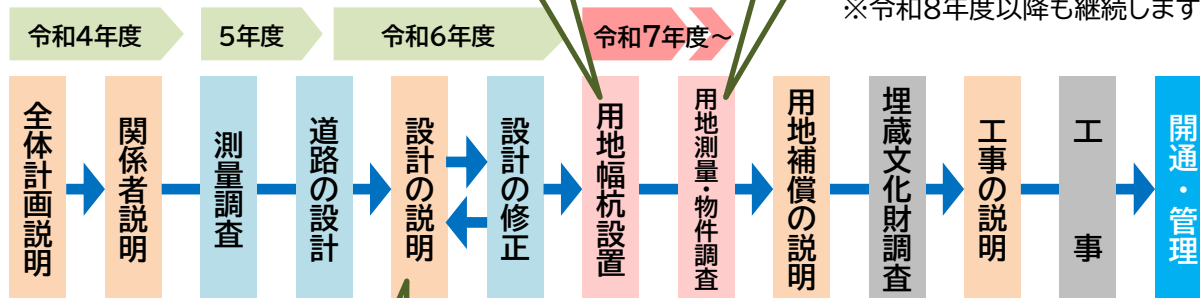


図.一般的な道路事業の流れ

令和6年度に設計説明会を開催しました



沿道の関係自治会(41自治会)を対象に、設計案をお示しする説明会(第1回)を開催し、その後、いただいたご意見等を踏まえた設計の修正に関する説明会(第2回)を開催しました。

- 第1回設計説明会(令和6年9月～12月・計9回開催)
- 第2回設計説明会(令和7年2月～3月・計6回開催)

- 「既存交差点の存続」や「速やかな用地買収」に関するご要望等をいただきました。
- 設計内容に対しては概ねご理解をいただき、道路の構造が確定となりました。

裏面に「栗ノ木道路・紫竹山道路」の内容を掲載しています



くりのき通信 第105号

編集・発行・お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局
新潟国道事務所
計画課・用地第一課・工務第一課
TEL(025)244-2159(代表)
〒950-0912
新潟市中央区南幸口2-1-65

新潟市土木部 道路計画課
TEL(025)226-3041(直通)
〒951-8550
新潟市中央区学校町通
1番町602番地1

「沼垂道路・栗ノ木道路・紫竹山道路 相談窓口」開設中!
開設時間: 毎週木曜日 10時～17時
(年末年始・祝日は除きます)
場所: 新潟国道事務所1F
(管理第一課)

過去のくりのき通信、最新の交通状況はこちら!

新潟国道事務所
ホームページ
万代島ルート線
専用ページ

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/nov/shichiku-kurinoki/index.html>


新潟国道事務所
公式X
(旧Twitter)
みちナビにいがた

https://twitter.com/mlit_niikoku_SS

栗ノ木道路・紫竹山道路（区間：栗ノ木橋交差点～紫竹山IC）

- 国道7号栗ノ木バイパス周辺では、道路の立体化に向けて、令和6年度に橋梁上部工事に着手しており、引き続き橋梁工事と地表道路の改良等を行います。
- 紫竹山IC周辺では、立体道路等に接続するインターチェンジの橋脚整備や道路の切替え、南紫竹IC（出口）整備に向けた準備工事等を行います。

<橋梁上部工事の範囲>



<主な工事の内容と位置>

① 立体道路の橋梁上部工事

令和6年度に工事契約した笹越橋交差点付近と笠交差点付近の橋梁上部工事（延長計414m）に加え、笹越橋～笠交差点間と、紫竹山交差点付近における橋梁上部工事（延長計768m）に着手します。これにより、約43%（1,217m／2,810m）に着手することとなります。

② 立体道路の橋脚工事

工事中の13基に加え、新たに11基の工事をを行います。これにより、完成している41基とあわせ、約77%（65基／84基）に着手することとなります。

③ 道路整備工事

引き続き、道路位置切替えに向けた道路整備を行います。

④ 南紫竹IC（出口）整備に向けた準備工事

引き続き、南紫竹IC（出口）の整備に向けた基盤整備を行います。

⑤ 紫竹山交差点～紫竹山IC間の道路切り替え工事


インターチェンジの橋脚を整備するために、道路位置を切り替えます。

<現地状況>

令和7年3月18日撮影



[位置図] 主な整備区間

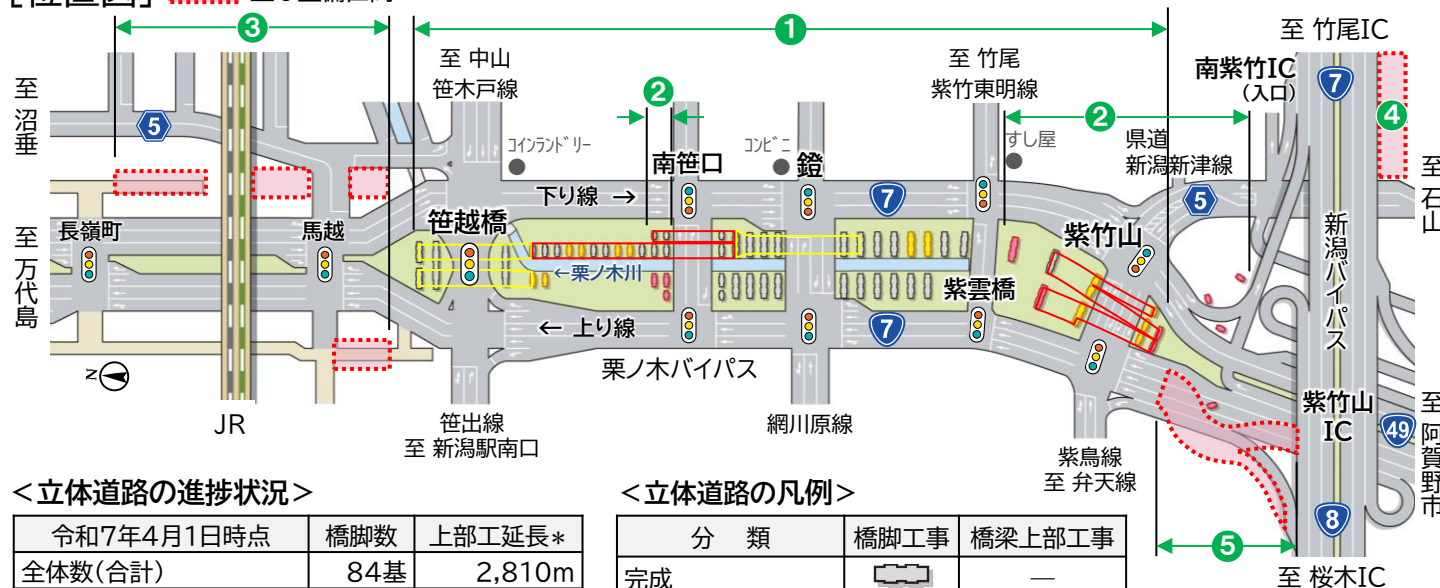

<立体道路の進捗状況>

令和7年4月1日時点	橋脚数	上部工延長*
全体数(合計)	84基	2,810m
令和6年度までに完成	※41基	※35m
令和7年度工事	24基	1,182m
工事中	13基	414m
令和7年度着手	11基	768m
令和8年度以降	19基	1,593m

※図の範囲外の2基1橋を含む

*上り線、下り線、IC橋の延べ延長

<立体道路の凡例>

分類	橋脚工事	橋梁上部工事
完成		—
工事中		
令和7年度工事着手		

工事によっては、交通規制を伴いながらの施工となります。交通規制の期間や内容は詳細が決まり次第、新潟国道事務所ホームページでお知らせします。

