

中越地震復興ニュース

# 棚田通信

たなだ つうしん

復興に向けてがんばっています！

再び山に戻る日を願いながら

ときどき山古志の自宅に行きますが、地震前は、美しく整えられていた田畑だったのですが、今では人の背丈よりも高い草がぼうぼうと生えていて、見る影もありません。あの日から2年近くが経過しましたが、私たちは山古志に戻ろうと思っています。そのためには乗り越えなければならない課題もありますが、みんな力で合わせてやれる限りの準備を進めていきたいと思ひます。山古志の冬は雪が多くて厳しいのですが、それだけに春を迎える喜び、作物や草花を育てる楽しみがあります。その中で、集落の人たちとお酒を酌み交わしながら、心おきなくおしゃべりをする。そんな日が来ることを信じて、みんなががんばっていきたくと思っています。



仮設住宅脇で育てている作物



畔上さんが手塩にかけて育てた朝顔



長岡市陽光台仮設住宅

畔上 多作 さん

国道291号災害復旧宇賀地橋上部工事 株式会社 栗本鐵工所



工事箇所全景 平成18年8月10日


姿が見えてきた「新宇賀地橋」

芋川の河道が閉塞したために水没した旧「新宇賀地橋」の代わりとなる「新宇賀地橋」の工場製作・架設工事を行っています。工場で作成した橋桁を現地に搬入し、P2橋脚～A2橋台間は旧「新宇賀地橋」の上に橋桁を組み上げ、横移動させる架設工法で工事を行いました。残りのA1橋台～P2橋脚間は仮受とトラッククレーンにより架設を行いました。


現在、床版工事が完了し、橋面上の高欄設置作業を進めています。一日も早い完成を目指して無事故、無災害で工事を進めていきます。



P2橋脚～A2橋台間架設状況 平成18年5月19日

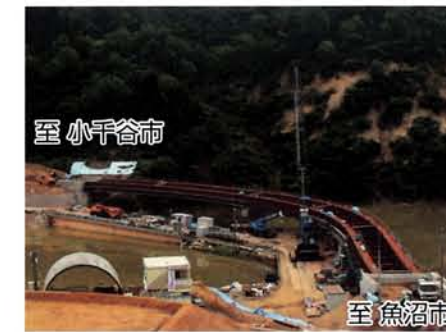

架設完了 平成18年6月21日

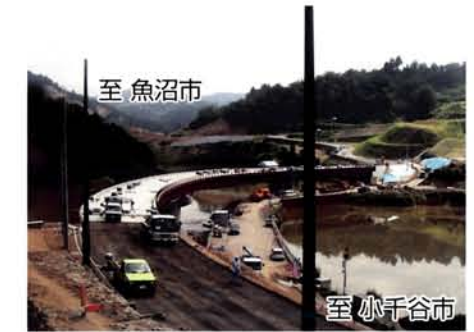

床版打設完了 平成18年8月10日

国道291号災害復旧事業について

一般国道291号（群馬県前橋市～新潟県柏崎市間約240km）のうち、新潟県中越地震により被災の著しい新潟県長岡市古志（旧山古志村）東竹沢～小千谷市小栗山間（約10km）を新潟県知事の要請を受け、直轄権限代行による災害復旧事業を行っています。

地域の一日も早い復興を願い、地域の皆様と一体となって災害復旧事業に取り組んでいます。

国道291号  
災害復旧事業だより  
2006.8.25  
vol. 23

復興へ向けて大きく前進！  
9月3日 国道291号全線開通



平成18年8月21日撮影

9月3日、中越地震の発生から2年を前に国道291号が全線開通します。これを契機に復興へ向け大きく前進することが期待されています。

なお、工事用道路、仮橋等の撤去工事を引き続き行います。いましばらくご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。

国道291号災害復旧事業  
インフォメーションセンター



メッセージをお寄せいただきました

はじめて震災の現場や山古志に行って、被害の大きさに驚きました。この場で感じた様々な思いを忘れないようにしたいです。2～3年後、緑豊かな山古志に戻っていますように。がんばってください。  
(神奈川県 東海大学 学生)

今回テレビや新聞で取り上げられていた現場に行くことが出来た大きなショックを受けました。地すべりがたくさん場所起きていて、地震の威力の大きさを痛感いたしました。

神奈川に戻ってもこのショックな気持ちを忘れず、たくさの人達に伝えていきたいと思ひます。  
(神奈川県川崎市 大学生)

このインフォメーションセンターは、291号の復旧工事進捗状況や現地のホットな情報を素早く提供する情報発信基地です。

開館時間/9:00～18:00 年中無休(年末年始のぞく)  
電話番号/0258-81-1780

発行：国道291号災害復旧工事関係者連絡会議

国道291号災害復旧事業に関するお問い合わせ

◆国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

〒940-8512 新潟県長岡市中沢4丁目430-1 tel.0258-36-4551 fax.0258-37-5773

URL <http://chokoku.jp/> E-mail [chokoku@hrr.mlit.go.jp](mailto:chokoku@hrr.mlit.go.jp)





## 工事概要



## 全線開通に向けて工事進行中

● 国土交通省発注工事の内容 (完了した工事は除く)

工事名	施工業者	工事期間	工事概要
① 国道291号災害復旧その1工事	戸田建設株	H17.5.18~H18.8.31	小松倉の大規模崩壊斜面の掘削を行っています。
② 国道291号災害復旧宇賀地橋下部及び道路工事	太平工業株	H17.3.31~H18.9.11	新しく作る宇賀地橋の取り付け部分の工事を行っています。
③ 国道291号災害復旧宇賀地橋上部工事	株栗本鐵工所	H17.3.26~H18.9.29	新しく作る宇賀地橋の床版工事を行っています。
④ 国道291号災害復旧その5工事	日特建設株	H17.5.25~H18.8.31	崩落箇所等の地すべり抑止工事を行っています。
⑤ 国道291号災害復旧その7工事	日特建設株	H17.10.19~H18.9.15	崩落箇所等の地すべり抑止工事を行っています。
⑥ 国道291号山古志トンネルその1工事	株大林組	H17.3.31~H18.11.30	魚沼市側からトンネルの工事を行っています。
⑦ 国道291号山古志トンネルその2工事	株熊谷組	H17.3.31~H18.12.8	小千谷市側からトンネルの工事を行っています。
⑧ 国道291号災害復旧その8工事	株大石組	H17.3.19~H18.8.31	竹沢隧道上部および側面の盛土等を行っています。
⑨ 国道291号災害復旧その9工事	若築建設株	H17.3.23~H18.7.28	構造物の補修や改築工事を完了しました。
⑩ 国道291号災害復旧舗装その1工事	本間道路・東洋ランドテクノJV	H17.6.25~H18.8.31	道路舗装工事と道路排水工事、防護柵工事を行っています。
⑪ 国道291号災害復旧トンネル照明設備工事	水澤電気株	H17.12.10~H18.8.31	トンネルの照明設備を設置します。
⑫ 国道291号災害復旧トンネル非常警報設備工事	東芝ライテック株	H17.12.8~H18.8.31	トンネルの非常警報設備を設置します。

### 4.5 国道291号災害復旧その5・7工事 日特建設株式会社



平成18年8月9日撮影

東竹沢地区の梶金集落内を含む区間で道路復旧工事を行っています。8月7日に国道291号の本線部分の道路工事が終わりました。

今後は、雪害防止柵の設置と工事用道路の撤去を行い、工事完了となります。

### 7 国道291号山古志トンネルその2工事 株式会社 熊谷組



平成18年8月10日撮影

山古志トンネルの坑内の舗装と作業坑の閉塞が完了し、本線部分の工事としては橋梁及び前後の道路舗装と区画線を残すだけとなりました。

開通まであと1歩ですので、無事開通式が迎えられるよう最後まで安全な施工に努めます。

### 9 国道291号災害復旧その9工事 若築建設株式会社



平成18年8月10日撮影

平成17年4月の着工から、1年と4ヶ月が経ち、7月28日をもって工事完了となりました。押え盛土の法面や、流路工の護岸に草が生え繁るようになり、少しずつ山古志の自然に同化されていくのを感じています。

### 10 国道291号災害復旧舗装その1工事 本間道路・東洋ランドテクノJV



平成18年8月9日撮影

4月中旬より工事を再開し、車道舗装、歩道舗装、排水、防護柵等を完了しました。

現在、残りの標識工事を施工しています。これまで、片側交互通行、夜間通行止等でご協力を頂きありがとうございました。
