

1. 補強工事の進捗について

【仮締切工】

右岸側の鋼管杭（今年度施工32本）のうち、お盆前までに下流側（15本）の施工を完了しました。8月20日より上流側（17本）へ機械を移設し、8月31日現在、9本の施工を完了し、現在も打設を継続しています。



仮締切鋼管杭施工(右岸上流側)



鋼管杭建込状況

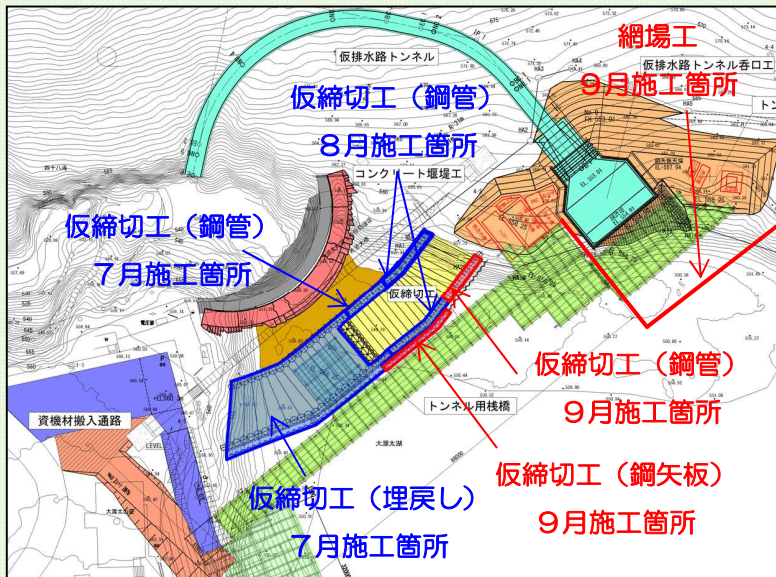
2. 工事工程

【仮締切工】

9月中旬を目標に、右岸上流側の鋼管杭（17本）の施工を終え、機械を搬出します。引き続き、鋼管杭上流に止水鋼矢板（70枚）を施工する機械を搬入し、鋼矢板圧入を行います。鋼矢板圧入は10月下旬まで施工する予定です。

【網場工】

仮排水路トンネル内へ流木が流入し、閉塞（詰まる）ことを防止する目的で設置した網場を、大きな流木にも対応できるようにします。

[illegible]

3. 堰堤下流濁水対策について

既設堰堤の水抜き孔などから濁水の漏水がみられたため、8月9日より既設堰堤下流部に大型土のうで仮の土堤を築き、仮締切上流の汚濁防止膜内へポンプ圧送する対策を行っています。



堰堤下流濁水対策



圧送ポンプの設置状況

圧送ポンプは仮の土堤上流に水が溜まっている期間は常時運転しており、下流域への影響を抑えています。

4. イベントのご案内

越後湯沢秋桜ハーフマラソン

今年も9月30日(日)に『越後湯沢秋桜ハーフマラソン』が開催されます。全国から約3000名のランナーがエントリーしています。今年も箱根駅伝常連校の上武大学駅伝部、国土舘大学駅伝部の皆さんが参加予定です。素晴らしい走りを期待します。

大源太湖畔はハーフマラソンの約7km地点となり、標高がピーク的位置になります。ランナーの皆さまには沿道の秋桜と大源太の景色を堪能して走って頂けたらと思います。

例年に引き続き、私たちも地元の皆様と現場付近で応援させていただきます。



2018 第17回 越後湯沢



昨年度の大源太応援ブース



湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧ください。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所(建設専門官)

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948
