

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

平成31年1月号 (No.28)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 Tel 025-775-7948)

新年明けましておめでとうございます

昨年中は、大源太川第1号砂防堰堤補強工事に、一方ならぬご助力を賜り、厚く御礼申し上げます。

堰堤補強工事も工事開始から約4年が経過しました。まだ、仮設段階ではありますが、工事の進捗につきましては、地域の皆様方のご支援・ご協力があることと、改めて厚く感謝いたします。

本年の皆様方のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げますとともに、引き続き大源太川第1号砂防堰堤補強工事にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(工事関係者一同)




新しい年を迎えた大源太山と大源太湖(2019年1月)

1. 工事工程について

【仮締切工】

12月末までに右岸側仮締切内の湖底堆積層の掘削、土砂への置換え作業を行いました。次の工程として、タイロッドで上下流の鋼管を繋ぐ作業を予定していましたが、年末の降雪により積雪が2m近くあり、大源太湖の湖面も氷が張り積雪しているため、施工ができない状態となっております。

従いまして、1~2月の工事は作業中止とし、今後の天候にもよりますが、3月頃から再開したいと考えております。

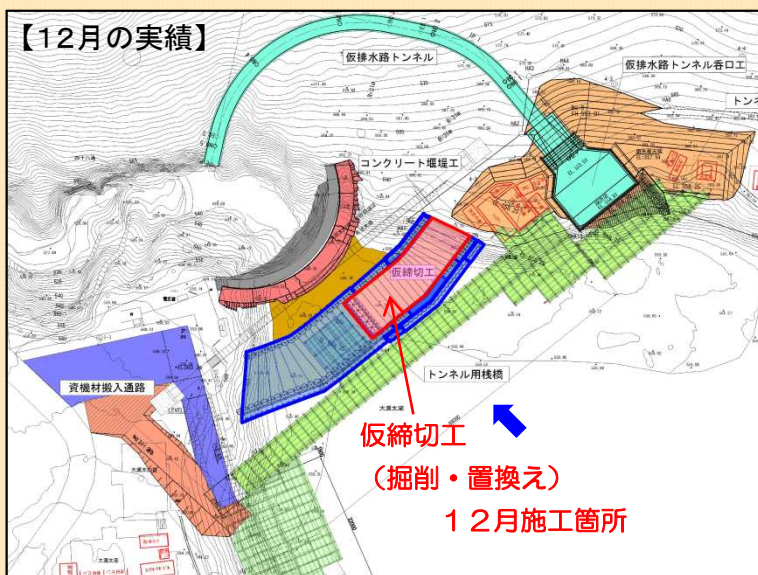

仮締切工(右岸側)



仮締切工(左岸側)

2. 2018年、補強工事の進捗について

2018年は、仮排水トンネルを完成させ、湖水の転流を行いました。なお、既設堰堤上流側に湖水の侵入を防ぐための仮締切工は、左岸側が完了し、右岸側は施工中です。



仮排水トンネル完成（呑口）



仮締切工（全景）



仮排水トンネル完成（吐口）



仮締切工（右岸側）施工中

3. 2018年、実施した行事について

トンネル通水前に湯沢学園及び地域の皆様の現場見学、インフラモニターツアーなど行いました。また、秋には地域の皆様の協力のもと、コスモスマラソンにてバナナを提供しました。



湯沢学園及び地元現場見学会



インフラモニターツアー



コスモスマラソン

4. 冬期の現場体制について

昨年12月末に工事現場の機械、資材を撤去しました。

また、現場周辺の安全柵、看板類等も積雪による破損防止のため撤去しており、工事再開時に再設置する予定です。

冬期休止期間中は、旭原の作業所を閉鎖し、栈橋進入路手前及び工事用道路出入口にてロープ柵等で立入禁止措置を行っています。また、現場内で異常がないか現場パトロールを定期的に行うこととしています。

冬期休止中は、この回覧板もお休みをいただきます。

お問い合わせ等がございましたら、下記までご連絡をお願い致します。

佐藤工業(株) 横川（よこかわ） 025-775-7948

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。

アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。



工事現場の状況（2019年1月）

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948
