

1. 補強工事の進捗について

【仮締切工】

3月後半から仮締切内に土砂を入れる中詰土の施工を行い、4月上旬に仮締切工が完成しました。

【水替工】

仮締切工完成后、既設堰堤と仮締切工の間にポンプを設置し排水を行う「水替工」を行いました。

排水により今まで水の中だった
既設堰堤の上流面が姿を現しまし
た。

閉じ込められた魚類を救出し、大源太湖へ放流しています。

【遊歩道他周辺設備】

大源太湖遊歩道の手摺復旧を4月中旬に終え、4月23日より北側（右岸側）の通行が可能となっています。また、旭原公園のフェンスも復旧しました。



仮締切工 完成



仮締切工 完成（全景）



水替工の状況



救出した魚類の放流

2. 工事工程

5月の実施工程は以下のとおりです。


【水替工】

既設堰堤と仮締切工の間にポンプを設置し、排水する「水替工」を継続するとともに、軟弱土である湖底堆積層の処理を行い、工事が行える環境を整備します。

【既設堰堤補強工】

既設堰堤補強工は、堤体内部の空洞に充填材（セメントミルク等）を充填するもので、堰堤の補強と漏水対策を行うものです。

今月は、充填材や施工手順の確認を行う「試験グラウチング」の施工を予定しています。

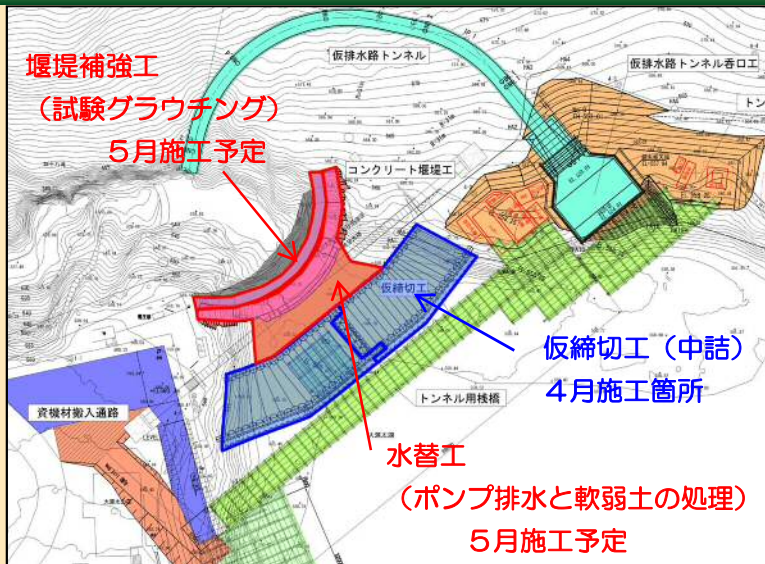[illegible]

3. 北側（右岸側）遊歩道の通行が可能になりました

冬期間閉鎖していました遊歩道のうち、希望大橋を渡った北側(右岸側)が、4月23日より通行が可能になりました。これにより、希望大橋から上流のキャンプ場まで散策可能となっています。左岸部は歩道内に積雪があるため、まだ通行できません。

新緑の大源太キャニオンに癒しを求めて、訪ねられてはいかがでしょうか。



インフォメーションコーナー

希望大橋左岸端部付近には、工事現場が一望できるインフォメーションコーナーも設けています。是非、お立ち寄り下さい。



復旧が完了した遊歩道

4. 現場周辺の安全確保について


皆さんの安全確保のため、工事現場周辺に防護柵などの安全設備を設置し、立入の制限をさせて頂きます。ご不便をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【資材置場、工事用道路】


県道・農道・町道に面した工事用道路や資材置場には、バリケードを、資材置場や掘削土仮置場周辺には柵を設置し、立入の制限を設けております。

また、旭原の公園と工事用道路の境には、フェンスを設置しております。

【周遊路(迂回路)】

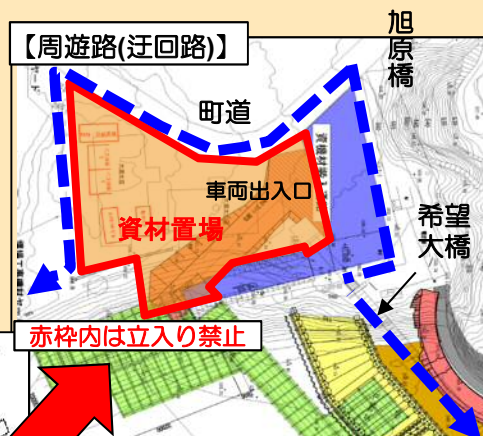

【資材置場、工事用道路】

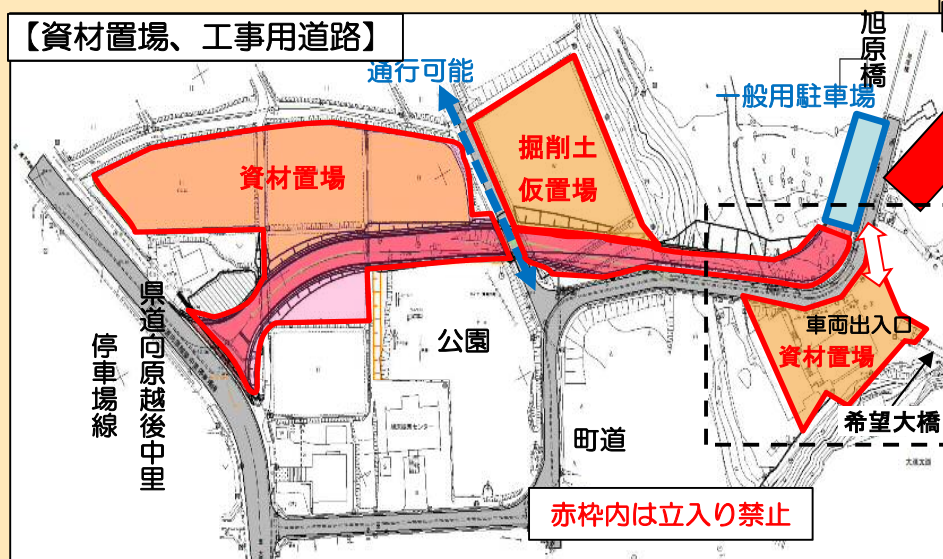

【周遊路(迂回路)】

大源太湖の周遊路(迂回路)は、青破線の位置で確保しております。資材置場(赤枠内)との境界は、バリケードやロープ柵などで立入の制限を設け、工事期間中の日中には誘導員を配置します。なお、休工時には車両出入口付近の一部を解放できることもあります。

5. 希望大橋通行規制のお願い

希望大橋は工事箇所の真上を通過しています。工事の状況により安全の確保の面から一時的に通行を制限する場合があります。誘導員を配置しますので、指示に従い退避などご協力願います。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧ください。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948
