

1. 補強工事の進捗について

【既設堰堤補強工】

既設堰堤補強工として、5月から堤体内部の空洞に充填材（セメントミルク等）を充填しています。8月8日現在、堰堤下流側（B列）の施工（グラウト工）については、完了しました。

お盆明けからは、堰堤上流側（A列）の施工を行い、9月末の完了を目指しています。



ボーリングマシン4台による施工状況



既設堰堤の削孔状況



充填材の注入状況

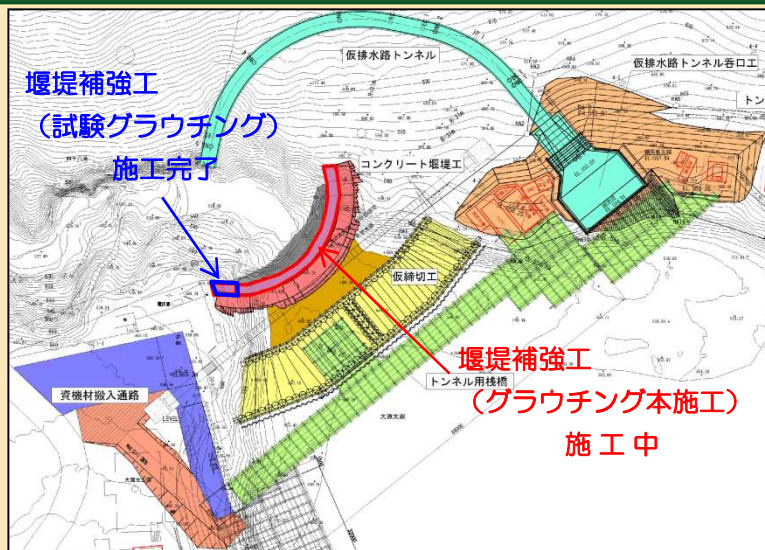
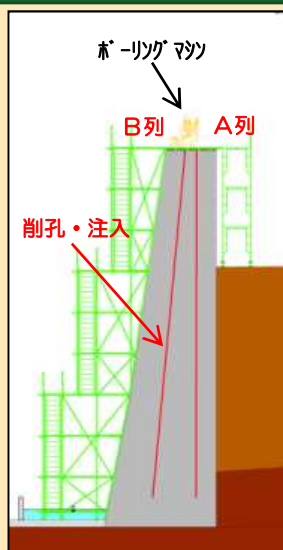
2. 工事工程

8月の実施工程は以下の通りです。

【既設堰堤補強工】

本施工（グラウチング）を進めます。堰堤下流側（B列）は完了。引き続き上流側（A列）の施工に入ります。

8月12日～18日まで、お盆休みを予定していますが、適宜現場巡視を行い、維持・管理に努めます。

[illegible]

3. 濁水処理設備について

濁水処理設備は、工事で発生した濁水を浄化するプラントです。

工事において発生した濁水は、発生場所からポンプで汲み上げ、PH処理や粒子の沈降を行い、きれいな水に処理した後、湖に戻しています。

なお、沈降させた泥分は、脱水・固化した後、処理場へ搬出しています。



脱水して固めた泥



濁水処理設備

4. 鮎釣りが解禁されました。

7月10日（水）に鮎釣りが解禁されました。多くの釣人が、魚野川や大源太川に訪れ、太公望となって釣りを楽しまれています。大物が釣れるといいですね。



魚野川で鮎釣りを楽しむ釣り人



魚野川で鮎釣りを楽しむ釣り人（湯沢街中方向）

5. 夏の観光シーズンがやってきました。

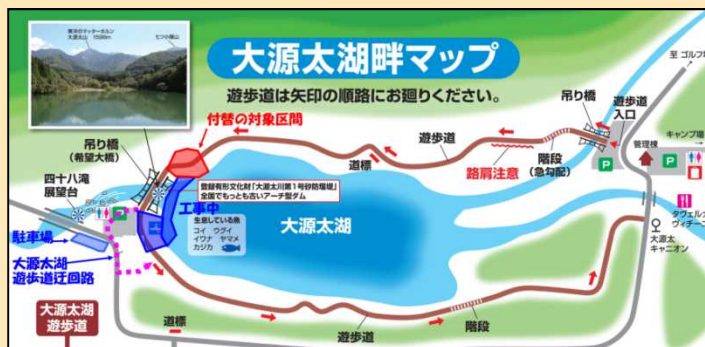
夏休みに入り、キャンプや遠足の子供たちのほか、観光客の方々も多く訪れておられます。また、周辺には大源太湖を周回できる遊歩道やレストラン、体験工房などの施設もあります。皆様も一度足を運ばれ、大自然を満喫されてみては、いかがでしょうか。



遠足で訪れた子供たち



森林の中を通る遊歩道



湯沢砂防事務所ホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧ください。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948
