

だいげんたさぼうかいらんばん

大源太砂防回覧板

令和2年4月号 (No.39)


国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 TEL 025-775-7948)

1. 補強工事の進捗について

【堰堤掘削工】
河床部に残っていた掘削を3月末までに完了しました。現在は、新たな堰堤の基礎となる岩盤を露出させ、コンクリートと密着するよう清掃しています。

【堰堤工の準備】
新たな堰堤の構築のため、給水、排水等の仮設備を設置し、濁水プラントを3月中旬に移働させました。

【遊歩道他周辺設備の復旧】
大源太湖遊歩道の手すり復旧を3月中旬に終え、遊歩道全体の開通を待つだけとなっています。また、旭原公園のフェンスも復旧しました。

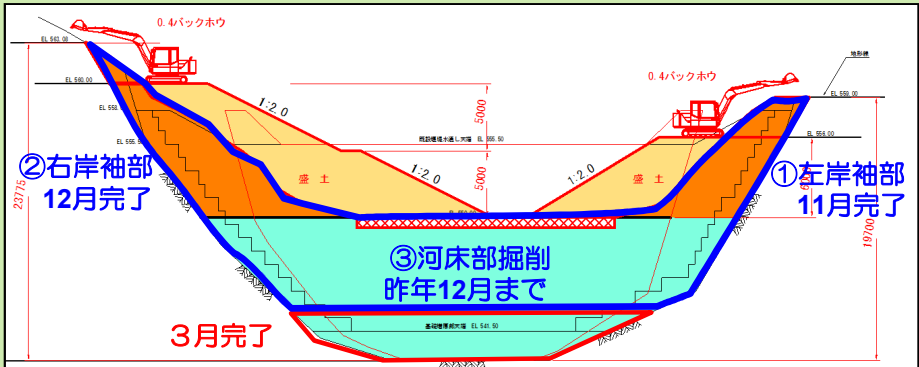

掘削完了 (左岸より)




掘削完了 (右岸より)

2. 今年度の工事について

3月末に工事の継続が決まり、本年度も工事を継続することになりました。

今年度は、STEP5のコンクリート堰堤工に着手します。4月末よりコンクリート打設を開始し、10月末に打設を完了し、埋戻しや片付けを12月まで予定しています。

施工にあたっては、地元の皆様や大源太湖ご利用の皆様にご迷惑がかからないよう進めていきます。本年度もよろしくお願いいたします。

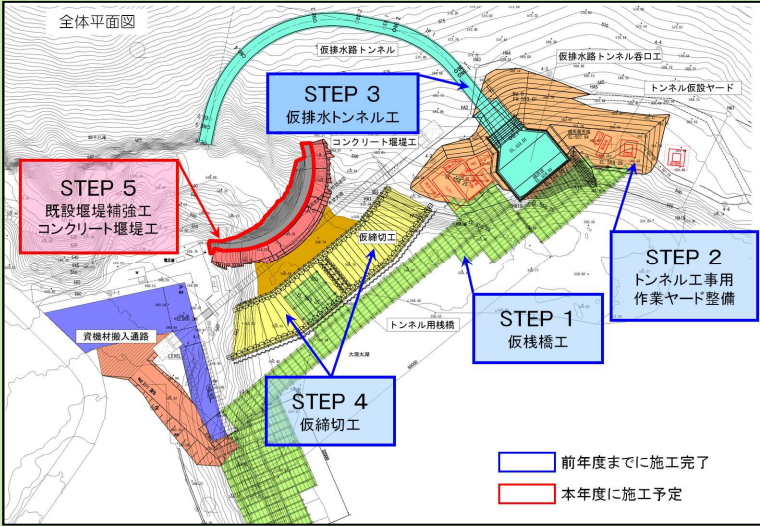

工種	施工年度	令和元年度	令和2年度											備考
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1~3月	
STEP 1 仮橋工	H28			※ 平成28年度に工事は完了しています。										
STEP 2 トンネル工事用 作業ヤード整備	H28~ H29		掘削工完了	※ 平成29年度に工事は完了しています。						コンクリート打設完了		竣工		
STEP 3 仮排水トンネル工	H29~ H30			※ 平成30年度に工事は完了しています。										
STEP 4 仮締切工	H29~ R01			※ 令和元年度に工事は完了しています。										
STEP 5 既設堰堤補強工 コンクリート堰堤工	R01~	既設堰堤補強工・掘削工		清掃	コンクリート堰堤(本体工)							埋戻し・片付け		

3. 4月の工事実施内容について


4月の実施工程は以下のとおりです。

【コンクリート堰堤工】

新しく構築するコンクリート堰堤の基盤について岩盤清掃を行い、4月15日に新堰堤の基礎としてふさわしいものか検査する『岩盤検査』を行います。その後、コンクリートの本体工打設を開始します。

【法面保護工】

掘削した法面の保護のために、将来的に水面より下になる箇所はモルタル吹付を行い、水面より上になる箇所は景観に配慮して植生基材吹付を行います。

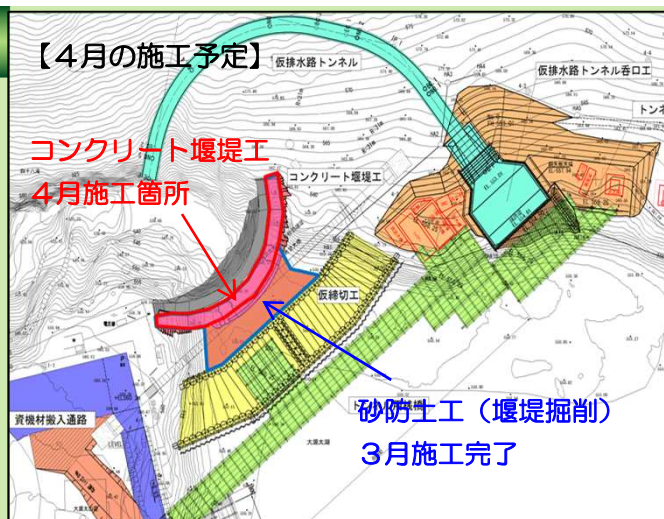



工 種	4 月 の 工 事 工 程																														備 考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
砂防土工 (堰堤掘削)	重機搬出																														
コンクリート 堰堤工			準備			岩盤清掃							岩盤清			止水板設置				止水板、型枠設置							打設足場、 コンクリート打設				
法面工																モルタル吹付				植生基材吹付											

4. 現場周辺の安全確保について

皆さんの安全確保のため、工事現場周辺に防護柵などの安全設備を設置し、立入の制限をさせて頂きます。ご不便をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【資材置場、工事用道路】

県道・農道・町道に面した工事用道路や資材置場にはバリケートを、資材置場や掘削土仮置場周辺には柵を設置し、立入の制限を設けております。また、旭原の公園と工事用道路の境には、フェンスを設置しております。

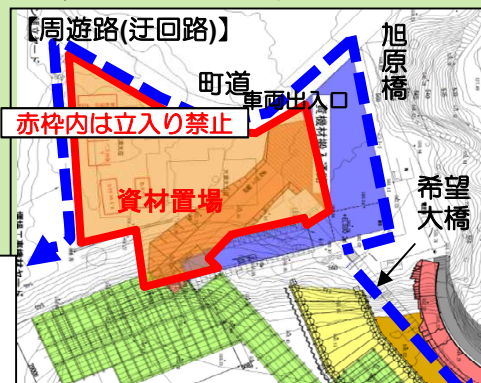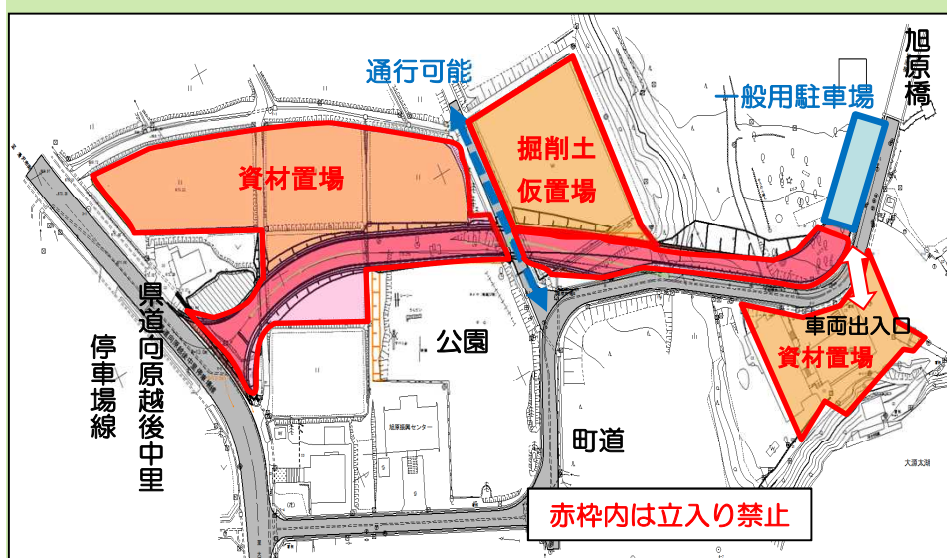

【周遊路（迂回路）】

大源太湖の周遊路（迂回路）は、青破線の位置で確保しております。資材置場（赤枠内）との境界は、バリケードやロープ柵などで立入の制限を設け、工事期間中の日中には誘導員を配置します。なお、休工時には車両出入口付近の一部を解放できることもあります。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948
