


1. 補強工事の進捗について

【コンクリート堰堤工】

10月は1、3BLについて、袖部のコンクリート打設が完了しました。また、J1、J2BLもコンクリート打設を進め、残り1リフト(0.5m)を残すのみとなりました。

さらに、10月後半には、堰堤上流側を埋戻す（9m）ための準備作業を行いました。

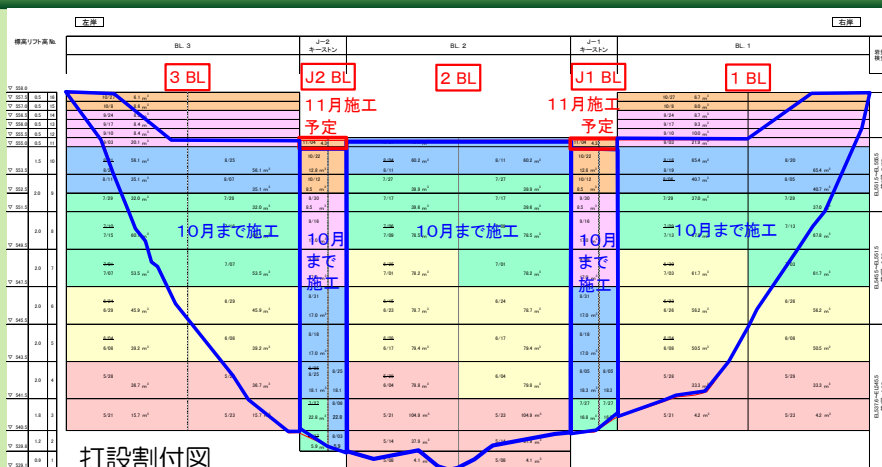

新堰堤上流面(右岸側より)



新堰堤天端(左岸側より)

2. 工事工程

1 1月の実施工程は以下のとおりです。

【コンクリート堰堤工】

中旬にJ1、J2のコンクリートを打設し、堰堤を完成させる予定です。


【埋戻し工】

堰堤と仮締切間の埋戻しを行います。埋戻し土は、掘削時に発生し、残土仮置場にストックしてあるものを利用します。

【片付け工】

後半に使用していた仮設備（汚濁防止フェンス、濁水プラント等）の撤去、片付け作業を行います。

【11月の施工予定】

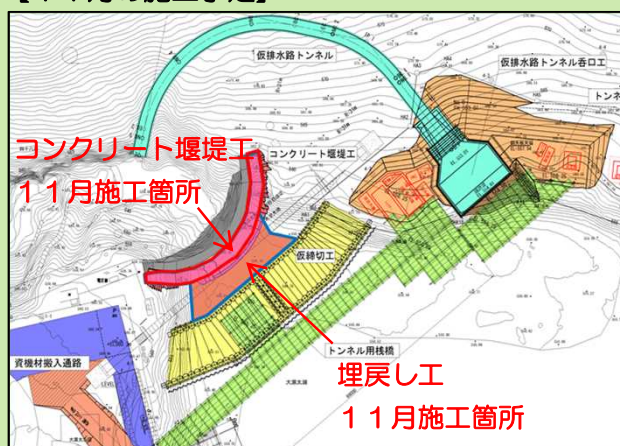

工 種	11 月 の 工 事 工 程																														備 考			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
コンクリート 堰堤工			間詰モルタル													コンクリート打設																		
埋戻し工			埋戻し							埋戻し						埋戻し																		
片付け工									下流締切撤去						場内付属設備撤去									汚濁防止膜、濁水プラント										

3. 河川環境保全活動への参加

10月14日（水）に今までお世話になっている大源太湖に、河川環境保全の取組及び増殖事業の一環として、イワナやヤマメ、鯉等の稚魚を放流しました。当日は、魚沼漁業協同組合の協力を得て、多くの魚の放流が実現しました。元気に育ち、故郷を守ってください。



記念撮影




車両からの放流状況



放流状況



皆川組合長より感謝状授与式



感謝状

本活動に関し、魚沼漁業協同組合より感謝状を頂きました。また、当活動は、大源太砂防堰堤補強工事が完成するまで予定しています。

4. 大源太の紅葉がピークです。

大源太湖周辺では今、紅葉がピークとなり、GoToキャンペーン効果も相乗し、連日多くの観光客で賑わっています。また、11月4日には大源太山も初冠雪を迎え、紅葉とのコントラストが美しく映えています。

観光は、11月中旬までが見頃かと思います。

ぜひ、大源太湖にお越し頂き、晩秋の景色を楽しんで頂ければと思います。



希望大橋も多くの方が通行しています



大源太湖に映る紅葉も美しい

希望大橋周辺では、当工事により通行を制限する場合があります。ご協力の程、宜しくお願い致します。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948
