

日沿道工事進捗状況 神林岩船港IC～村上瀨波温泉IC

作成日：2010年11月

神林高架橋(仮称) [P20～P26]



写真は村上瀨波温泉IC方面を望んでいます。この区間は舗装工(基層工)が完了しました。12月は道路附属物工事を進めます。

神林高架橋(仮称) [P26～A2]




写真は神林岩船港IC方面を望んでいます。この区間は床版が完了しました。コンクリート高欄を施工しています。12月はコンクリート高欄の施工を進めます。

POO：起点側から数えてOO番目の橋脚 (Pier)

AOO：起点側から数えてOO番目の橋台 (Abutment)

村上瀨波温泉IC

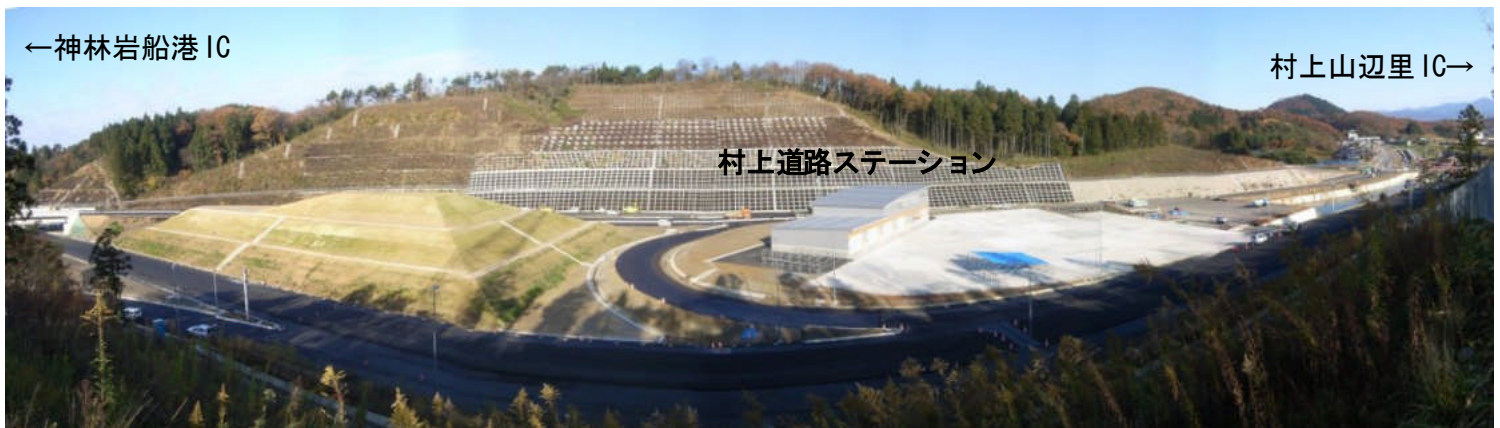

村上瀨波温泉ICの全景写真です。

写真中央に見える村上道路ステーションが11月29日に開所しました。

舗装工事(基層工)と道路附属物工事を進めています。

12月は、舗装工事(表層工)と道路附属物工事を進めます。

神林岩船港IC～村上瀨波温泉ICは、新潟国道事務所が施工しています。

新潟国道事務所ホームページ：<http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html>
