



# 関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局  
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所  
第5号 平成30年1月


「関川砂防通信」第5号をお届けします。

3月に契約した3件の工事うち、女川法面对策工事と穴沢砂防堰堤工事は、完成しました。深沢第2号砂防堰堤外工事は、降雪期の進入路使用ができないため一旦工事を中止し、来春に施工を再開します。

7月に契約した峠ノ沢砂防堰堤工事は、本堰堤のコンクリート打設を完了し、埋め戻し及び施工ヤード盛り土部の仮排水路の施工を行っています。

又、9月に契約した柿ノ木沢溪流保全工その2工事は、1号床固めを施工しています。1号床固めが完了すると流路工に着手します。

次号は、平成30年3月下旬に発行する予定です。

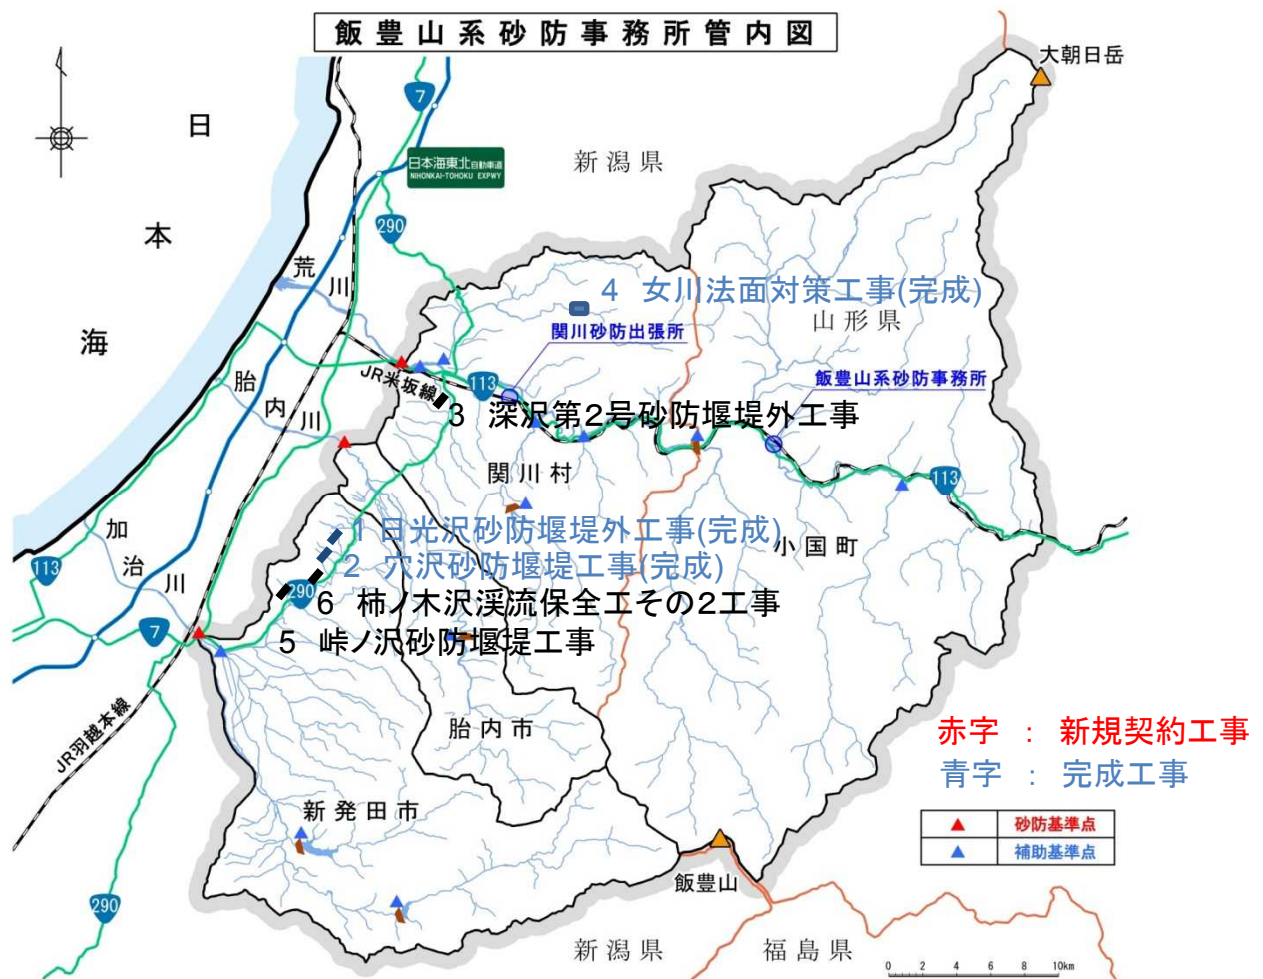

番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
1	日光沢砂防堰堤外工事(完成)	新発田建設(株)	H28. 7.20～H29. 7.31	橋梁上下部工 日光沢砂防堰堤垂直壁
2	穴沢砂防堰堤工事(完成)	(株)伊藤組	H29. 3.10～H30. 1.10	穴沢2号砂防堰堤 穴沢3号砂防堰堤
3	深沢第2号砂防堰堤外工事	(株)加藤組	H29. 3.11～H30. 3.31	深沢第2号砂防堰堤
4	女川法面对策工事(完成)	(株)興和	H29. 3. 4～H29.12. 8	女川法面補修
5	峠ノ沢砂防堰堤工事	(株)伊藤組	H29. 7.15～H30. 2. 9	峠ノ沢砂防堰堤
6	柿ノ木沢溪流保全工その2工事	(株)富樫組	H29. 9.12～H30. 3.29	柿ノ木沢流路工、床固め工

## 穴沢砂防堰堤工事：株式会社 伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢と支溪に砂防堰堤を3基整備します。

今回の工事では、穴沢第3号砂防堰堤の本堤部の根通しから上部分と垂直壁、側壁、水叩きからなる前庭部を施工して完成します。

また、穴沢第2号砂防堰堤に着手します。施工は、伐採から始め本堤部根通しを整備します。

### 穴沢第2号砂防堰堤

平成29年12月下旬 今回工事が完成しました。



## 深沢第2号砂防堰堤外工事：株式会社 加藤組

岩船郡関川村下土沢地先の深沢と支溪に砂防堰堤を2基整備します。

深沢第1号砂防堰堤は、平成27年度、平成28年度の工事で完成しています。

今回、深沢第2号砂防堰堤を施工します。施工は、伐採から始め砂防堰堤を完成します。

### 深沢第2号砂防堰堤

降雪期に入り関川村道に消雪パイプ保護のために敷いていた鉄板を撤去するため、工事を一旦中止しています。降雪の心配が無くなった後、再開します。

写真は、平成29年11月下旬の中止直前の状況です。



## 女川法面対策工事：株式会社 興和

岩船郡関川村の女川本川には4基の砂防堰堤が整備されています。  
この4基の砂防堰堤を点検管理するために、女川林道の法面が崩落した箇所で、法面対策工事を行います。

今回の工事は、完成しました。



## 峠ノ沢砂防堰堤工事：株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。  
今回の工事では、伐採から始め工事用道路と本堤部の根通しまでを施工します。

### 峠ノ沢砂防堰堤

平成29年12月下旬  
砂防堰堤がだいぶ立ち上がってきました。  
コンクリートを打設すると青い屋根をかけて養生します。



平成30年1月下旬  
1月20日にコンクリート打設が完了しました。  
この後、埋め戻しを行います。



## 柿ノ木沢渓流保全工その2工事：株式会社 富樫組

新発田市横山地先の柿ノ木沢において、砂防堰堤と渓流保全のため流路工を整備しています。昨年度までに砂防堰堤と流路工を途中まで整備しました。今回の工事では、引き続き流路工と床固めを整備し、坂井川まで取り付けて完成となります。

平成29年12月下旬

1号床固め部の掘削が完了し、地盤強度の確認をしようとしています。



平成30年1月下旬

1月20日に1号床固め本堤部のコンクリート打設が完了し、この後側壁部のコンクリートを打設して1号床固めは完了となります。



### 発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025

