

～数値等は、速報値のため今後変わることがあります。～

演習

平成22年 5月18日 11時55分

記者発表資料

発表先 石川県政記者クラブ

扱い 配布を持って解禁



平成22年5月18日台風0号出水について(第二報)

河川・手取川ダム・白山砂防・石川海岸 11:55現在の状況

1. 河川

[要旨]

●手取川

手取川の市ノ瀬では、累計雨量 146 mm(11:00 現在)に達し、11:30 現在、手取川ダム及び鶴来地点の流入量と水位は、ダム流入量 1,370m³/、鶴来水位 3.5m (はん濫危険水位 3.0m) です。

今後、11 時時点雨量予測に基づく 3 時間後の予想は、手取川ダム流入量 2,400m³/s 越え、鶴来水位は 4.10m に達し (はん濫危険水位(3.0m)) する見込です。

手取川ダムは、18 日 11 時 00 分から洪水調節を開始しています。

なお、手取川下流の西川合流点付近 (白山市湊地先) で発生した内水被害 (浸水) に対し、当事務所排水ポンプ車が 11 時 00 分より稼働しています。また同時刻、能美市水防団 50 人が左岸 4.2k で木流し工の作業を行なっています。さらに 11 時 40 分能美市長より下清水地区他の 6,924 人、1,848 世帯に避難指示が発令され、住民の方々は避難中です。

●梯川

梯川の尾小屋雨量観測所では、累計雨量 116 mm(11:00 現在)を観測しました。また埴田水位観測所において、9:50 にはん濫注意水位(2.5m)を超え、11 時現在予測では、3 時間後に 5.00 m に達し、はん濫危険水位(3.6m)を大きく超過することが予想されます。

現地では、巡視が強化され小松市水防団 4 班 12 人が出動し巡視を行なっています。

●石川海岸

小松市安宅新地先では、11 時 30 分に直立堤護岸が被災したもよう (詳細を確認中)。

徳光観測所では、11 時 45 分に 10 分間平均風速 22.0 m/s、有義波高 6.7 m を観測していることから、今後、大規模な越波の発生が予想されるため、現在実施中の水防活動団体は十分注意しながら水防活動 (石川海岸水防警報 3 号発令) を実施しています。

なお金沢河川国道事務所では、11:00 警戒体制に入っています。

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
河川・ダム・砂防・海岸 担当副所長 二俣 秀
(TEL:076-264-8800)

～数値等は、速報値のため今後変わることがあります。～

河 川

(1)手取川の状況

- 8：50 水防団待機水位(0.9m)に達する
- 9：00 注意体制を発令
- 9：10 水防警報(準備)発令
- 9：40 はん濫注意水位(1.4m)に達する
警戒体制に移行
河川巡視を4班12人により開始
- 9：50 水防警報(出動)発令
- 9：55 はん濫注意情報発表
防災エキスパート出動要請
- 10：10 白山市：樋管操作(ゲート全閉), 川北町：占用物件の撤去完了
- 10：30 能美市：避難準備情報発令, 下清水地区他の6,924人, 1,848世帯が対象
白山市：西川合流点付近(白山市湊地先)にて内水被害発生, ポンプ車の要請
- 10：50 避難判断水位(2.3m)に達する
ヘリコプターの要請
- 10：55 はん濫警戒情報発表
- 11：00 非常体制に移行する
白山市ポンプ車到着, 排水開始
- 11：10 水防警報(状況)発令
協定業者要請(待機)
- 11：20 白山市水防団3班9名, 能美市水防団2班6名, 川北町水防団1班3名が出動し, 巡視を実施中
(水防団活動報告)能美市水防団50人, 左岸4.2kで木流し工(5基)を実施中
- 11：30 はん濫危険水位(3.0m)に達する
- 11：40 能美市長より下清水地区他の6,924人, 1,848世帯に避難指示を発令, 避難中
- 11：50 白山市水防団3班9名, 能美市水防団2班6名, 川北町水防団1班3名が出動し, 巡視を実施中
(水防団活動報告)能美市水防団50人, 左岸4.2kで木流し工(5基)を完了, 左岸4.2kに堤防の決壊の恐れあり
協定業者要請(準備)
- 11：55 手取川はん濫危険情報発表

～数値等は、速報値のため今後変わることがあります。～

(2) 梯川の状況

- 9：10 水防団待機水位(2.0m)に達する
注意体制を発令
水防警報（準備）発令
- 9：30 樋管操作（ゲート全閉）報告
- 9：50 はん濫注意水位(2.5m)に達する
警戒体制に移行
水防警報（出動）を発表
河川巡視を4班12人により開始
- 9：55 はん濫注意情報発表
防災エキスパート出動要請
- 10：30 避難判断水位(3.0m)に達する
- 10：55 はん濫警戒情報発表
小松市水防団3班9人が出動し、巡視を実施中
- 11：00 非常体制に移行
- 11：40 はん濫危険水位(3.6m)に達する
- 11：55 梯川はん濫警戒情報発表
小松市水防団4班12人が出動し巡視している（巡視強化）

～数値等は、速報値のため今後変わることがあります。～

白山砂防

【降雨状況について】

○市ノ瀬雨量観測所（場所：白山市白峰（市ノ瀬）ノ、旧白峰出張所）

時間雨量（10時から11時） 38mm

累計雨量（0時から11時）192mm

○尾口雨量観測所（場所：白山市瀬戸ワ21、尾口砂防出張所）

時間雨量（10時から11時） 45mm

累計雨量（0時から11時）206mm


参考 平成16年5月17日別当谷土石流の時の市ノ瀬雨量

最大時間雨量 20mm、累計雨量 176mm（42時間）

土石流災害の発生した平成16年5月の降雨を越える雨量が観測されています。

石川県及び金沢地方気象台より発表される土砂災害警戒情報にご注意下さい。

白山市から白山市白峰（別当出谷）地区において避難指示が11:15発令されています。

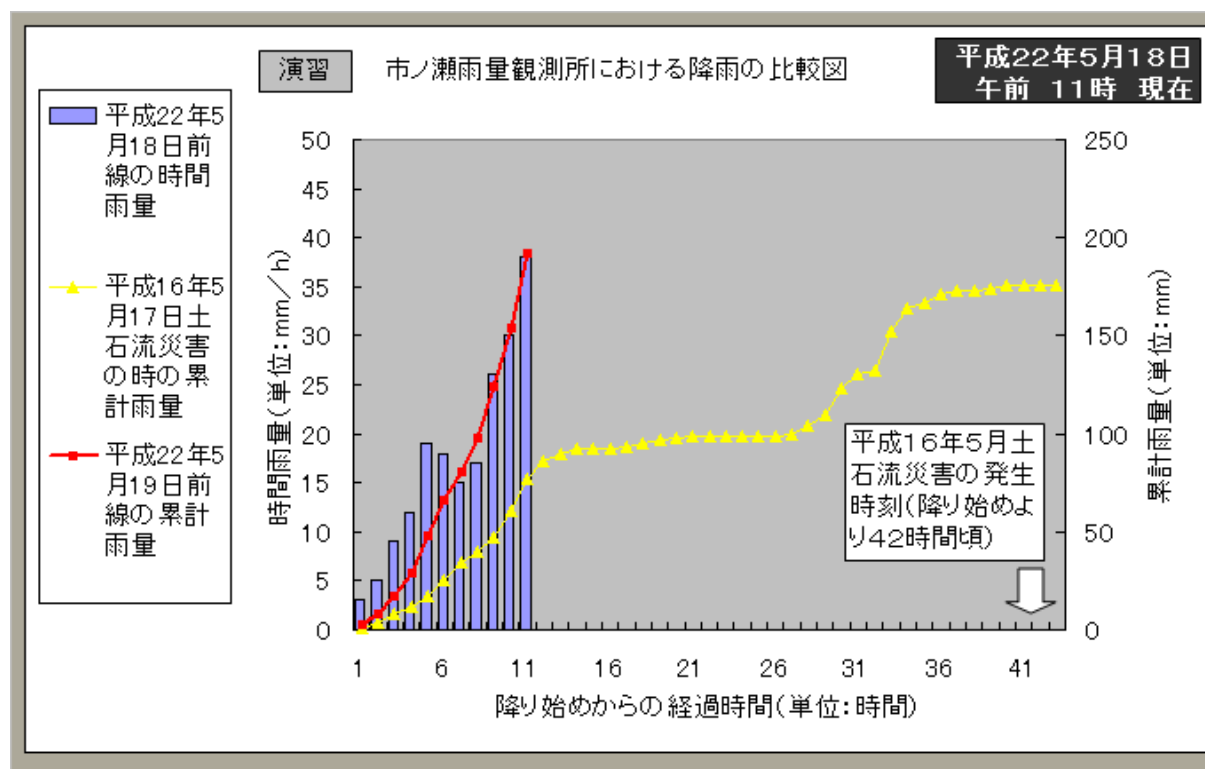

【防災体制について】

○ 金沢河川国道事務所は、『非常体制』に入り連絡体制等の確保をしています。

○ 尾添川、牛首川に設置した砂防監視用カメラにより監視を行っています。

～数値等は、速報値のため今後変わることがあります。～

石川海岸

水防団活動状況

○白山市水防団

白山市地先では、台風による波浪の影響で越波が発生し、堤内地の浸水が想定されたため、白山市水防団30名が出動し、浸水経路となる北陸自動車道のアンダーパスで土のう積みを11時00分に開始し、11時20分に完了しました。

11時50分に白山市水防団30名の退避を完了しました。

○能美市、小松市、加賀市水防団

能美市、小松市、加賀市の各水防団は浸水想定箇所を巡視完了しました。
