


参考資料-1

### 宇奈月ダム運用開始以降における 連携排砂・通砂実施時の宇奈月ダム最大流入量比較

今回の連携試験通砂は、実施規模としては、排砂・通砂の実施洪水の21回の中で1番小さいものとなっている。

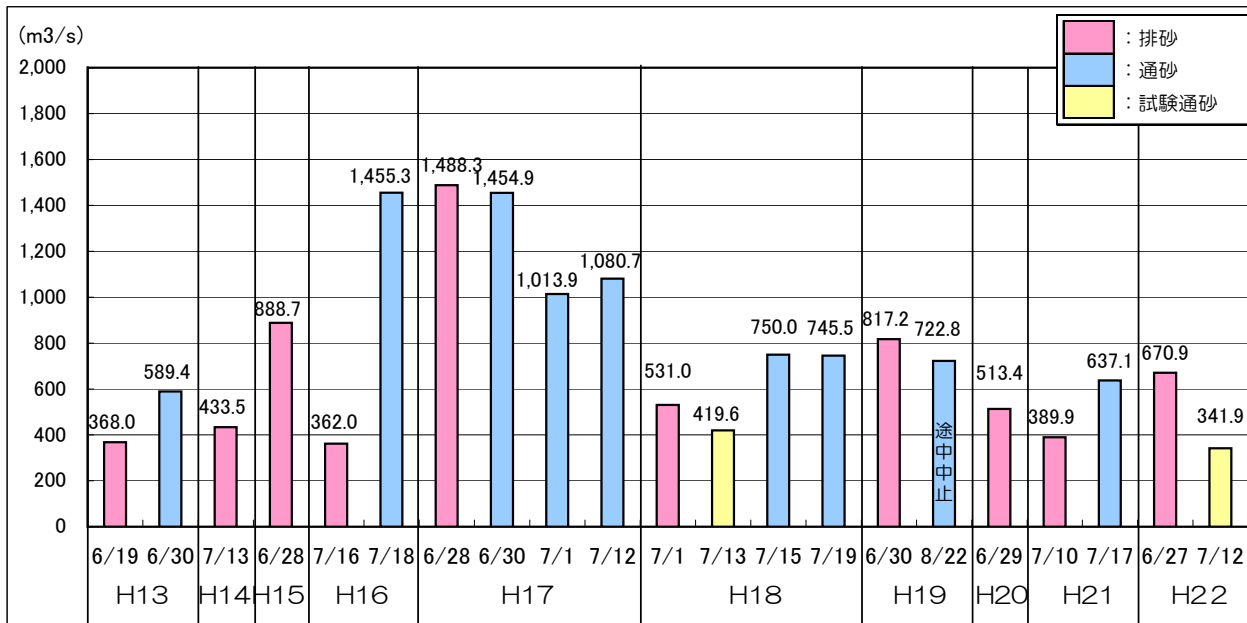


年度	日 時	宇奈月ダム流入量 (m³/s)	順位	区分
H13	6月19日 17:06	368.0	19	排砂
	6月30日 17:37	589.4	13	通砂
H14	7月13日 21:10	433.5	16	排砂
H15	6月28日 10:25	888.7	6	排砂
H16	7月16日 22:18	362.0	20	排砂
	7月18日 3:12	1,455.3	2	通砂
H17	6月28日 17:32	1,488.3	1	排砂
	6月30日 5:40	1,454.9	3	通砂
	7月1日 19:37	1,013.9	5	通砂
	7月12日 7:28	1,080.7	4	通砂
H18	7月1日 6:23	531.0	14	排砂
	7月13日 18:31	419.6	17	試験通砂
	7月15日 20:40	750.0	8	通砂
	7月19日 2:43	745.5	9	通砂
H19	6月30日 0:30	817.2	7	排砂
	8月22日 19:58	722.8	10	通砂【途中で作業中止】
H20	6月29日 13:45	513.4	15	排砂
H21	7月10日 13:57	389.9	18	排砂
	7月18日 11:57	637.1	12	通砂
H22	6月27日 20:53	670.9	11	排砂
	7月12日 7:51	341.9	21	試験通砂

## 参考資料－２

## 連携試験通砂における愛本合口堰堤取水停止時間

平成13年度からの連携排砂・通砂の開始以来、  
取水停止時間は過去16回で1番目に短かく、25時間28分で終了（H19通砂を除く）

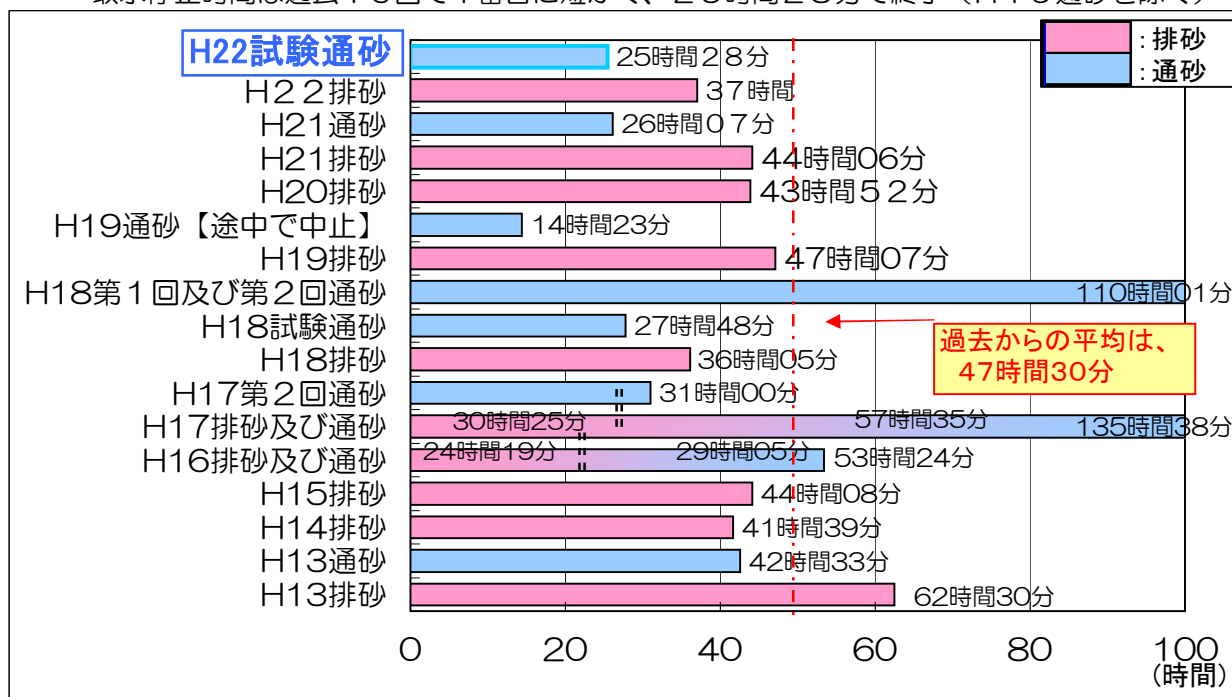

	取水停止時間	備考
H13排砂	62時間30分	
H13通砂	42時間33分	
H14排砂	41時間39分	
H15排砂	44時間08分	
H16排砂及び通砂	53時間24分	
H17排砂及び通砂	135時間38分	一時取水再開有
H17第2回通砂	31時間00分	
H18排砂	36時間05分	
H18試験通砂	27時間48分	
H18第1回及び第2回通砂	110時間01分	
H19排砂	47時間07分	
H19通砂	14時間23分	途中で通砂作業中止
H20排砂	43時間52分	
H21排砂	44時間06分	
H21通砂	26時間07分	
H22排砂	37時間	
H22試験通砂	25時間28分	
