



国土交通省  
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月24日  
9時00分

信濃川河川事務所  
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について(第21報)  
**緊急災害復旧工事の実施状況(No.11)**  
**堤防復旧が全て完了**  
**燕市側県道は25日朝に通行可能予定**

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防及び堤防護岸に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事に着手しました。復旧内容は、堤防に亀裂が入り緩んだ部分の土砂を一時的に掘削除去し、再び築堤盛土(締固め)を行うと共に、新たに堤防護岸に沈下亀裂が生じた部分はジャカゴを設置します。工事は24時間体制で実施し、全箇所を10日間で完了させる予定です。(緊急災害復旧工事の実施状況は表-1のとおり)

町軽井地先の築堤盛土が完了しました。これにより、地震により被害を受けた管内の堤防が全て復旧し、堤防の機能が回復しました。残る工事は、各地先とも県道の舗装復旧だけとなります。

なお、大河津分水路燕市側の県道については、25日朝に通行止めを解除する予定です。

表 - 1 緊急災害復旧工事の実施状況 ( 24日8:00現在 )


工事箇所		工事の概要	進捗状況
1	<sup>のなかさい</sup> 燕市野中才地先(上流) (大河津分水路燕市側)	工事延長335m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去 完了 掘削、築堤盛土 完了 舗装復旧(基層) 作業中 【全体進捗率85%】
2	<sup>のなかさい</sup> 燕市野中才地先(下流) (大河津分水路燕市側)	工事延長590m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去 完了 掘削、築堤盛土 完了 舗装復旧(路盤) 作業中 【全体進捗率75%】
3	<sup>まちがるい</sup> 長岡市町軽井地先 (信濃川旧寺泊町側)	工事延長350m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧、縁石撤去復 旧 堤防護岸沈下亀裂箇所にじ ゃかご設置 (県道は片側交互通行)	坂路部復旧 完了 県道部掘削、盛土 完了 " 舗装撤去 完了 " 縁石復旧160m " 舗装復旧100m じゃかご工 30m(損傷部 応急復旧完了) 【全体進捗率62%】

平成19年新潟県中越沖地震被害状況(第6報)をホームページに掲載しています。  
 町軽井地先の復旧工事状況をホームページ「信濃川ライブカメラ」で映像配信しています。  
<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

\_\_\_\_\_ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週刊記者会

<b>【問い合わせ先】</b> 国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020 副所長 杉本 利英 河川環境課長 稲川 貢
---

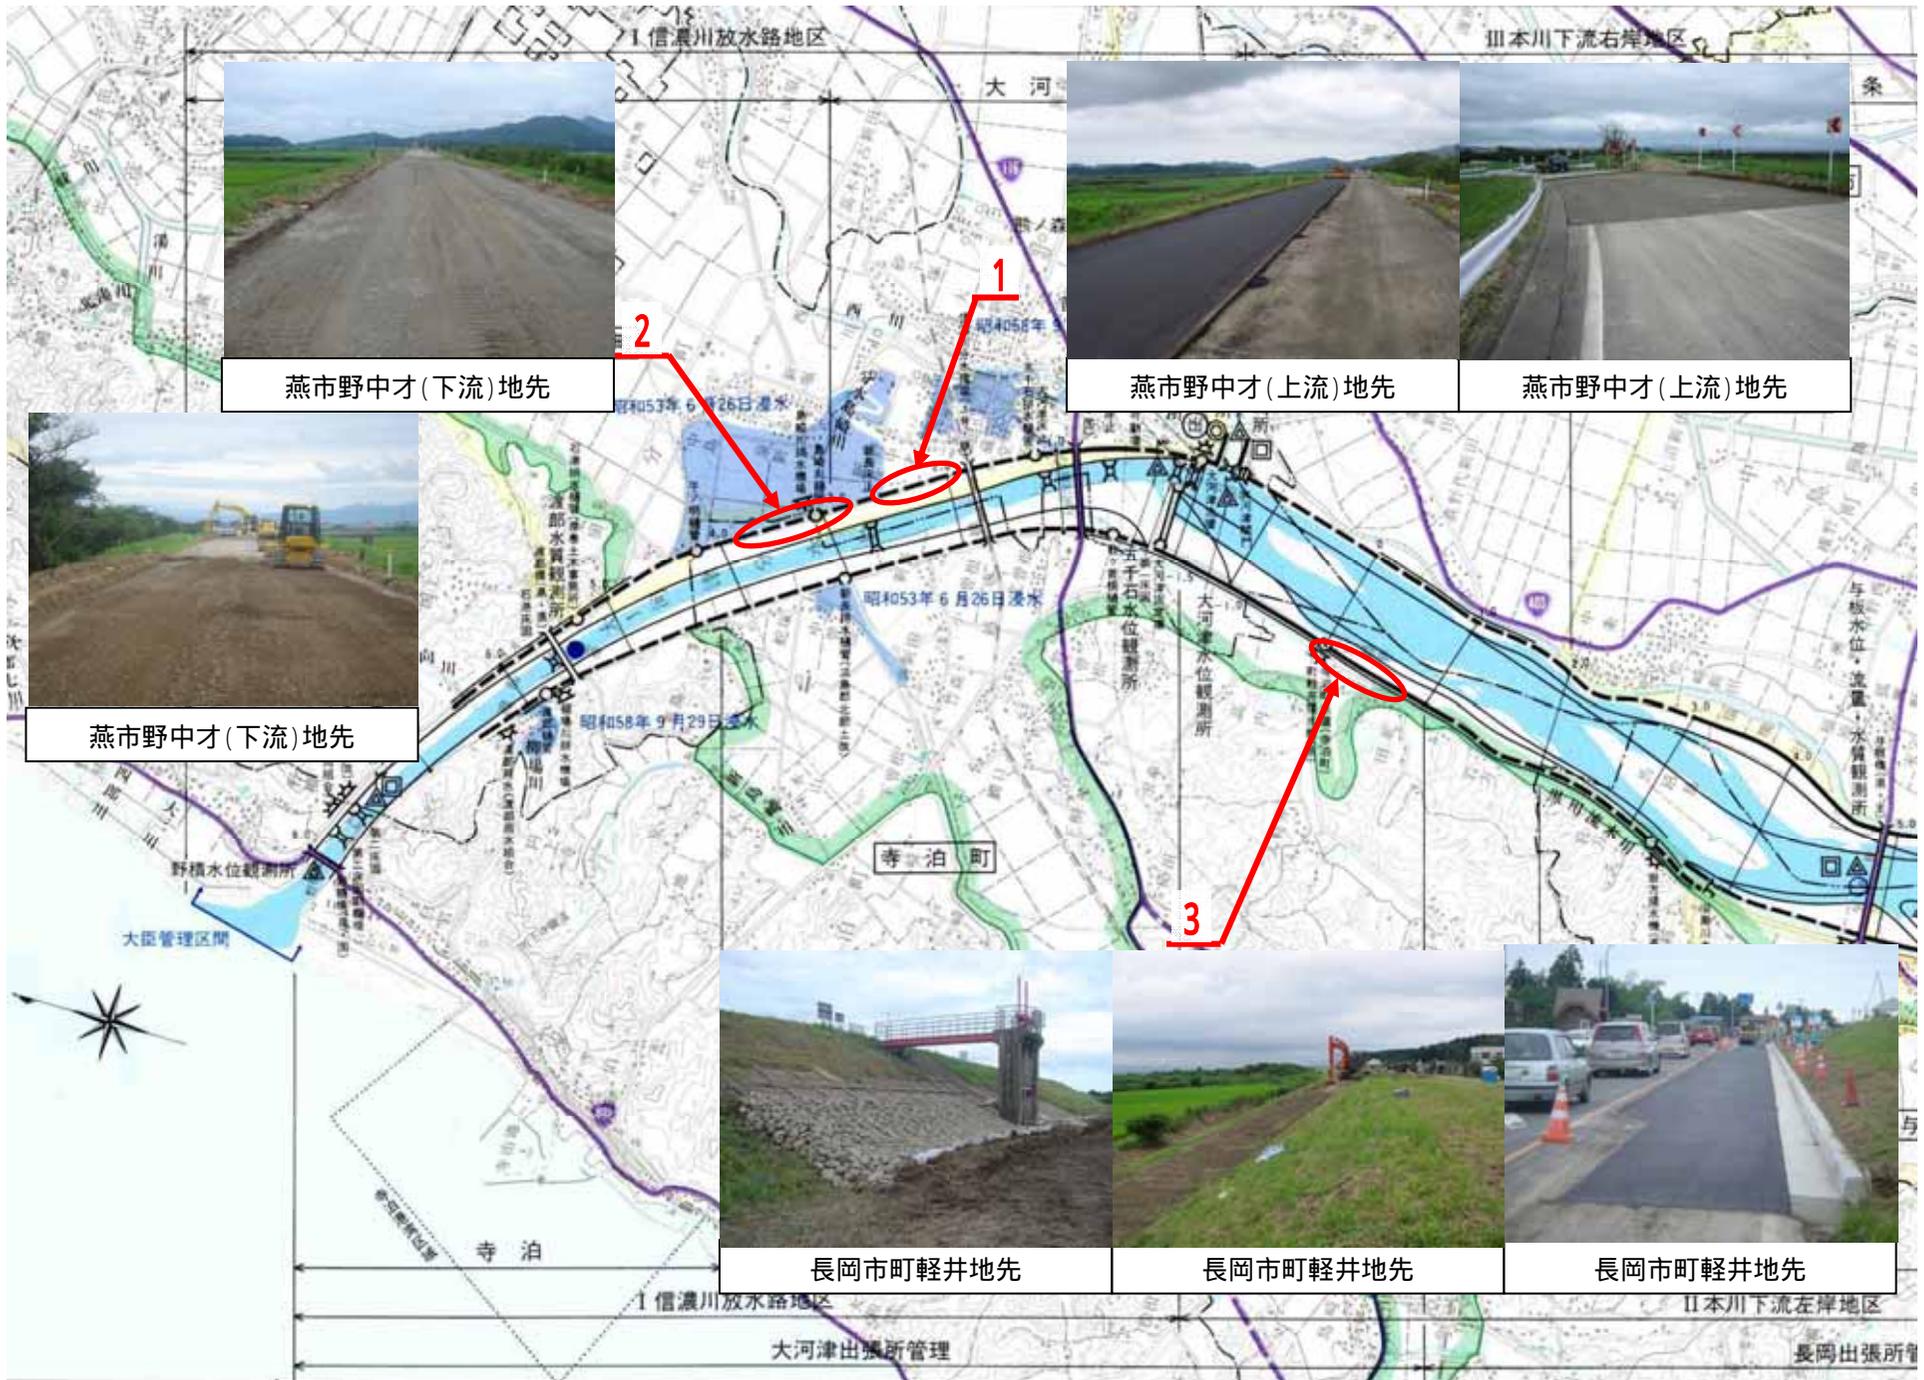

燕市野中才(下流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(下流)地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先
