


一級河川 姫川

工 事 名：令和元年度西中護岸工事

場 所：新潟県糸魚川市西中地先

工 期：R1年8月23日～R2年5月29日（1月31日現在進捗率 68.5%）

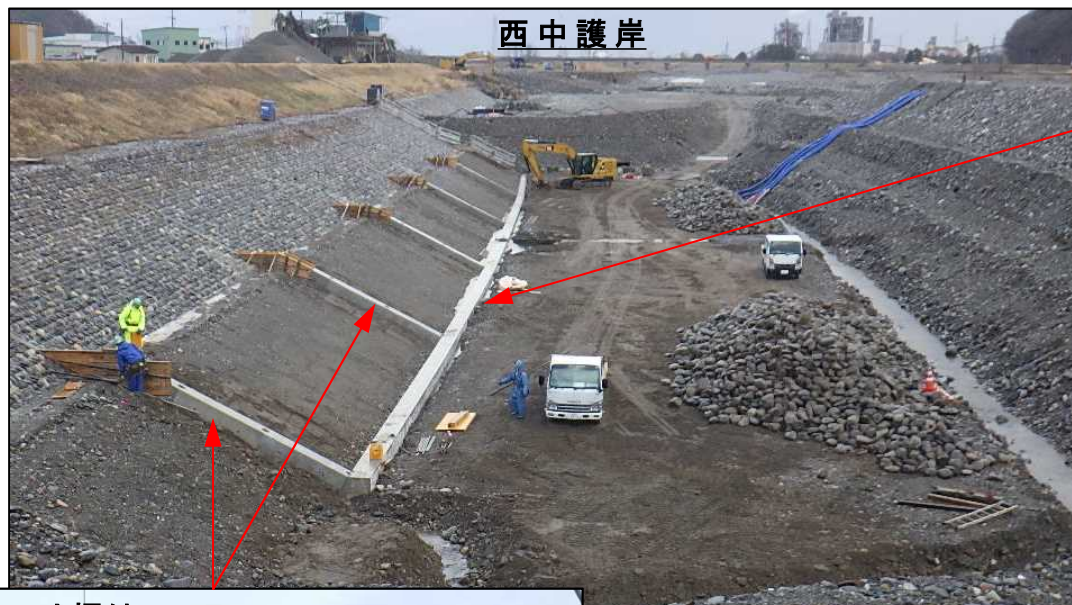

西中護岸



基礎ブロック据付



隔壁・小口止据付

～ 作業状況 ～

1月は、法留基礎ブロック（底幅1.0m 高さ1.5m）および 隔壁・小口止工のプレキャスト製品の据付作業を実施しました。重量物を取り扱うため、慎重さが要求されましたが、精度よく据付が完了しました。

2月より、練石張工（約700m²）のスタートとなります。寒さが厳しくなると予想されますので品質の確保や体調管理をしっかりと行っていききたいと思います。



株式会社 谷村建設

現場代理人 黒坂さん
